


Area Trasformazione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica - Nuove Centralità

Lavori di completamento e di riqualificazione urbana di parte del complesso di edilizia pubblica denominato "Città dei Bambini" da destinare a "Laboratorio-Teatro", ubicato nel parco della Villa Romana, in viale delle Metamorfosi, nel quartiere di Ponticelli.

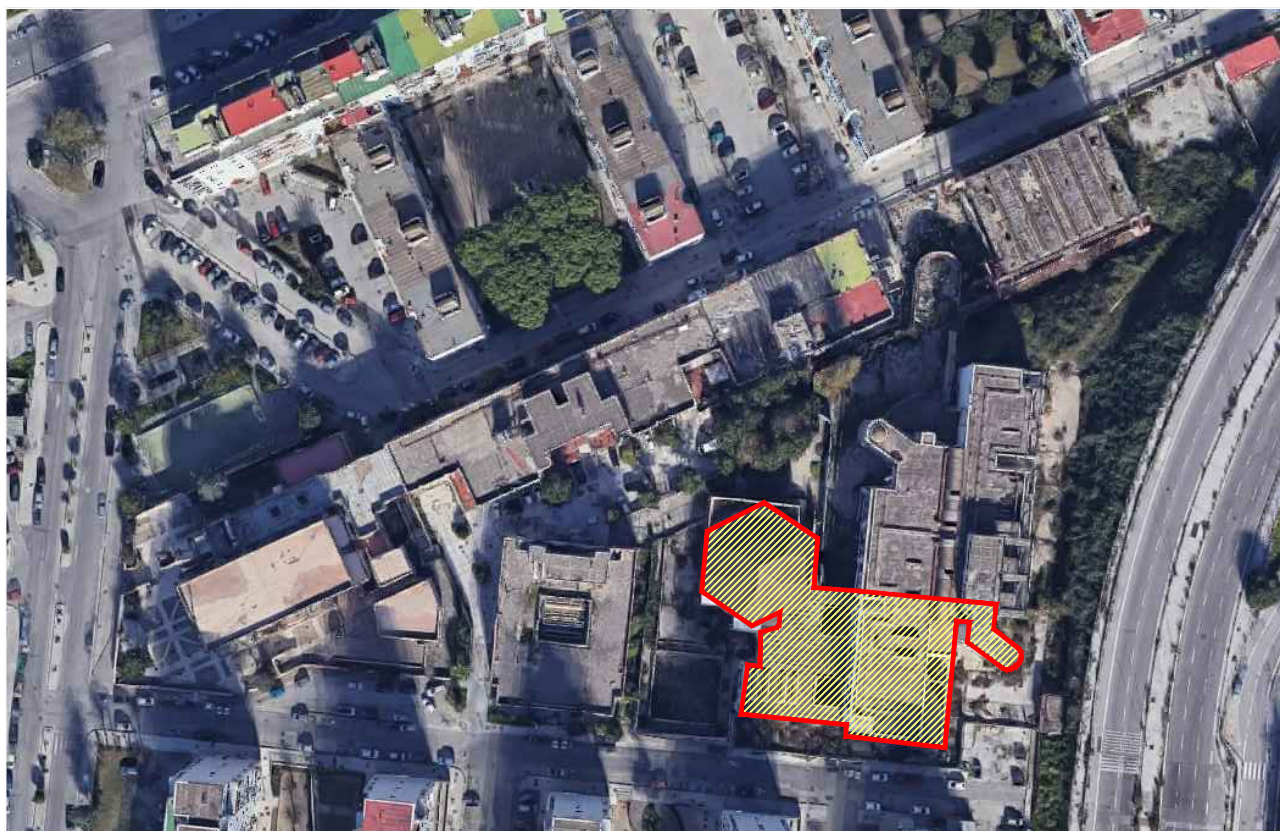

PROGETTO ESECUTIVO

Dicembre 2020

REL.				TITOLO
R	19	CR	01	CRONOPROGRAMMA

Il Dirigente:
Arch. Paola Cerotto




I Progettisti: Arch. Vittorio Barrella
Geom. Luigi La Rocca


Il Direttore dei lavori:
Arch. Vittorio Barrella




Il Responsabile del Procedimento:
Arch. Concetta Montella



Il Coordinatore della sicurezza:
Geom. Luigi La Rocca



Consulenti alla D.L. : Arch. Davide Vargas



[illegible]

Napoli, 14/12/2020

Oggetto: Lavori di completamento e di riqualificazione urbana del complesso di edilizia pubblica denominato CITTA' DEI BAMBINI da destinare a LABORATORIO - TEATRO ubicato nel Parco della Villa Romana, in Viale delle Metamorfosi, nel quartiere di Ponticelli
- Incremento dei tempi di esecuzione per calcolo incidenza avverse condizioni atmosferiche Circolare C/175 della Cassa per il Mezzogiorno, emanata nel 2 marzo del 1982-

Si specifica che, in relazione alla tempistica riportata nel cronoprogramma dei lavori di cui al presente elaborato R.19.CR.01_cronoprogramma, ai 545 giorni naturali e consecutivi previsti va aggiunto un incremento pari al 21% per l'ultimazione dei lavori, quale prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, utilizzando la seguente formula basata sul concetto delle condizioni climatiche ambientali di cui alla Circolare C/175 della Cassa per il Mezzogiorno, emanata nel 2 marzo del 1982:

$NGC = NGL \times Ci$

Avendo indicato con

NGC = numero di giorni consecutivi necessari

NGL = numero di giorni utili necessari

Ci = coefficiente moltiplicativo (in funzione della classe climatico-ambientale)

e ponendo $C1 = 100/82,5 = 1,21$ per la classe A1 – Favorevole

Pertanto, il termine per l'ultimazione di tutti i lavori è fissato in 660 giorni (seicentosessanta giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
