





**LAVORAZIONI TIPO SULLA PARTE CARRABILE**

OVE E' POSSIBILE, GARANTIRE IL TRANSITO REGOLARE SULLA SEMICARREGGIATA NON OGGETTO DI INEVITABILE ANCHE SE NEI PUNTI PIU' STRETTI SI DOVRA' POTIZZARE L'INTERDIZIONE AL TRANSITO IN VIA TEMPORANEA CHE DOVRA' ESSERE MINIMIZZATA AL FINE DI RIGARANIRRE LA VIABILITA' QUANTO PRIMA ANCHE TRAMITE L'AUSILIO DI PEDANE CARRABILI

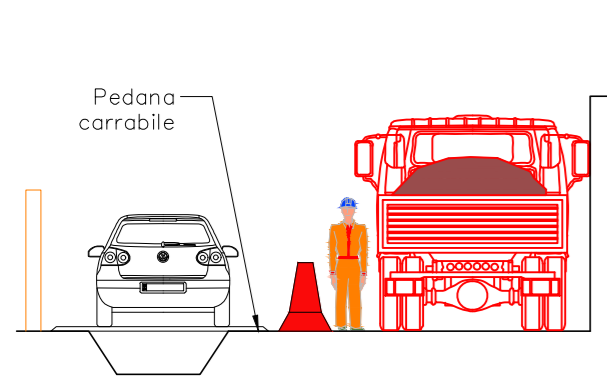

**SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE**

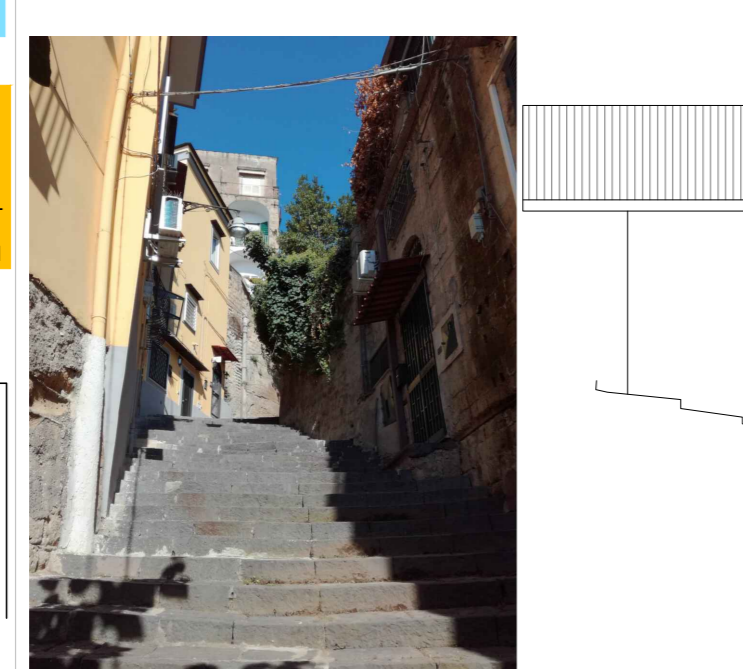

**SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE**




**CAMPO BASE**



**TRATTO 2**



**FASI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO E CORRETTO UTILIZZO**

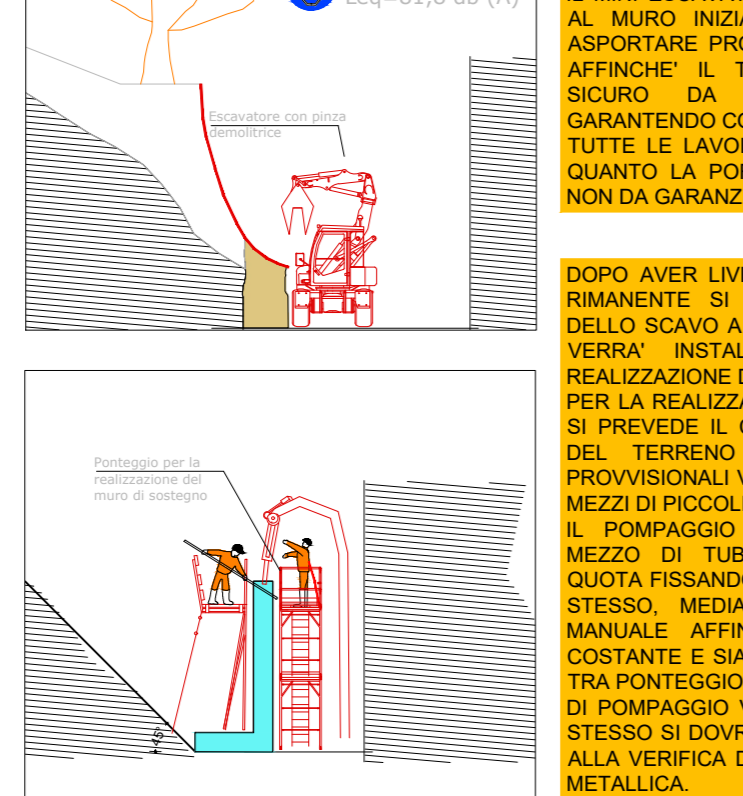


**NOTE GENERALI :**


NEI PUNTI PIU' RIPIDI E PIU' LUNGI DELLA SCALINATA SONO PREVISTE TAVOLATI DI LEGNO DOTATI DI LISTELLI FERMACADUTA PER LO SPOSTAMENTO DEI MATERIALI TRAMITE CARRIOLE ELETTRICHE

UTILIZZO DI UN SERBATOIO MOBILE DI ACQUA PER LA RIMOZIONE DEI DEPOSITI SUPERFICIALI SUI PARAMENTI MURARI MEDIANTE LAVAGGIO DELLE SUPERFICI

**MONTAGGIO NUOVE INFERRIATE**

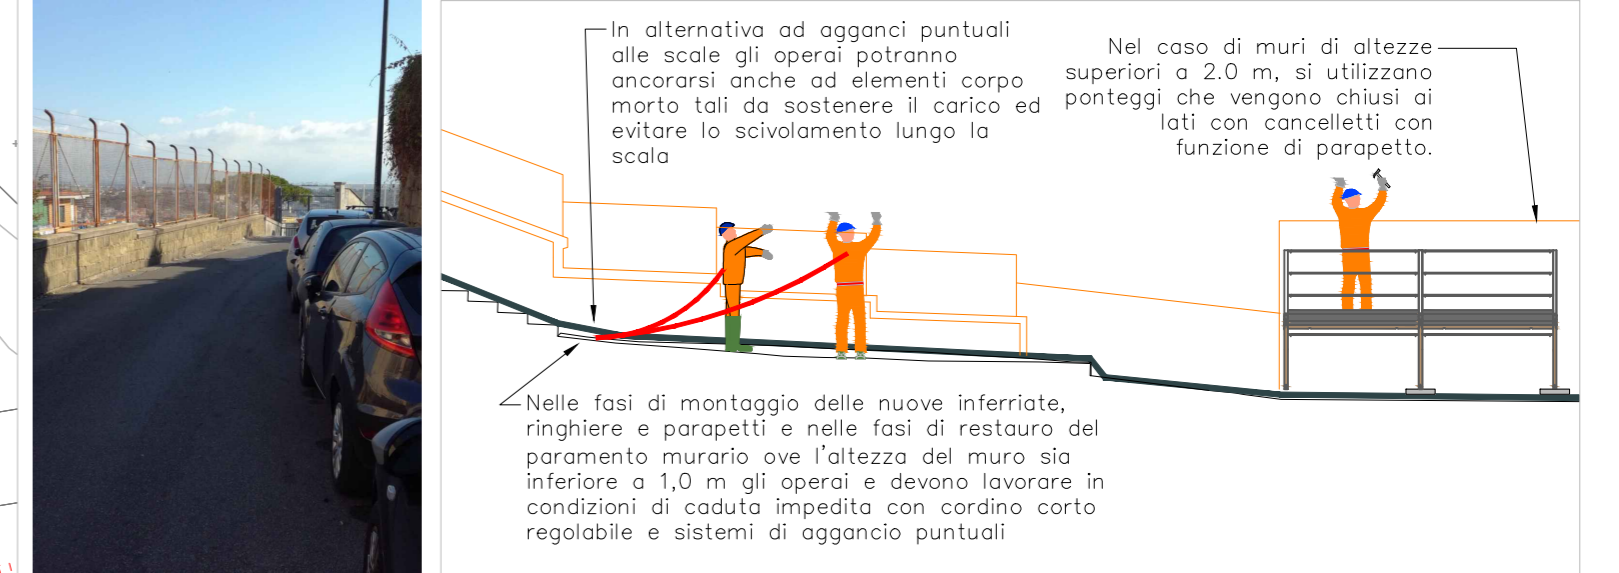

**TIPOLOGICO DEGLI ACCESSI**

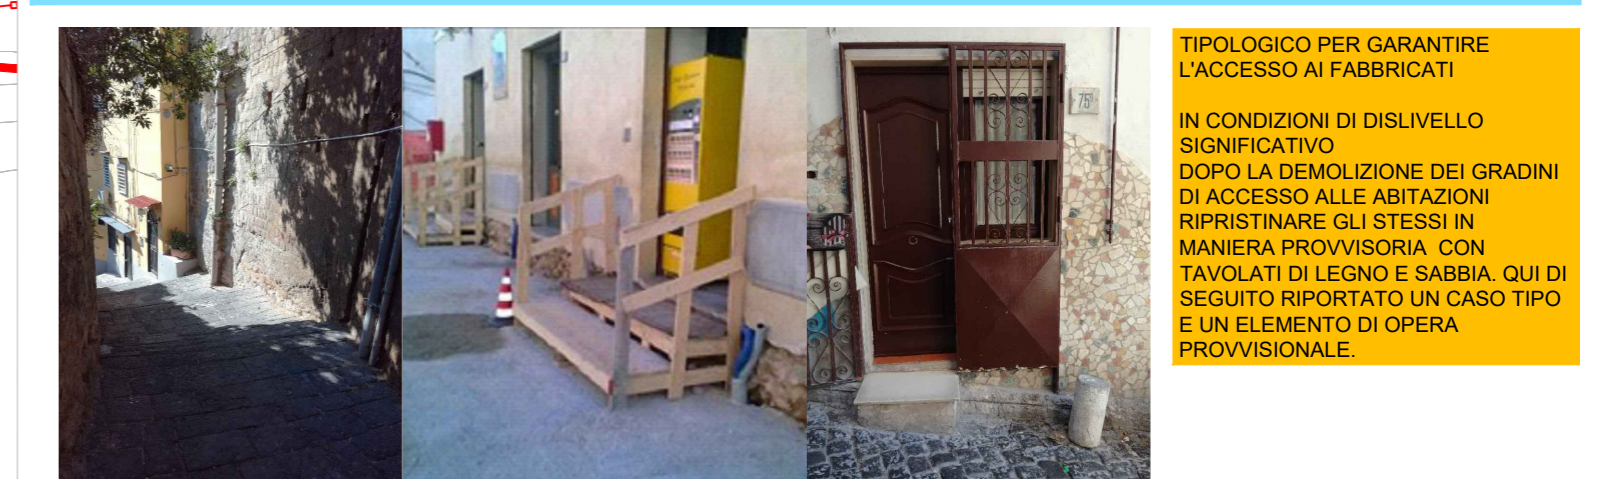

**LEGENDA**


DELIMITAZIONI	MACCHINE DI CANTIERE	APPRETTAMENTI ED OPERE PROVVISORIALI
Delimitazione intervento	Gru mobile	Passerelle
Del. di c. con pannelli di rete metallica su elementi di calcestruzzo	Bobcat	Parapetto
Del. di c. in rete plastificata in PVC (su supporto generico)	Carrello elevatore con conducente e bordo	Punto luce
Del. di c. in rete antipolvere (su supporto generico)	Traspallet manuale	Estintore
Del. di c. con New Jersey in plastica zavorrabile	Carricola elettrica con retrorinnata	Cassetta del pronto soccorso/pacchetto di medicazione
Delimitazione transito provvisorio composto da colonnina e catenella	Betoniera a bicchiere	Punto di ancoraggio su linee via classe C
Trasenna modulare con pannello rifrangente	Sega circolare su banco	Punto di ancoraggio su goliare classe A
Quadrangolare con pannello rifrangente		
ACCESSI E BARACCAMENTI	UTENZE E LINEE ESISTENTI	AREE OPERATIVE
Box di cantiere (n° 1)	Quadro elettrico principale di cantiere (ASC)	Area stoccaggio materiali
Bagno chimico portatile (n°3)	Quadro elettrico secondario di cantiere	Area stoccaggio opere provvisoria
Seratoio per il lavaggio delle mani	Gruppo elettrogeno	Area stoccaggio rifiuti ordinari
	Punto di approvvigionamento idrico	Area in fase di lavorazione
	Punto di approvvigionamento elettrico	Area di transito dei manufatti all'interno dell'area di cantiere
	Cavi elettrici di cantiere	Area pedonale interna al cantiere

**DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI**


LAVORI STRADALI E PAVIMENTAZIONI	LAVORI PARAMENTI MURARI
Pulizia di pozzetti di ispezione	Esecuzione di prelievi di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio e saggio stratigrafico
Pulitura ad acqua e/o con mezzi meccanici e manuali	Spicconatura accurata di intonaci degradati e non compatibili con il supporto
Rimozione di strati di scialbo e graffi mediante idrosabbiatrice	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione
Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro	Disinfestazione di arbusti mediante recisione delle parti aeree e infiltrazioni di biocida
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso	Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro (compresi di chiodi, staffe ecc)
Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di conglomerato cementizio	Operazioni di rimozione di stuccature vecchie e microstuccature nuove
Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietra	Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici (ad es. graffi)
Smontaggio e sostituzione di vecchi cordoni in pietra non riutilizzabili	Risistemazione della coesione mediante impregnazione e consolidamento dei giunti
Rimozione di basolati eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo	Ripresa di muratura mediante sostituzione parziale di materiale con metodo scud-cud
Scavo e piano di posa	Revisione e restauro di paramento murario
Posa in opera di vecchie basole rimosse	Protezione superficiale della pietra con stesura di scialbo pigmentato o idrossido di calcio
Nuova pavimentazione in lastre di pietra dura	Nuovo intonaco con malta composta da grassello di calcio e polvere di tufo
Disinfestazione preventiva	Restauro delle superfici in piperno
Operazioni di rimozione di stuccature vecchie e microstuccature nuove	Risanamento delle copertine in calcestruzzo
	Realizzazione di nuove copertine in malta idraulica e in laterizio
	Realizzazione di nuove copertine in laterizio
	Nuove inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate

**TIPOLOGICO DI APOGGIO STABILE - CAMPO OPERATIVO**


LA TERRAZZA INTERMEDIA PUO' ESSERE SFRUTTATA COME CAMPO OPERATIVO. SARA' L'ULTIMO INTERVENTO PROGETTUALE NEL FRATTEMPO VERRA' INSTALLATO UN CAMPO OPERATIVO CHE VERRA' SMANTELLATO PER L'ESECUZIONE DELLA PENINSULA E DELLE OPERE DI VERDE E ARREDO. QUANDO LO SPAZIO LO CONSENTE E' POSSIBILE COLLOCARE UN SERBATOIO D'ACQUA MOBILE PER LE OPERAZIONI DI PULITURA DEI PARAMENTI MURARI. DURANTE TALI OPERAZIONI GLI OPERAI DOVRANNO OPERARE IMBRACATI A PARTI STABILI DELLA STRUTTURA OPERANDO IN REGIME DI CADUTA IMPEDITA. L'ORSO GRILL VERRA' POSTO A 2 M A PROTEZIONE DEL VUOTO.

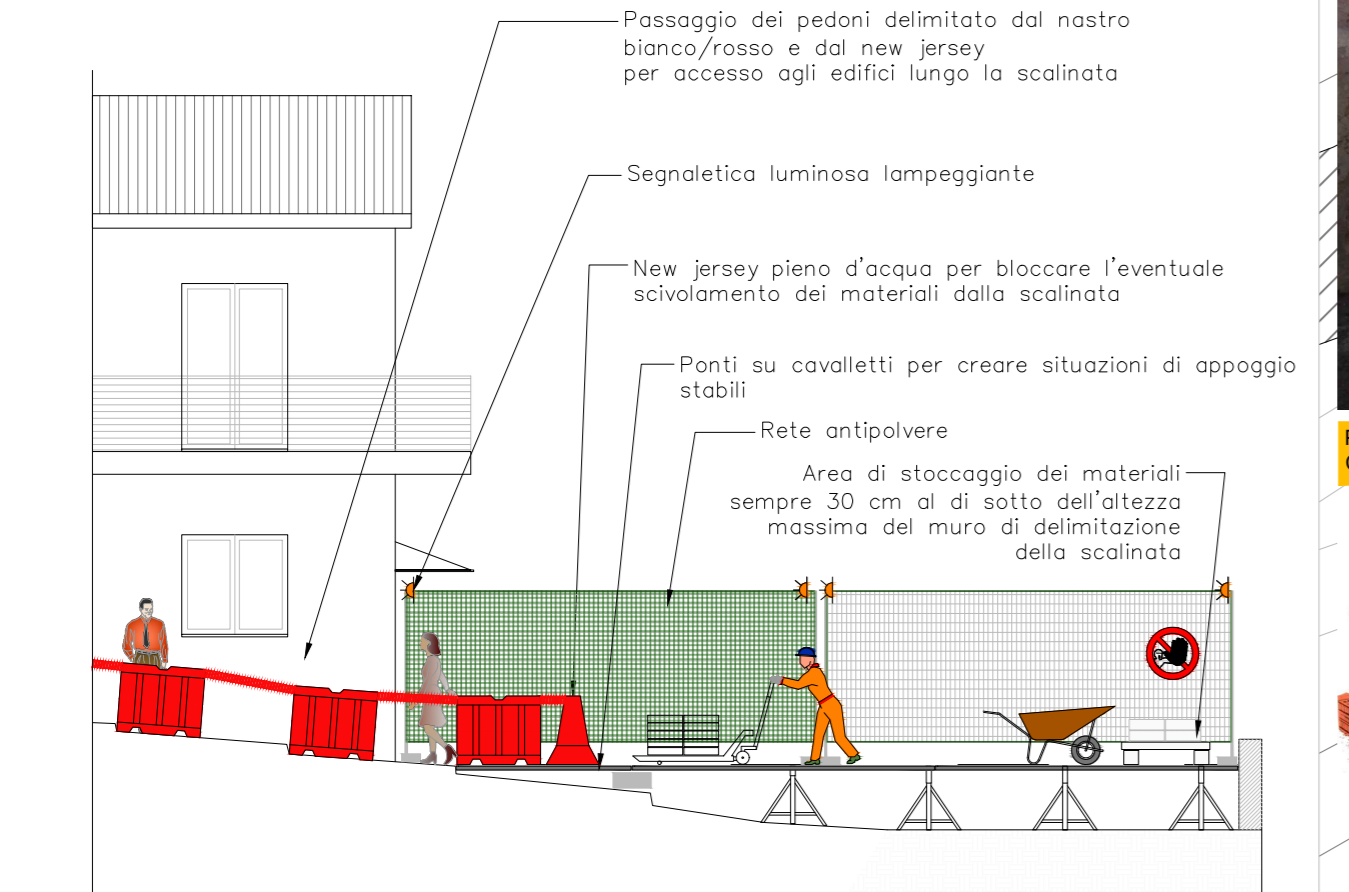

**CAMPO OPERATIVO 3**

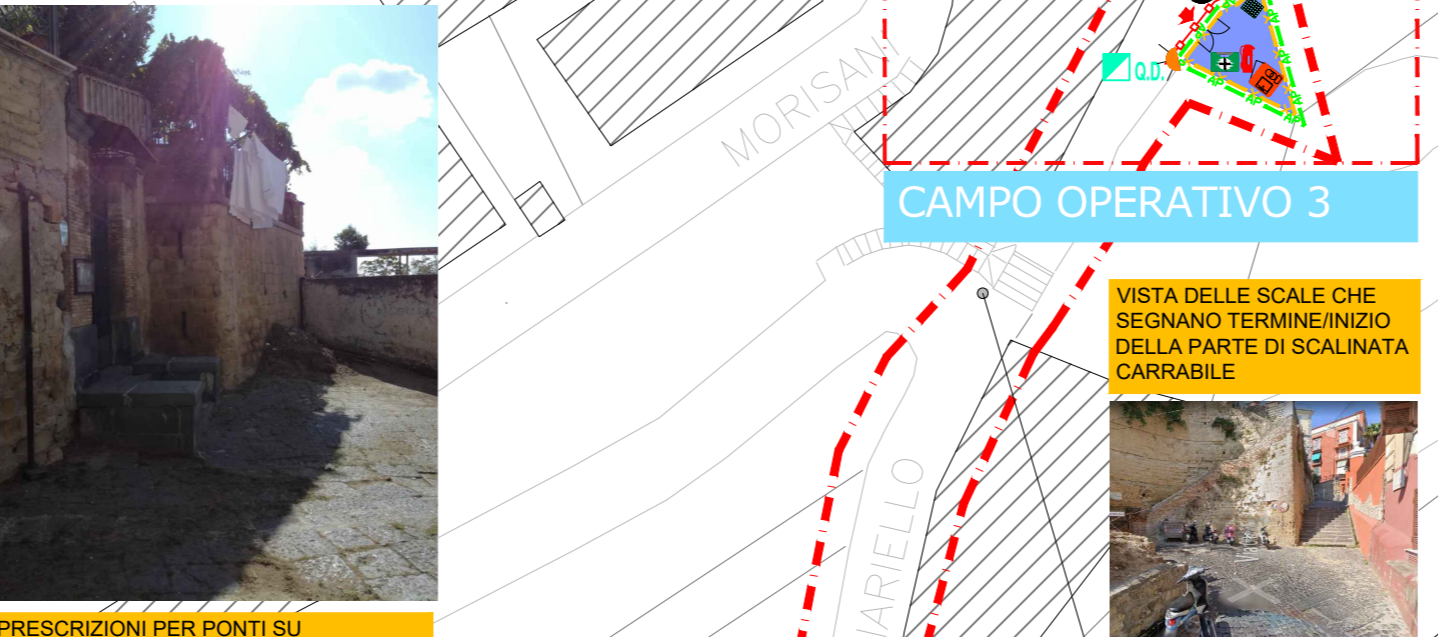

**CAMPO OPERATIVO 2**

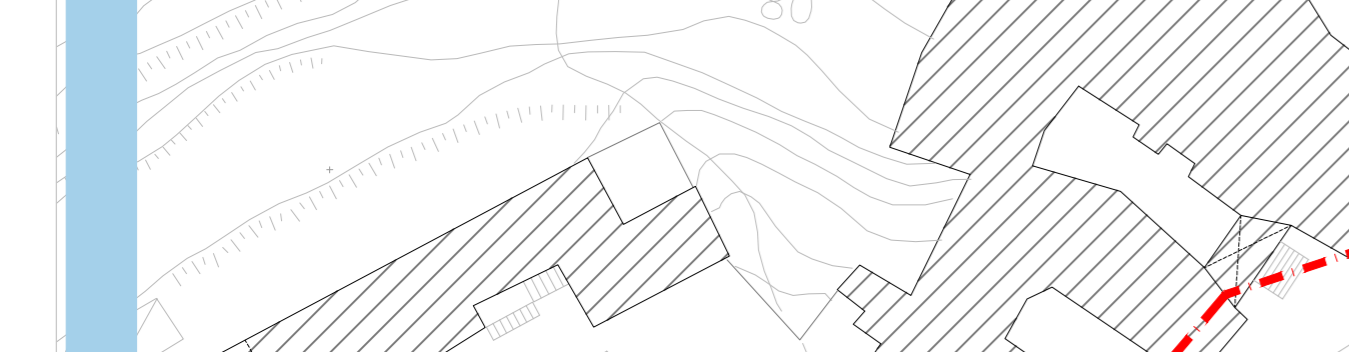

**CAMPO OPERATIVO 1**



**COMMITTENTE**

COMUNE DI NAPOLI

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
arch. Francesca Spera

**MANDATARIA:**  
sab gruppoco

Via Prevaiola, 15  
06128 Perugia  
info@sabeng.it www.sabstru.eu

**MANDANTI:**  
B5 S.r.l.  
Via Sant'Anna dei Lombardi, 16  
80134 - Napoli - info@b5st.it

Arch. Pierpaolo Papi  
Arch. Francesco Pecorari  
Arch. Sergio Tucci  
Arch. Francesco Fucilli  
Arch. Luca Persichini

Ing. Marco Adriani  
Ing. Vincenzo Puja  
Ing. Caluscia Maggi  
Ing. Barbara Bottausci

Arch. Francesca Brancaccio Ph.D  
(Amministratore Unico e Direttore Tecnico)  
Ing. Ugo Brancaccio  
(Direttore tecnico)

Studio Ing. Alberto Capitanucci

ELABORATO  
**Sicurezza**  
Planimetria di cantiere

N° ELAB. NO. DOC. COD. COMM. COD. ORDIN.

**04-GZE001/01** CNAP.001-01-01.19.ESE

SCALA SCALE

03 | 02 | 01 | ESECUTIVO | BONCI | PAPI | ADRIANI | MAGGIO 2022

00 | ESECUTIVO | BONCI | PAPI | ADRIANI | GIUGNO 2021

REV. | MODIFICAZIONE | DATA | AUT. | DATA | AUT. | DATA | AUT. | DATA | AUT.

NOME FILE /File name MOIARIELLO.dwg UNITA' DI MISURA /Unit of Measure m
