

## COMUNE DI NAPOLI

Servizio  
Valorizzazione della  
Città Storica

**RUP:** Arch. Claudia Melella

**DIRIGENTE:** Arch. Fabio Vittoria

Progetto Esecutivo di messa in sicurezza e di  
Restauro delle Facciate della Galleria della  
Vittoria fronte occidentale - fronte orientale e  
adiacente muro di sostegno di via Cesario Console

### PROGETTAZIONE

STUDIO BATTISTA ASSOCIATI - (Capogruppo)-Arch. Giancarlo Battista  
Prof. Ing. Mario Rosario Migliore  
Dott. Geol. Fabio De Vincentiis  
R.O.M.A. Consorzio  
Arch. Angelo Piccolo

Contatti: STUDIO BATTISTA ASSOCIATI - 0810681441 - studiobattistaas@fiscali.it

Codice  
Elaborato

ESE\_SIC\_03

Titolo

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (GANTT)

Scala

Data

15 | 05 | 2019

Nome attività	Durata	26 Ago 19	02 Set 19	09 Set 19	16 Set 19	23 Set 19	30 Set 19	07 Ott 19	14 Ott 19	21 Ott 19	28 Ott 19	04 Nov 19	11 Nov 19	18				
		31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
<b>ALLESTIMENTO DEL CANTIERE</b>	15 g	[Barra grigia]																
<b>Preparazione delle aree di cantiere</b>	5 g	[Barra grigia]																
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5 g	[Barra blu]																
<b>Apprestamenti del cantiere</b>	10 g	[Barra grigia]																
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	10 g	[Barra blu]																
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali	10 g	[Barra blu]																
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	10 g	[Barra blu]																
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	10 g	[Barra blu]																
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>	10 g	[Barra grigia]																
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	10 g	[Barra blu]																
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	10 g	[Barra blu]																
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assis	10 g	[Barra blu]																
Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad	10 g	[Barra blu]																
<b>01_OG2- FRONTE VIA ACTON</b>	394 g	[Barra grigia]																
<b>PONTEGGI</b>	394 g	[Barra grigia]																
Montaggio del ponteggio metallico fisso	394 g	[Barra blu]																
<b>DISERBI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b>	20 g	[Barra grigia]																
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	20 g	[Barra blu]																
Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni	20 g	[Barra blu]																
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro	20 g	[Barra blu]																
Disinfestazione dalla vegetazione superiore di stucchi	20 g	[Barra blu]																
<b>OPERE DI RIPRISTINO DELLE MURATURE</b>	45 g	[Barra grigia]																
Stuccatura di vecchi paramenti in pietra	45 g	[Barra blu]																
<b>OPERE DI CONSOLIDAMENTO SU C.A.</b>	20 g	[Barra grigia]																
Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne	20 g	[Barra blu]																
Trattamento antiossidante di armature esterne	20 g	[Barra blu]																
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	20 g	[Barra blu]																
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti	20 g	[Barra blu]																
<b>RESTAURO DI CORNICI A STUCCO</b>	95 g	[Barra grigia]																
Rimozione meccanica di stuccature inidonee su stucchi	95 g	[Barra blu]																
Rimozione di elementi metallici da stucchi	95 g	[Barra blu]																
Trattamento di elementi metallici su stucchi	95 g	[Barra blu]																
<b>INTONACI E TINTERGGIATURE</b>	150 g	[Barra grigia]																
Formazione intonaci esterni tradizionali	150 g	[Barra blu]																
Tinteggiatura di superfici esterne	149 g	[Barra blu]																



Nome attività	Durata	26 Ago 19	02 Set 19	09 Set 19	16 Set 19	23 Set 19	30 Set 19	07 Ott 19	14 Ott 19	21 Ott 19	28 Ott 19	04 Nov 19	11 Nov 19	18						
		31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>IMPERMEABILIZZAZIONI E PAVIMENTAZIONI</b>	35 g																			
Impermeabilizzazione di coperture	35 g																			
Posa di manto di copertura in lose di pietra	35 g																			
Formazione di rasatura per coperture	35 g																			
<b>02_OS2-FRONTI VIA ACTON</b>	202 g																			
<b>PULITURE</b>	60 g																			
Rimozione di depositi superficiali incoerenti su opere in	60 g																			
Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti	60 g																			
<b>RESTAURO DI INTONACO BUGNATO</b>	60 g																			
Ristabilimento della coesione di intonaci	60 g																			
Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed int	60 g																			
Ristabilimento dell'adesione tra intonaco e intonachino	60 g																			
<b>RESTAURO FINTA CORTINA IN LATERIZIO</b>	10 g																			
Ristabilimento della coesione di intonaci	10 g																			
Stuccatura di cadute di strati di intonaci	10 g																			
Tinteggiatura di intonaci	9 g																			
<b>RESTAURO SUPERFICI IN PIETRA LAVICA</b>	75 g																			
Ristabilimento della coesione di opere in pietra	75 g																			
Ristabilimento strutturale dell'adesione di opere in pietra	75 g																			
Integrazione di parti mancanti di opere in pietra	75 g																			
Revisione cromatica di integrazioni esistenti di opere in	75 g																			
Protezione superficiale di opere in pietra	75 g																			
<b>03_OG2- FRONTI VIA ARCOLEO</b>	210 g																			
<b>PONTEGGI</b>	210 g																			
Montaggio del ponteggio metallico fisso	210 g																			
<b>DISERBI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b>	14 g																			
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	14 g																			
Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni	14 g																			
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro	14 g																			
Disinfestazione dalla vegetazione superiore di stucchi	14 g																			
Rimozione di manto impermeabile	14 g																			
Rimozione di pavimento in ceramica	14 g																			
Rimozione di massetto	14 g																			
<b>OPERE DI RIPRISTINO DELLE MURATURE</b>	14 g																			
Stuccatura di vecchi paramenti in pietra	14 g																			

Nome attività	Durata	26 Ago 19	02 Set 19	09 Set 19	16 Set 19	23 Set 19	30 Set 19	07 Ott 19	14 Ott 19	21 Ott 19	28 Ott 19	04 Nov 19	11 Nov 19	18						
		31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>OPERE DI CONSOLIDAMENTO SU C.A.</b>	14 g																			
Spazzolatura meccanica di armature ossidate esterne	14 g																			
Trattamento antiossidante di armature esterne	14 g																			
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	14 g																			
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti	14 g																			
<b>INTONACI E TINTERGGIATURE</b>	20 g																			
Formazione intonaci esterni tradizionali	20 g																			
Tinteggiatura di superfici esterne	20 g																			
<b>IMPERMEABILIZZAZIONI E PAVIMENTAZIONI</b>	15 g																			
Impermeabilizzazione di coperture	15 g																			
Formazione di rasatura per coperture	14 g																			
Posa di pavimenti per esterni in ceramica	15 g																			
Posa di pavimenti per esterni in pietra	15 g																			
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	15 g																			
<b>04_OS2-FRONTI VIA ARCOLEO</b>	121 g																			
<b>PULITURE</b>	45 g																			
Rimozione di depositi superficiali incoerenti su opere in	45 g																			
Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti	45 g																			
<b>RESTAURO SUPERFICI IN TRAVERTINO</b>	76 g																			
Ristabilimento della coesione di opere in pietra	76 g																			
Imperniazione di frammenti in pietra	76 g																			
Revisione cromatica di integrazioni esistenti di opere in	76 g																			
Protezione superficiale di opere in pietra	76 g																			
<b>RESTAURO SUPERFICI IN PIETRA LAVICA</b>	75 g																			
Ristabilimento della coesione di opere in pietra	75 g																			
Ristabilimento strutturale dell'adesione di opere in pietra	75 g																			
Integrazione di parti mancanti di opere in pietra	75 g																			
Revisione cromatica di integrazioni esistenti di opere in	75 g																			
Protezione superficiale di opere in pietra	75 g																			
<b>05_OG2- BALAUSTRAS MURO CONTENIMENTO</b>	92 g																			
<b>DISERBI, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b>	85 g																			
Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni	85 g																			
Disinfestazione dalla vegetazione superiore di stucchi	85 g																			
Rimozione di depositi superficiali incoerenti su opere in	85 g																			
Rimozione di depositi superficiali incoerenti su intonaci	85 g																			



Nome attività	Durata	26 Ago 19	02 Set 19	09 Set 19	16 Set 19	23 Set 19	30 Set 19	07 Ott 19	14 Ott 19	21 Ott 19	28 Ott 19	04 Nov 19	11 Nov 19	18						
		31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>RESTAURO SUPERFICI IN TRAVERTINO</b>	92 g																			
Messa in sicurezza di balaustra in travertino	92 g																			
<b>06_OS2-BALAUSTRAS MURO CONTENIMENTO</b>	104 g																			
<b>PULITURE</b>	104 g																			
Rimozione di depositi superficiali incoerenti su opere in	104 g																			
Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti	104 g																			
<b>RESTAURO FINTA CORTINA IN LATERIZIO</b>	42 g																			
Ristabilimento della coesione di intonaci	42 g																			
Stuccatura di cadute di strati di intonaci	42 g																			
Tinteggiatura di intonaci	42 g																			
<b>RESTAURO SUPERFICI IN TRAVERTINO</b>	30 g																			
Ristabilimento della coesione di opere in pietra	30 g																			
Revisione cromatica di integrazioni esistenti di opere in	30 g																			
Protezione superficiale di opere in pietra	30 g																			
<b>07_OG2-SISTEMAZIONI ESTERNE</b>	79 g																			
<b>RIPARAZIONE DI INFISSI</b>	28 g																			
Riparazione di infissi in legno	28 g																			
Sostituzione della ferramenta	28 g																			
<b>VERNICIATURA DI INFISSI</b>	14 g																			
Sverniciatura termica o con solventi di infissi in legno	14 g																			
Verniciatura a pennello di opere in legno	14 g																			
Sverniciatura di opere in ferro con solventi	14 g																			
Verniciatura a pennello di opere in ferro	14 g																			
<b>MARCIAPIEDI- RIMOZIONI</b>	9 g																			
Disfacimento di pavimentazione in pietra	9 g																			
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	9 g																			
<b>MARCIAPIEDI-SISTEMAZIONI</b>	26 g																			
Cordoli, zanelle e opere d'arte	26 g																			
Realizzazione di marciapiedi	26 g																			
<b>TERRAZZAMENTO- RIMOZIONI</b>	9 g																			
Disfacimento di pavimentazione in pietra	9 g																			
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	9 g																			
<b>TERRAZZAMENTO-SISTEMAZIONI</b>	26 g																			
Cordoli, zanelle e opere d'arte	26 g																			
Realizzazione di marciapiedi	26 g																			




18 Nov 19 25 Nov 19 02 Dic 19 09 Dic 19 16 Dic 19 23 Dic 19 30 Dic 19 06 Gen 20 13 Gen 20 20 Gen 20 27 Gen 20 03 Feb 20 10 Feb 20 17 Feb 20 24 Feb 20 02 Mar 20  
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05



18 Nov 19 25 Nov 19 02 Dic 19 09 Dic 19 16 Dic 19 23 Dic 19 30 Dic 19 06 Gen 20 13 Gen 20 20 Gen 20 27 Gen 20 03 Feb 20 10 Feb 20 17 Feb 20 24 Feb 20 02 Mar 20  
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05






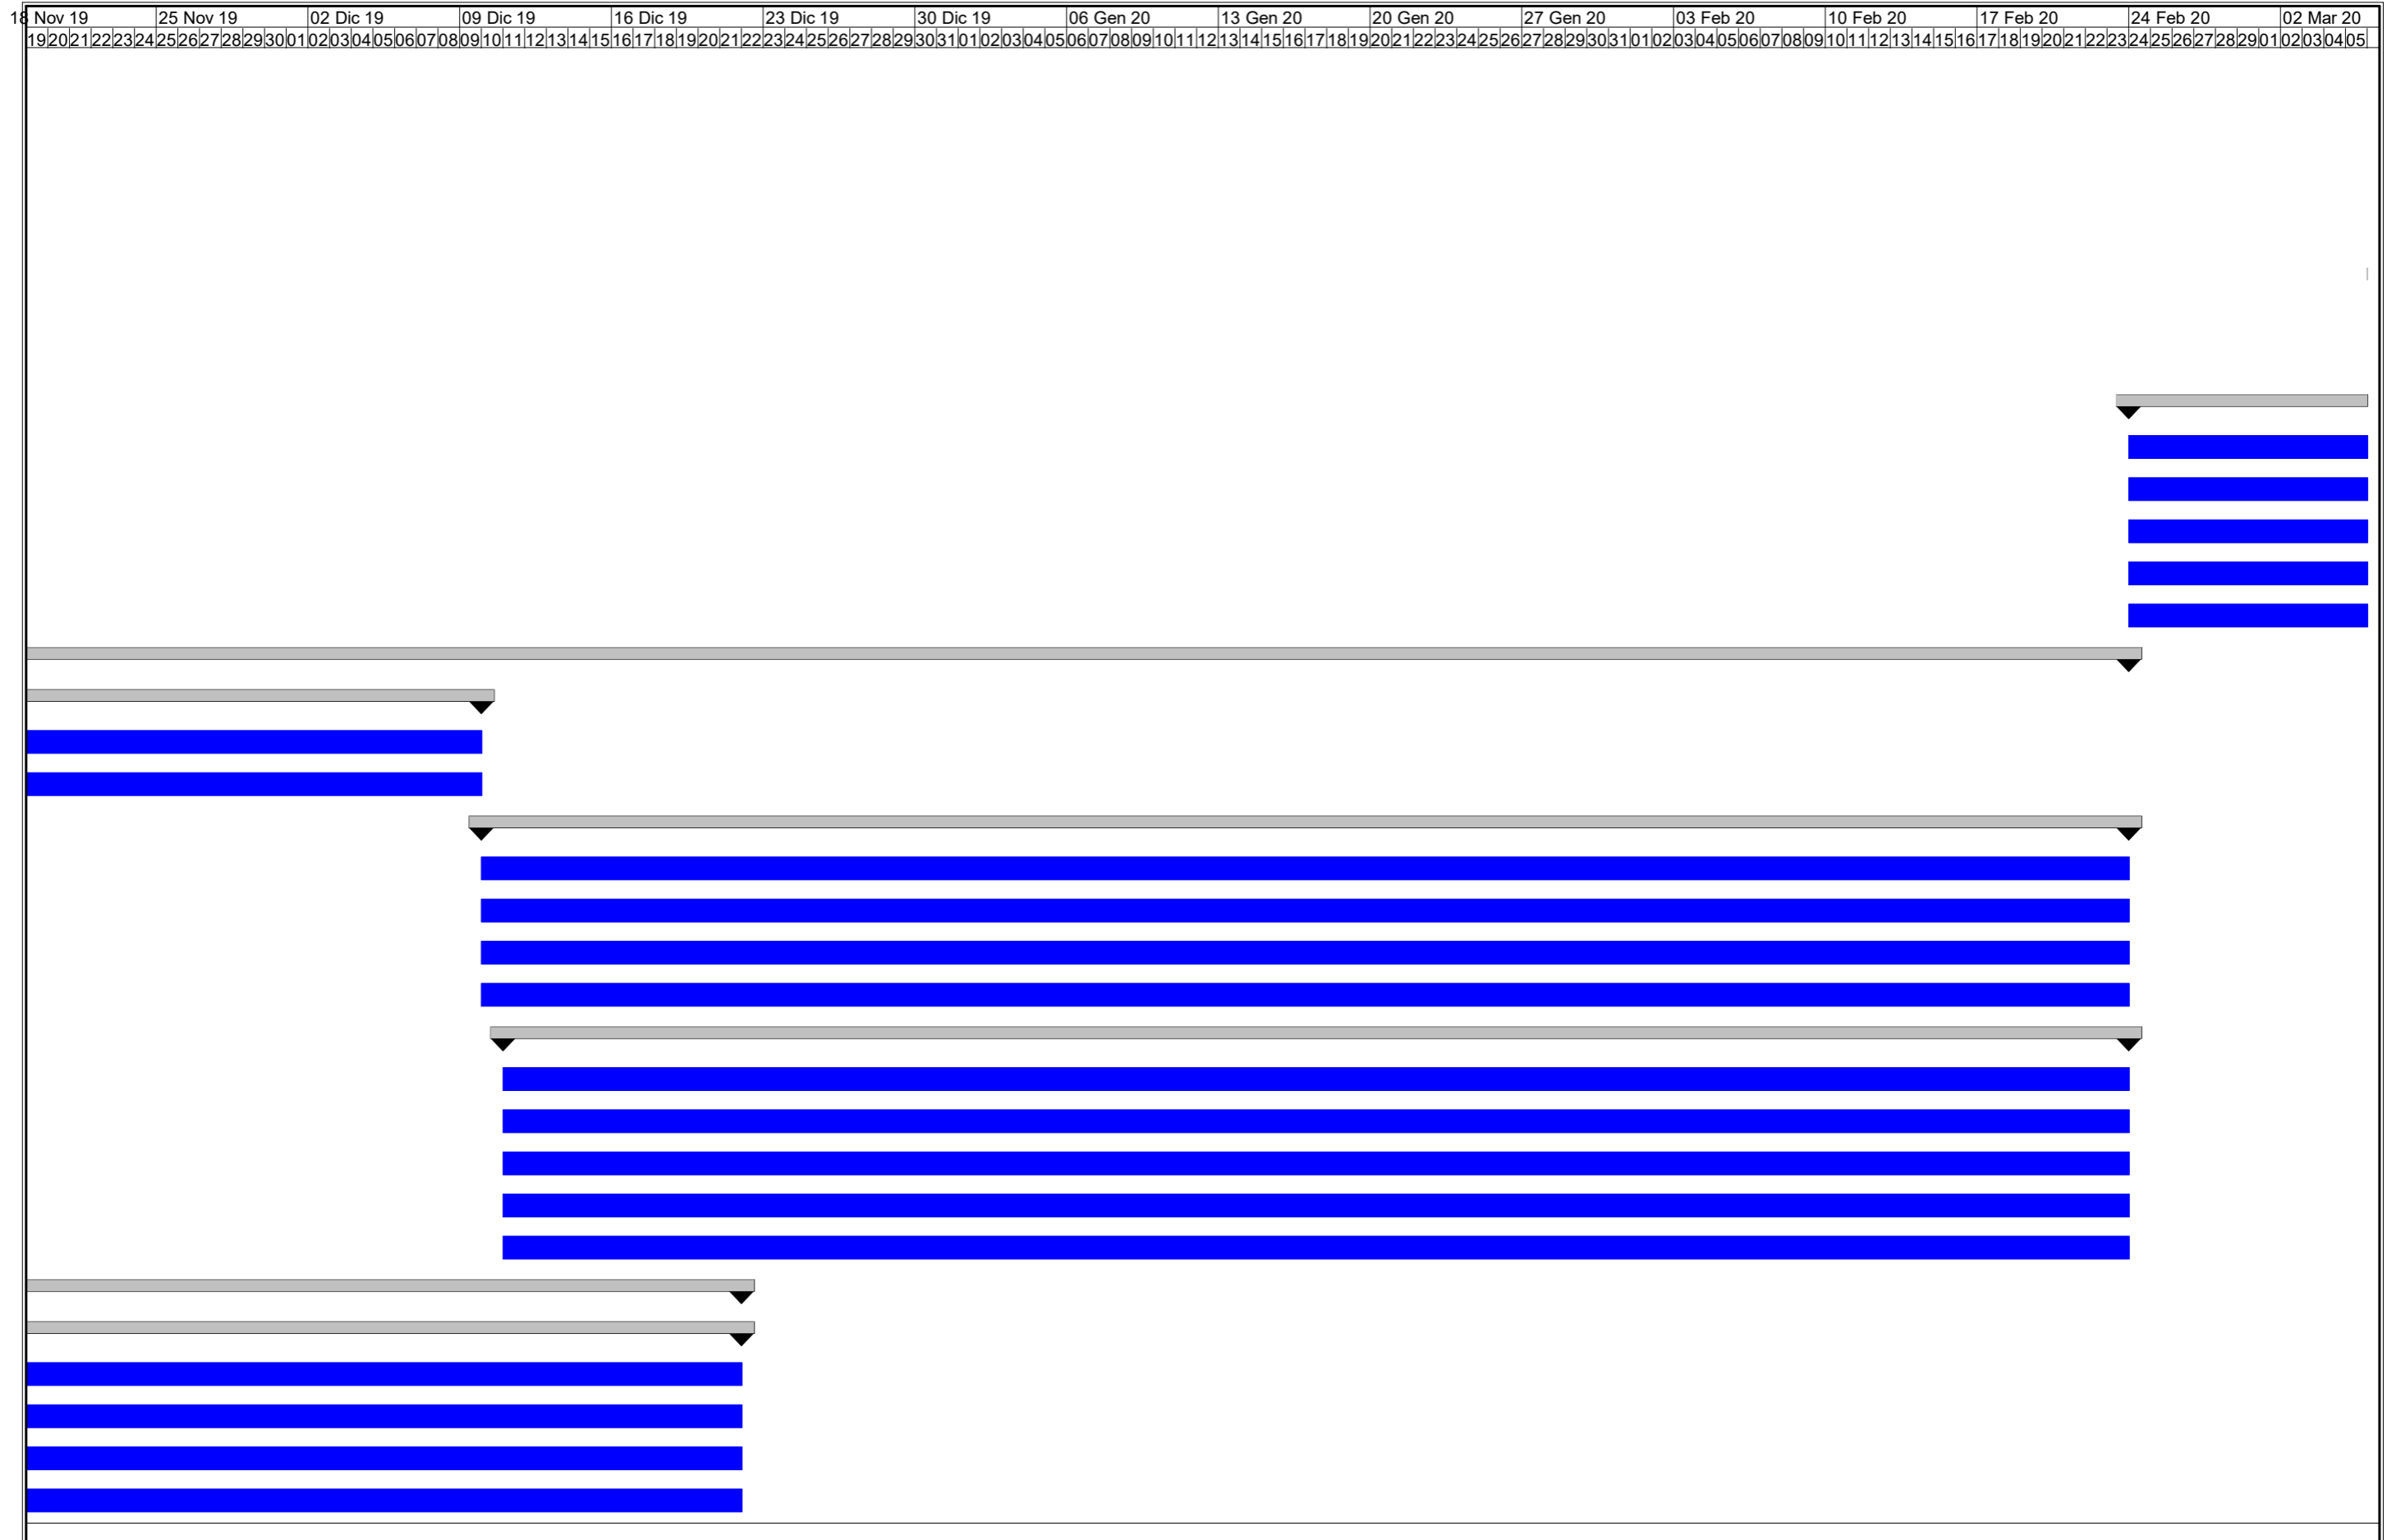




18 Nov 19	25 Nov 19	02 Dic 19	09 Dic 19	16 Dic 19	23 Dic 19	30 Dic 19	06 Gen 20	13 Gen 20	20 Gen 20	27 Gen 20	03 Feb 20	10 Feb 20	17 Feb 20	24 Feb 20	02 Mar 20																															
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	01	02	03	04	05	

09 Mar 20				16 Mar 20				23 Mar 20				30 Mar 20				06 Apr 20				13 Apr 20				20 Apr 20				27 Apr 20				04 Mag 20				11 Mag 20				18 Mag 20				25 Mag 20				01 Giu 20				08 Giu 20				15 Giu 20																					
06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21




09 Mar 20							16 Mar 20							23 Mar 20							30 Mar 20							06 Apr 20							13 Apr 20							20 Apr 20							27 Apr 20							04 Mag 20							11 Mag 20							18 Mag 20							25 Mag 20							01 Giu 20							08 Giu 20							15 Giu 20						
06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																											



09 Mar 20			16 Mar 20			23 Mar 20			30 Mar 20			06 Apr 20			13 Apr 20			20 Apr 20			27 Apr 20			04 Mag 20			11 Mag 20			18 Mag 20			25 Mag 20			01 Giu 20			08 Giu 20			15 Giu 20																																			
06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21



09 Mar 20				16 Mar 20				23 Mar 20				30 Mar 20				06 Apr 20				13 Apr 20				20 Apr 20				27 Apr 20				04 Mag 20				11 Mag 20				18 Mag 20				25 Mag 20				01 Giu 20				08 Giu 20				15 Giu 20																					
06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21



09 Mar 20			16 Mar 20			23 Mar 20			30 Mar 20			06 Apr 20			13 Apr 20			20 Apr 20			27 Apr 20			04 Mag 20			11 Mag 20			18 Mag 20			25 Mag 20			01 Giu 20			08 Giu 20			15 Giu 20				
06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21






22 Giu 20			29 Giu 20			06 Lug 20			13 Lug 20			20 Lug 20			27 Lug 20			03 Ago 20			10 Ago 20			17 Ago 20			24 Ago 20			31 Ago 20			07 Set 20			14 Set 20			21 Set 20			28 Set 20			05 Ott 21																															
22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07

22 Giu 20			29 Giu 20			06 Lug 20			13 Lug 20			20 Lug 20			27 Lug 20			03 Ago 20			10 Ago 20			17 Ago 20			24 Ago 20			31 Ago 20			07 Set 20			14 Set 20			21 Set 20			28 Set 20			05 Ott 21																															
22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07

22 Giu 20	29 Giu 20	06 Lug 20	13 Lug 20	20 Lug 20	27 Lug 20	03 Ago 20	10 Ago 20	17 Ago 20	24 Ago 20	31 Ago 20	07 Set 20	14 Set 20	21 Set 20	28 Set 20	05 Ott 21																														
22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07

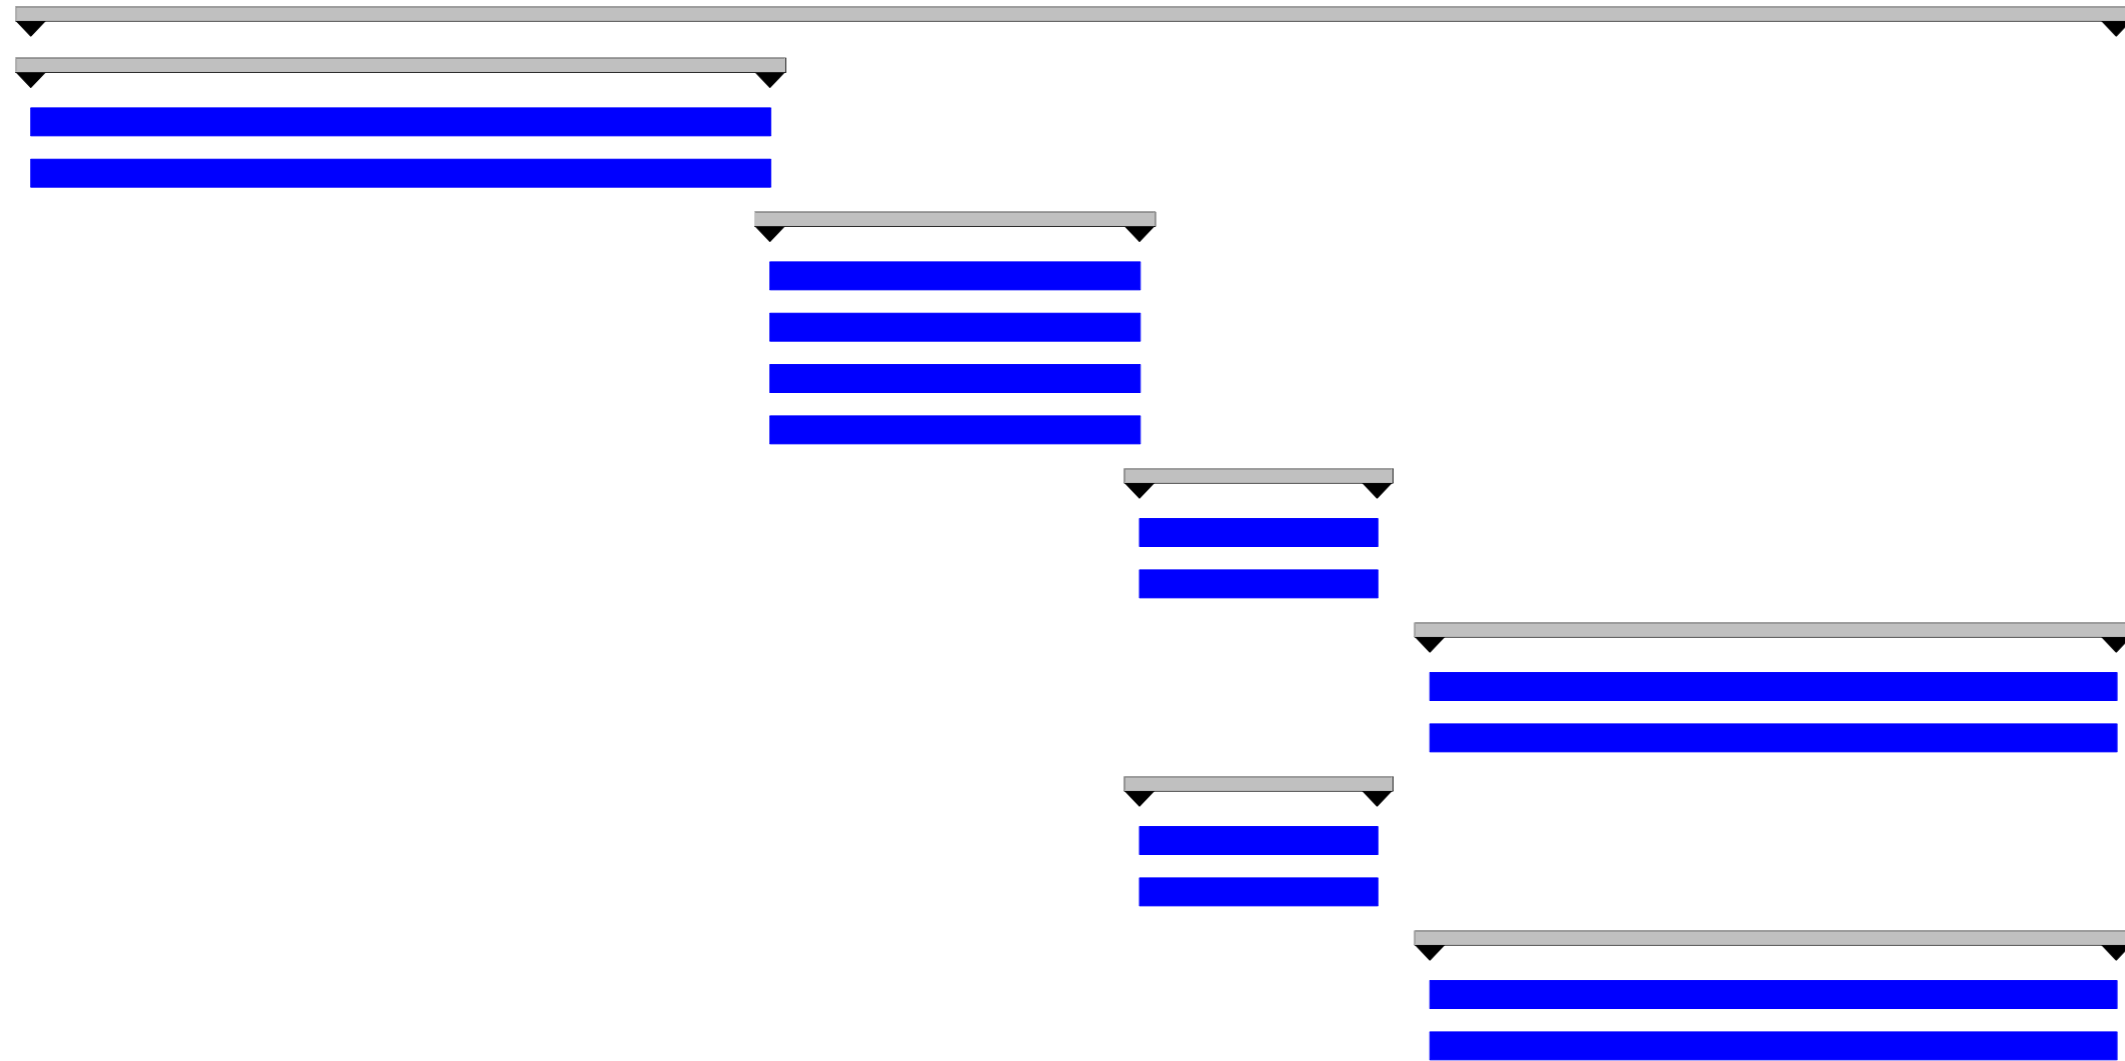

22 Giu 20	29 Giu 20	06 Lug 20	13 Lug 20	20 Lug 20	27 Lug 20	03 Ago 20	10 Ago 20	17 Ago 20	24 Ago 20	31 Ago 20	07 Set 20	14 Set 20	21 Set 20	28 Set 20	05 Ott 21																														
22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07

