

COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale

Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 42 del 31 gennaio 2018

Oggetto: dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi in 5 fasi per attività manutentive dell'asse di collegamento Pigna – Soccavo a partire dal 1 febbraio 2018.

IL DIRIGENTE

Premesso che con nota acquisita al PG/2018//83353 del 25 gennaio 2018, il servizio *Grandi Reti Tecnologiche e Illuminazione Pubblica*, al fine di consentire le urgenti e indifferibili attività manutentive all'impianto di pubblica illuminazione e la realizzazione del lavaggio delle prime tre gallerie sull'asse Pigna - Soccavo, ha richiesto l'attuazione di un dispositivo di traffico di interdizione della viabilità su codesta strada da attuarsi secondo il seguente crono programma:

- fase 1:** chiusura totale **n. 2 giorni**, 1/2/2018 e 2/2/2018 dalle ore 10:00 alle ore 17:00
interdizione dalla rotonda Giustiniano in direzione Vomero;
- fase 2:** chiusura totale **n. 1 giorno**, 5/2/2018 dalle ore 10:00 alle ore 17:00
interdizione rampe direzione "via Epomeo Rione Traiano Fuorigrotta" sia in ingresso all'asse provenienza via Pigna che in uscita da Soccavo in direzione rotonda Giustiniano;
- fase 3:** chiusura totale **n. 2 giorni**, 6/2/2018 e 7/2/2018 dalle ore 10:00 alle ore 17:00
interdizione rampa direzione Tangenziale provenienza via Pigna, rampe direzione Vomero Tangenziale provenienza rotonda Giustiniano e provenienza Soccavo;
- fase 4:** chiusura totale **n. 3 giorni**, 8/02/2018 al 10/2/2018 dalle ore 10:00 alle ore 17:00
interdizione ingresso galleria Pigna da via Pigna;
- fase 5:** chiusura totale **n. 3 giorni**, 12/2/2018 al 14/2/2018 dalle ore 10:00 alle ore 17:00
interdizione rampe direzione Soccavo Rione Traiano Fuorigrotta provenienza via Pigna e provenienza rotonda Giustiniano.

Considerato che per ogni fase di cui in premessa sono previsti i seguenti **percorsi alternativi**:

- fase 1**
provenienza via Giustiniano direzione Vomero-tangenziale: via Piave-via Cilea-tangenziale oppure via Pigna-raccordo tangenziale-via Caldieri;
provenienza via Giustiniano direzione asse perimetrale: via Pigna-raccordo tangenziale-via Caldieri-via Pigna-asse perimetrale oppure via Epomeo-via dello Sport-asse perimetrale;
- fase 2**
provenienza asse perimetrale direzione via Giustiniano: uscita Caldieri-via Pigna-via Giustiniano;
provenienza via Pigna direzione via Giustiniano: proseguire via Pigna;
- fase 3:**
provenienza via Pigna direzione tangenziale-via Caldieri: proseguire via Pigna e svolta per via Caldieri;
provenienza asse perimetrale direzione Vomero-tangenziale: via Pigna-tangenziale;
provenienza via Giustiniano direzione Vomero-tangenziale: via Pigna-tangenziale;
- fase 4:**
provenienza via Pigna direzione tangenziale-via Caldieri: proseguire via Pigna e svolta per via Caldieri;
provenienza via Pigna direzione via Giustiniano: proseguire via Pigna;
provenienza via Pigna direzione asse perimetrale: proseguire via Pigna-rotonda via Giustiniano-asse perimetrale Soccavo;
- fase 5:**
provenienza via Giustiniano direzione asse perimetrale: via Pigna-raccordo tangenziale-via Caldieri;
provenienza via Pigna direzione asse perimetrale: : proseguire via Pigna-rotonda via Giustiniano-via Epomeo-via dello Sport.

Letto il verbale di riunione del 25/1/2018, dove erano presenti il servizio *Polizia locale U.O. Vomero, Polizia locale U.O. Soccavo, Grandi Reti Tecnologiche e Illuminazione Pubblica e Citelum SA*, che si allega al presente atto in uno con la rappresentazione grafica delle cinque fasi lavorative.

Preso atto che il dispositivo è stato approvato nella seduta del 30 gennaio 2018 della *Conferenza Permanente dei Servizi per l'organizzazione del piano di traffico relativi all'attuazione dei cantieri di lavoro e della manifestazioni*.

Ritenuto di attuare, per motivi di sicurezza, il provvedimento riportato nella parte dispositiva del presente atto.

Letti altresì il D. L.vo 30/04/1992 n. 285 e successive integrazioni ed il D. L.vo 267/2000.

ORDINA

Istituire sull'asse di collegamento Pigna - Soccavo il seguente dispositivo di traffico temporaneo a partire dal 1 febbraio 2018, rispettando il seguente crono programma e come dai grafici allegati:

- fase 1:** **divieto di transito per n. 2 giorni, dal 1/2/2018 al 2/2/2018, dalle ore 10:00 alle ore 17:00**, con interdizione delle rampe dalla rotonda Giustiniano in direzione Vomero e asse perimetrale;
- fase 2:** **divieto di transito per n. 1 giorni, 5/2/2018, dalle ore 10:00 alle ore 17:00**, con interdizione delle rampe in direzione via Giustiniano provenienti sia da via Pigna, sia dall'asse perimetrale;
- fase 3:** **divieto di transito per n. 2 giorni, dal 6/2/2018 al 7/2/2018, dalle ore 10:00 alle ore 17:00**, con interdizione della rampa in direzione tangenziale proveniente da via Pigna, nonché della rampe in direzione Vomero tangenziale provenienti sia dall'asse perimetrale che da via Giustiniano;
- fase 4:** **divieto di transito per n. 3 giorni, dal 8/2/2018 al 10/2/2018, dalle ore 10:00 alle ore 17:00**, con interdizione di tutte le rampe provenienti da via Pigna a partire dalla galleria Pigna;
- fase 5:** **divieto di transito per n. 3 giorni, dal 12/2/2018 al 14/2/2018, dalle ore 10:00 alle ore 17:00**, con interdizione delle rampe in direzione asse perimetrale provenienti sia da via Giustiniano che da via Pigna.

L'installazione di idonea segnaletica di cantiere e stradale per la pubblica e privata sicurezza, necessaria per l'istituzione del presente dispositivo provvisorio ed il ripristino al termine dei lavori, è a carico dell'impresa *Citelum Napoli illuminazione* esecutrice dei lavori. Sarà cura della *Citelum* apporre la segnaletica riportante i percorsi alternativi. **Attesa la natura temporanea del provvedimento, il presente dispositivo sarà attuato attraverso sbarramenti materiali opportunamente segnalati, anche con dispositivi luminosi, da installarsi secondo indicazioni del servizio Polizia Locale, nonché con il relativo presidio.**

Sono a carico del Direttore dei Lavori *la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica prima dell'inizio dei lavori; il ripristino al termine dei lavori della segnaletica preesistente; la comunicazione, al servizio Mobilità Sostenibile ed al servizio autonomo Polizia Locale, dell'eventuale modifica delle date di inizio e fine lavori.*

Ogni altra Ordinanza, in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.

Il servizio autonomo *Polizia Locale* è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed eventualmente potrà adottare tutti i necessari accorgimenti qualora se ne presenti l'esigenza.

Il servizio autonomo *Polizia Locale*, unitamente a tutte le forze di Polizia, previste dall'art.12 del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992, vigilerà per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle *Infrastrutture e dei Trasporti*, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente
arch. Emilia G. Trifiletti

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.



VERBALE DI RIUNIONE

OGGETTO: attività manutentive impianto di pubblica illuminazione su tratti del raccordo Pigna-Soccavo

Il giorno 25/01/2018 alle ore 15:00 a seguito contatti per le vie brevi del Servizio Grandi Reti Tecnologiche e Illuminazione Pubblica sono convenuti negli uffici della Polizia Locale U.O. Vomero: comandante di reparto Gaetano FRATTINI per SAPL U.O. Vomero; capitano Giulia BOTTA per SAPL U.O. Soccavo; ing. Mario ASSEDIATO per Gestore illuminazione pubblica -Citelum SA; ing. Arnaldo STELLA per il Servizio Grandi Reti Tecnologiche e Illuminazione Pubblica.

Premesso che il gestore ha rappresentato al Servizio Grandi Reti Tecnologiche e Illuminazione Pubblica la necessità di dover intervenire sulle lampade dell'illuminazione pubblica su più tratti dell'asse Pigna-Soccavo, come rappresentato nell'allegato layout delle proposte di chiusura, chiedendo, per l'esecuzione in sicurezza dell'intervento, le necessarie chiusure di detti tratti stradali dalle ore 10:00 alle ore 17:00 dei giorni indicati nel medesimo allegato.

Alla luce di quanto sopra, il Servizio Grandi Reti Tecnologiche e Illuminazione Pubblica ha convocato per le vie brevi il Servizio Polizia Locale U.O. Vomero, il Servizio Polizia Locale U.O. Soccavo, il Gestore Citelum SA allo scopo di concordare, ai fini della sicurezza stradale, le attività di cui in oggetto.

I rappresentatnti dei SAPL U.O. Vomero e SAPL U.O. Soccavo esprimono NULLA OSTA ai fini della viabilità per l'esecuzione degli interventi demandando alla Citelum SA l'apposizione di idonea segnaletica di cantiere e stradale per la pubblica e privata sicurezza. Sarà cura della Citelum apporre cartellonistica riportante i percorsi alternativi agli sbarramenti:

FASE1: coinvolta unicamente l'U.O. Soccavo con assistenza all'apposizione della segnaletica di chiusura i giorni 1 e 2 febbraio 2018 alle ore 9:30 alla rotonda Giustiniano.

FASE 2:
coinvolta l'U.O.Vomero con assistenza all'apposizione della segnaletica di chiusura il giorno 5 febbraio 2018 ore 9:30 uscita "Fuorigrotta Epomeo Soccavo" provenienza via Pigna
coinvolta l'U.O.Soccavo con assistenza all'apposizione della segnaletica di chiusura il giorno 5 febbraio 2018 ore 9:30 uscita "Fuorigrotta Epomeo Soccavo" provenienza Soccavo.

FASE 3:
coinvolta l'U.O.Vomero con assistenza all'apposizione della segnaletica di chiusura i giorni 6 e 7 febbraio 2018 ore 9:30 raccordo accesso Tangenziale provenienza via Pigna
coinvolta l'U.O.Soccavo con assistenza all'apposizione della segnaletica di chiusura i giorni 6 e 7 febbraio 2018 ore 9:30 uscite direzione Vomero provenienza Soccavo e provenienza rotonda Giustiniano.

FASE 4: coinvolta unicamente l'U.O. Vomero con assistenza all'apposizione della segnaletica di chiusura i giorni 8, 9 e 10 febbraio 2018 alle ore 9:30 all'ingresso galleria Pigna.

FASE 5:
coinvolta l'U.O.Vomero con assistenza all'apposizione della segnaletica di chiusura i giorni dal 12 al 17 febbraio 2018 ore 9:30 uscita "Fuorigrotta Epomeo Soccavo" provenienza via Pigna
coinvolta l'U.O.Soccavo con assistenza all'apposizione della segnaletica di chiusura il giorno dal 12 al 17 febbraio 2018 ore 9:30 ingresso verso Soccavo provenienza via Epomeo.

Ai fini della necessità di eventuali comunicazioni si riporta il nominativo e i rispettivi numeri di telefono :
per Citelum ing. Mario Assediato tel.3485399573

per U.O. Vomero 0817952739
per U.O. Soccavo 0817957306
per il servizio Grandi Reti Tecnologiche e Illuminazione Pubblica ing. Arnaldo STELLA 3386865608

Del che è verbale che, letto e confermato, alle ore 16:10 viene sottoscritto dai convenuti.

ING. ARNALDO STELLA

ING. MARIO ASSEDIATO

COMANDANTE REP. GAETANO

CAPITANO GIULIA

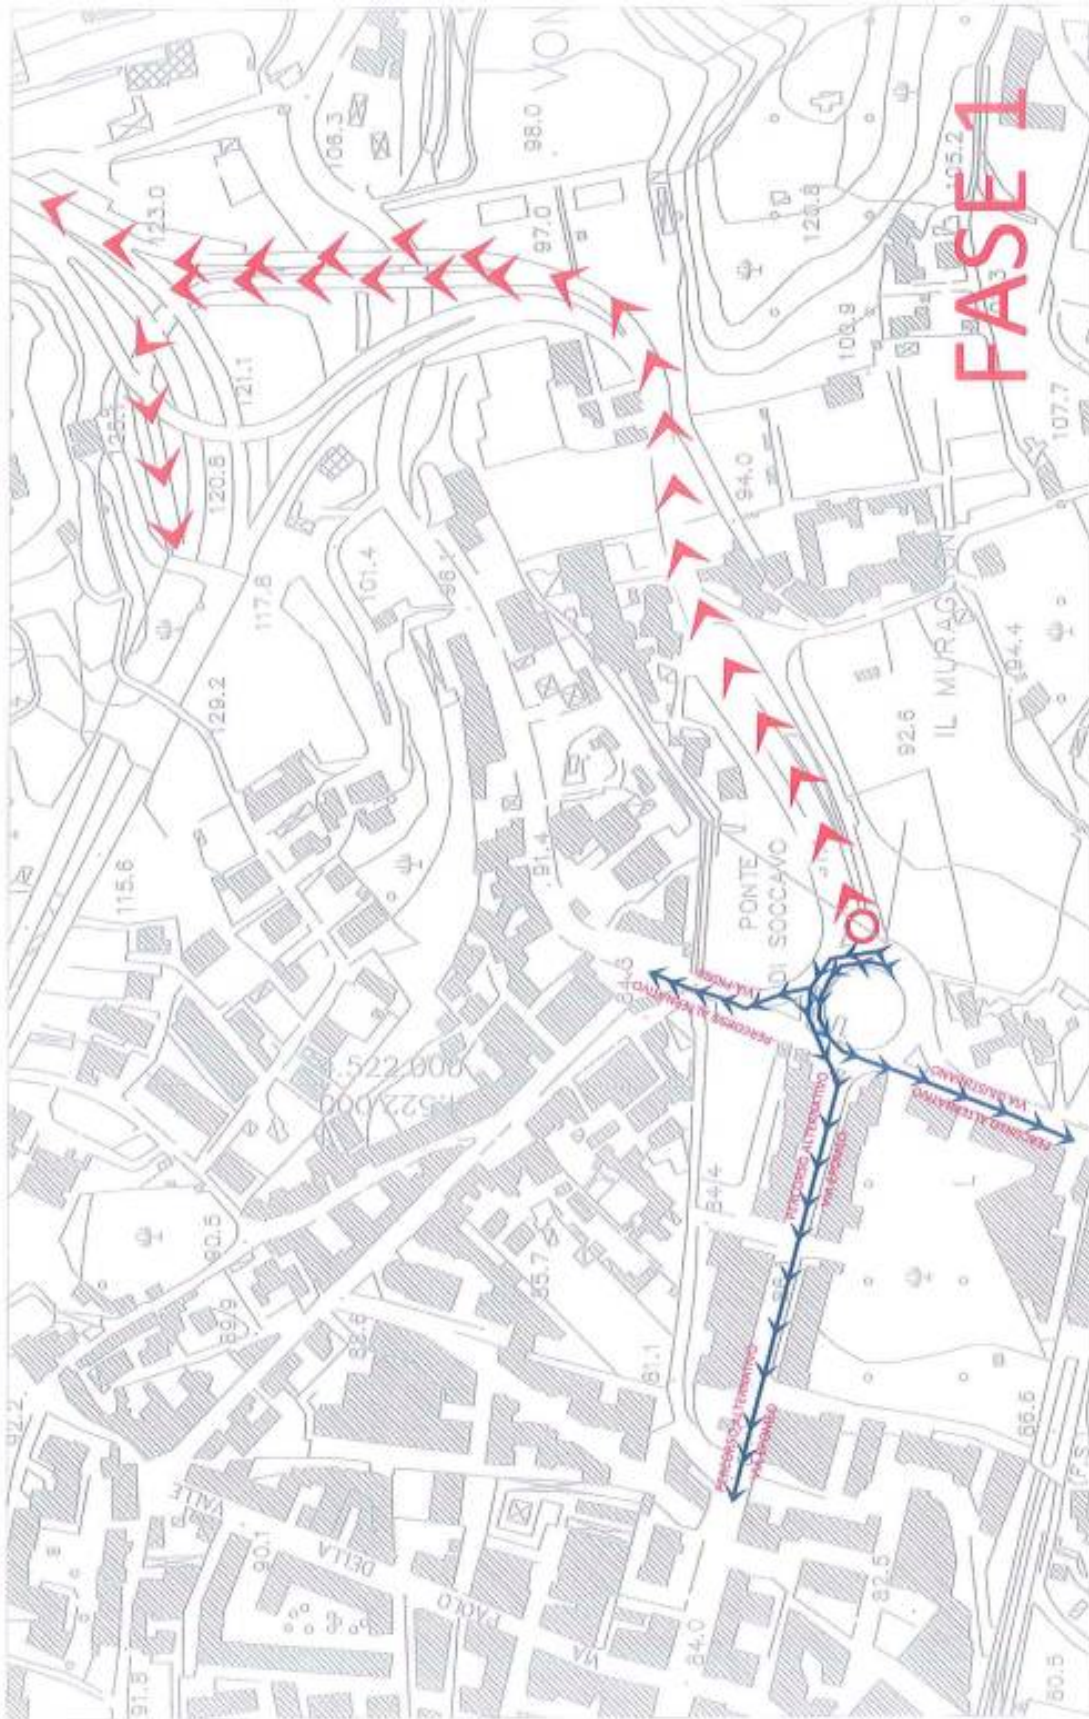

Arnaldo Stella

FRATTINI

BOTTA



FASE 1 - DAL 1/2/2018 AL 2/2/2018 - ORE 10:00 ALLE ORE 17:00



FASE 4 - DAL 8/2/2018 AL 10/2/2018 - ORE 10:00 ALLE ORE 17:00

