

LINEA 6 – METROPOLITANA DI NAPOLI

				(PRIMA EMISSIONE) MARZO 2016	MAR 16		
Albinati	De Risi	Manferlotti	Di Luccio				
REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	AUTORIZZATO	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV	

Ansaldo STS
A Hitachi Group Company

CONCESSIONARIA



COMUNE DI NAPOLI

CONCEDENTE

PROG		IMP		NUMERO			
L	M	6	7	F	X	2	D E 5 5
CODICE PRODOTTO				AREA		TIPO	FASE

					2	D			E	S
--	--	--	--	--	---	---	--	--	---	---

A termini di legge è rigorosamente vietato riprodurre e comunicare a terzi il contenuto del presente documento

TITOLO DOCUMENTO:

LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI
PROGETTO ESECUTIVO
OPERE CIVILI – MONITORAGGIO GEOTECNICO GEOREFERENZIATO
REPORT DELLE MISURE – STAZIONE MUNICIPIO

EMITTENTE



METROPOLITANA DI NAPOLI S.p.A.
RESPONSABILE PROGETTAZIONE OPERE CIVILI

A.T.I. LM6



Monitoraggio delle gallerie e prove di laboratorio per la qualifica dei materiali e loro controllo
Monitoraggio opere civili e monitoraggio ambientale

CODICE ENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

FORMATO

A4

SCALA

/

FOGLIO

1 DI 56

INDICE

1.PREMESSA	3
2.DATI GENERALI	4
3.STRUMENTAZIONE ESTERNA INSTALLATA	5
4.PLANIMETRIA STRUMENTAZIONE MONITORAGGIO	6
5. PLANIMETRIA E SEZIONI ANDAMENTO TETTO DEL TUFO	8
6.FASI LAVORATIVE	10
7.MISURE GEOTECNICHE-ESTENSIMETRICHE	12
8.MISURE GEOTECNICHE-INCLINOMETRICHE	20
9. MISURE GEOTECNICHE-PIEZOMETRICHE	31
10. MISURE TOPOGRAFICHE-CAPISALDI	48
ALLEGATO 1 – MANUTENZIONE	51

1. PREMESSA

Nell'ambito della realizzazione della nuova Metropolitana di Napoli (**Linea 6, tratta Mergellina - Municipio**) è prevista una rete di monitoraggio e controllo finalizzata alla periodica registrazione delle grandezze fisiche di maggiore interesse e agli effetti legati alle attività di cantiere.

In generale, per le stazioni il sistema di monitoraggio prevede i seguenti strumenti:

- Capisaldi di livellazione, posti sul terreno e sui marciapiedi degli edifici adiacenti il pozzo di stazione;
- Staffe livellometriche, poste sugli edifici adiacenti il pozzo di stazione;
- Piezometri Casagrande o a tubo aperto, realizzati in prossimità delle paratie del pozzo di stazione;
- Piezometri elettrici, realizzati all'interno del pozzo di stazione;
- Inclinometri ed estenso-inclinometri, realizzati in prossimità delle paratie del pozzo di stazione;
- Inclinometri, realizzati nelle paratie perimetrali del pozzo di stazione;
- Mire ottiche, poste sulle paratie all'interno del pozzo di stazione
- Celle di carico, disposte sui puntoni metallici di contrasto;
- Barrette estensimetriche, disposte sui puntoni metallici di contrasto e/o all'interno delle paratie perimetrali del pozzo di stazione.

L'installazione di tale strumentazione impiegata lungo le aree di cantiere (stazione Chiaia, S. Pasquale, Arco Mirelli e Municipio) risulta completa all'interno ed all'esterno dei pozzi di stazione; diversamente, quella relativa alla Galleria di linea è ad oggi in fase d'installazione.

Di seguito saranno restituiti i grafici frutto delle letture svolte nel cantiere, relativi alla sola strumentazione esterna:

- Inclinatori, Estensimetri, Piezometri, acquisizione elaborazione restituzione dati competenza Tre Esse.
- Staffe di livellazione, Capisaldi acquisizione competenza ATI, elaborazione restituzione dati competenza Tre Esse.

2. DATI GENERALI

Commessa: Linea 6 – Metropolitana Di Napoli

Impresa esecutrice: Metrotec S.c.a.r.l.

Monitoraggio: Tre Esse Engineering S.r.l.

3. STRUMENTAZIONE ESTERNA INSTALLATA

La nomenclatura della strumentazione di monitoraggio ha subito una variazione, necessaria per rendere uniforme ed univoco il nome di ogni strumento installato lungo tutta la tratta.

Esempio:

MU_ES2;

MU_STL01_1

la prima serie di simboli identifica la stazione di monitoraggio in questo caso Municipio,

la seconda è identificativa dello strumento,

la terza solo per staffe e capisaldi corrisponde al numero civico del fabbricato presso cui sono stati installati.

Elenco strumentazione installata e funzionante.

- n°4 Estenso-inclinometri MU_ES1, MU_ES2, MU_ES3, MU_ES4
- n°4 Inclinometri MU_EI1, MU_EI2, MU_EI3, MU_EI4
- n°6 Piezometri MU_PZ1, MU_PZ2, MU_PZ3, MU_PZ4,
MU_PZ5, MU_PZ6
- n°28 Capisaldi MU_CS01-28

4. PLANIMETRIA STRUMENTAZIONE MONITORAGGIO

Nella figura successiva viene rappresentata la planimetria del cantiere e la disposizione degli strumenti previsti per il monitoraggio topografico e geotecnico, installati esternamente al pozzo stazione.

Inoltre vengono indicati i nuovi nomi degli strumenti, la nuova nomenclatura risulta necessaria per poter uniformare l'intera Linea 6. Di seguito nelle tabelle riepilogative strumentazione verranno messi a confronto vecchi e nuovi nomi, per rendere più semplice l'adozione del nuovo sistema.

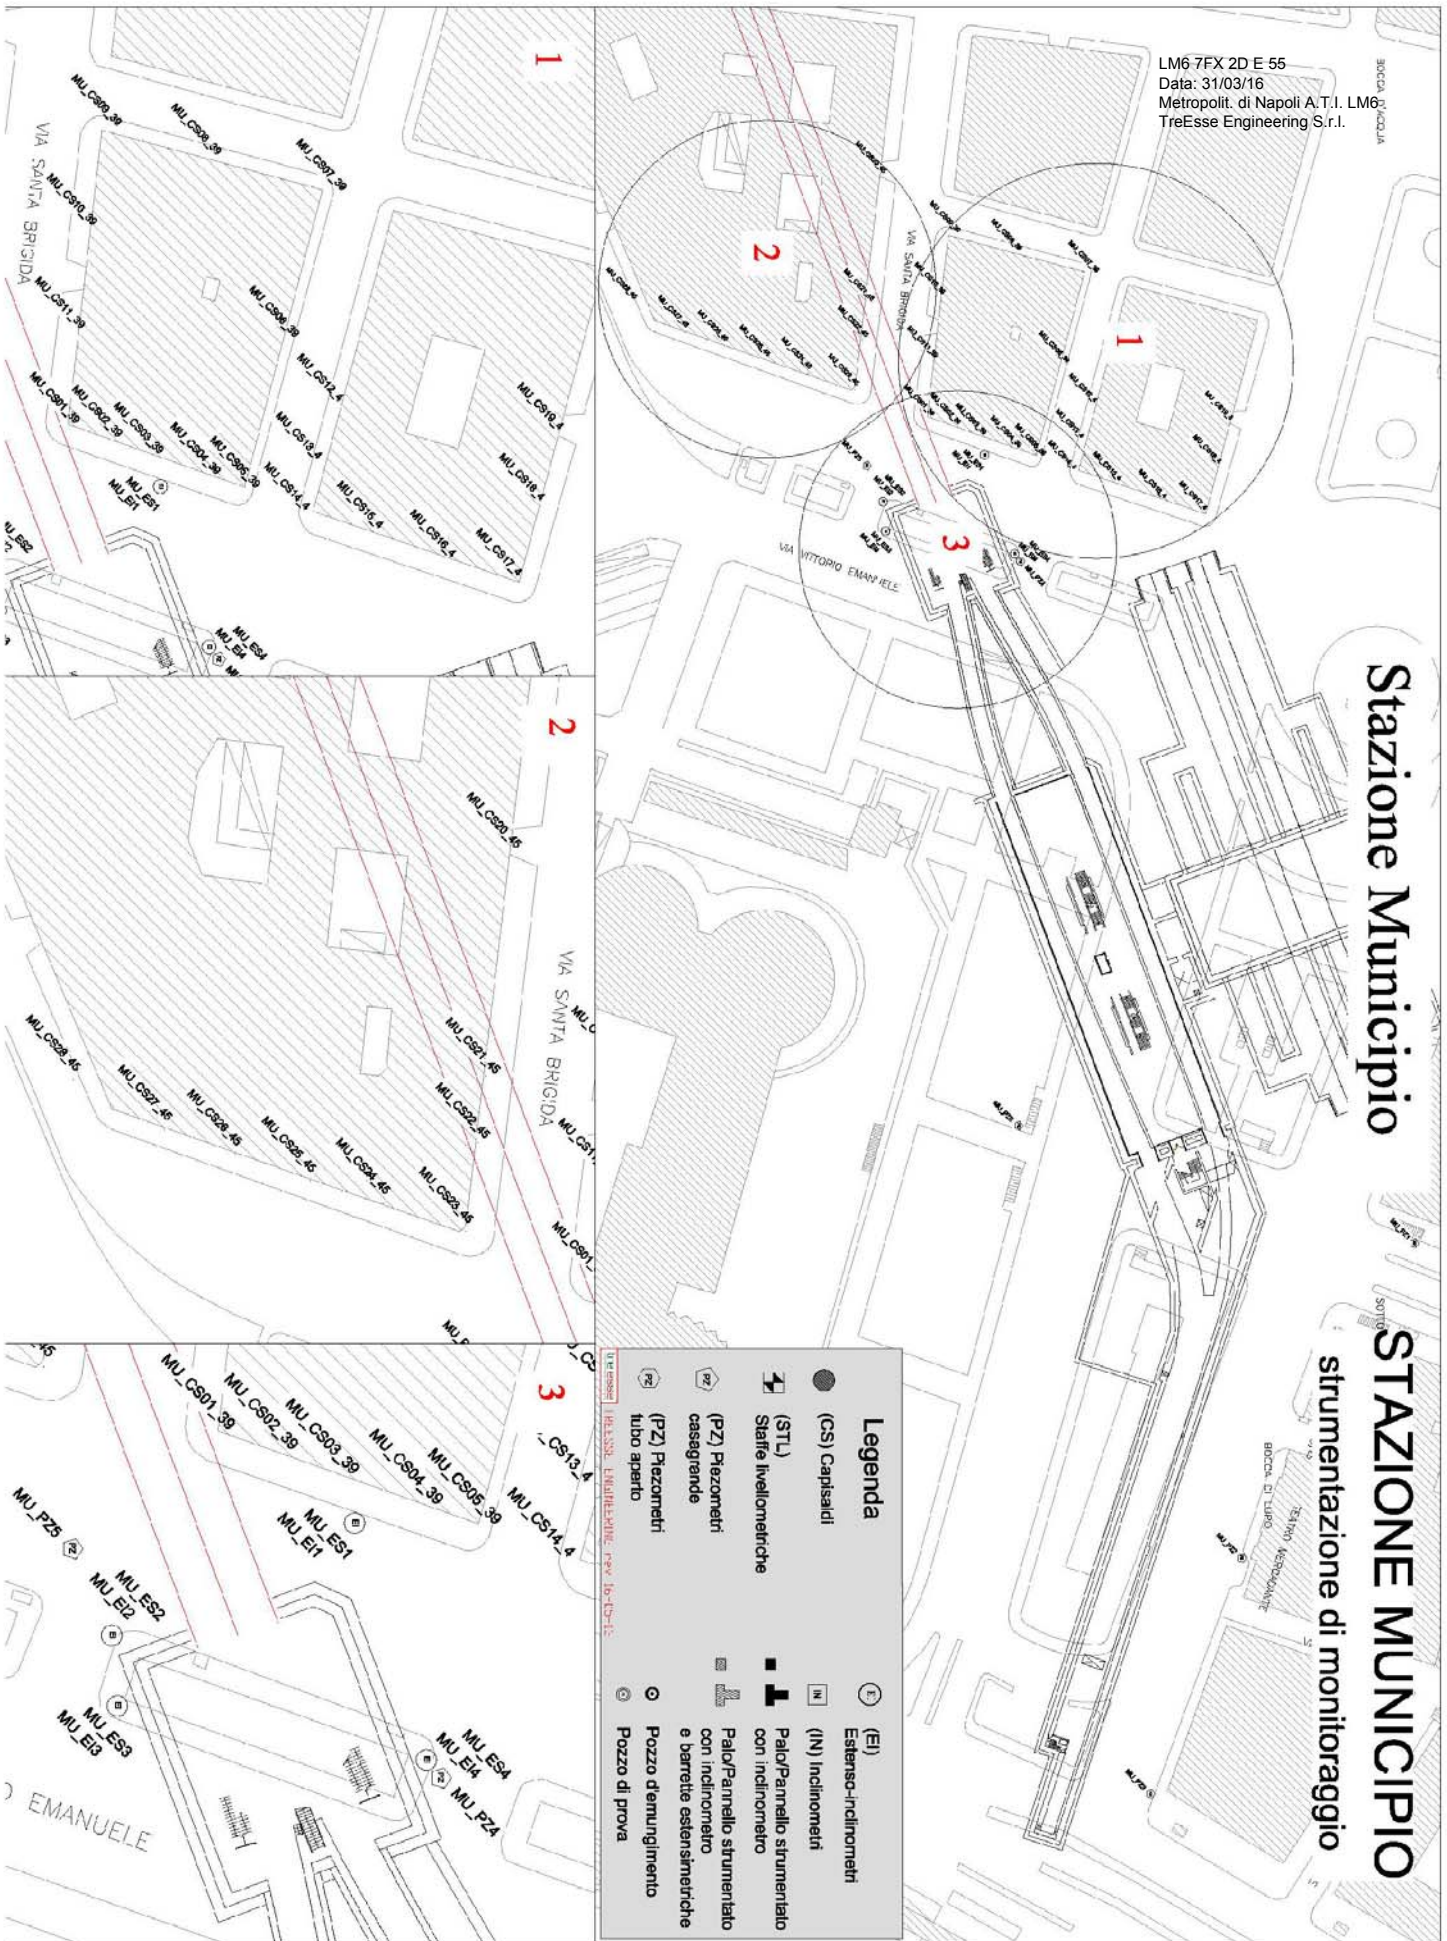


Figura 4.1.: Planimetria pozzo stazione, raffigurante la disposizione della strumentazione di monitoraggio topografico e geotecnico esterna.

5. PLANIMETRIA E SEZIONI ANDAMENTO TETTO DEL TUFO

Nella figura 5.1 viene rappresentato l'andamento del tetto del Tufo con uno stralcio tratto dalla Relazione Geologica Progetto Esecutivo (cod. doc.:LM67FX00014_01 – ANNO 2010).

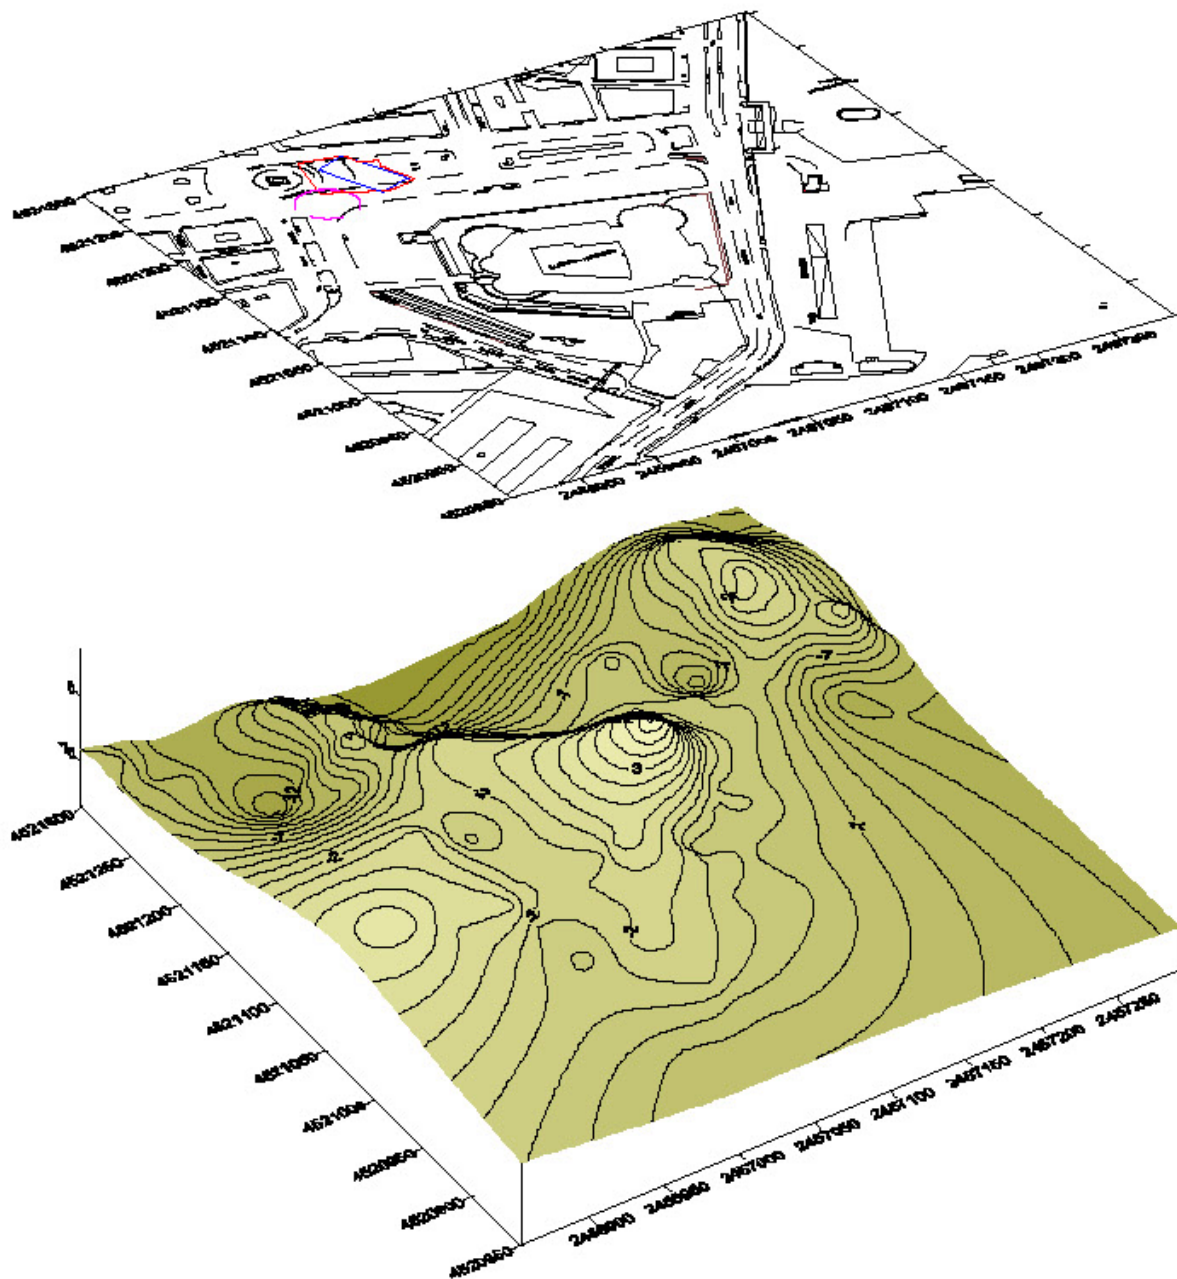


Figura 5.1.: Andamento del tetto del Tufo - Stralcio della Relazione Geologica Progetto Esecutivo (cod. doc.: LM67FX200014 – ANNO 2010).

6.FASI LAVORATIVE

Nel presente capitolo vengono esposte le principali lavorazioni in svolgimento nel cantiere di Municipio (Metropolitana di Napoli - Linea 6).

Le indicazioni riportate, aggiornate al periodo di riferimento del presente report, sono frutto sia delle osservazioni in sito dei tecnici Tre Esse sia delle informazioni comunicateci dall'Impresa Esecutrice.

Nella planimetria realizzata dalla Scrivente, di seguito riportata, è stata individuata e stimata qualitativamente l'area interessata dalle lavorazioni ritenute significative ai fini del monitoraggio.

Riferendoci alla planimetria (fig.6.1), si osserva quanto di seguito riportato:

Sul solettone di fondo del pozzo di estrazione, è stato realizzato un alloggiamento in calcestruzzo per favorire le operazioni di smontaggio TBM .

La strumentazione geotecnica presente in cantiere come mostrato in planimetria è la seguente:

- tubi estenso-inclinometrici MU_EI1/ES1, MU_EI2/ES2, MU_EI3/ES3, MU_EI4/ES, tubi piezometrici (a tubo aperto) MU_PZ1, MU_PZ2, MU_PZ3, MU_PZ4.

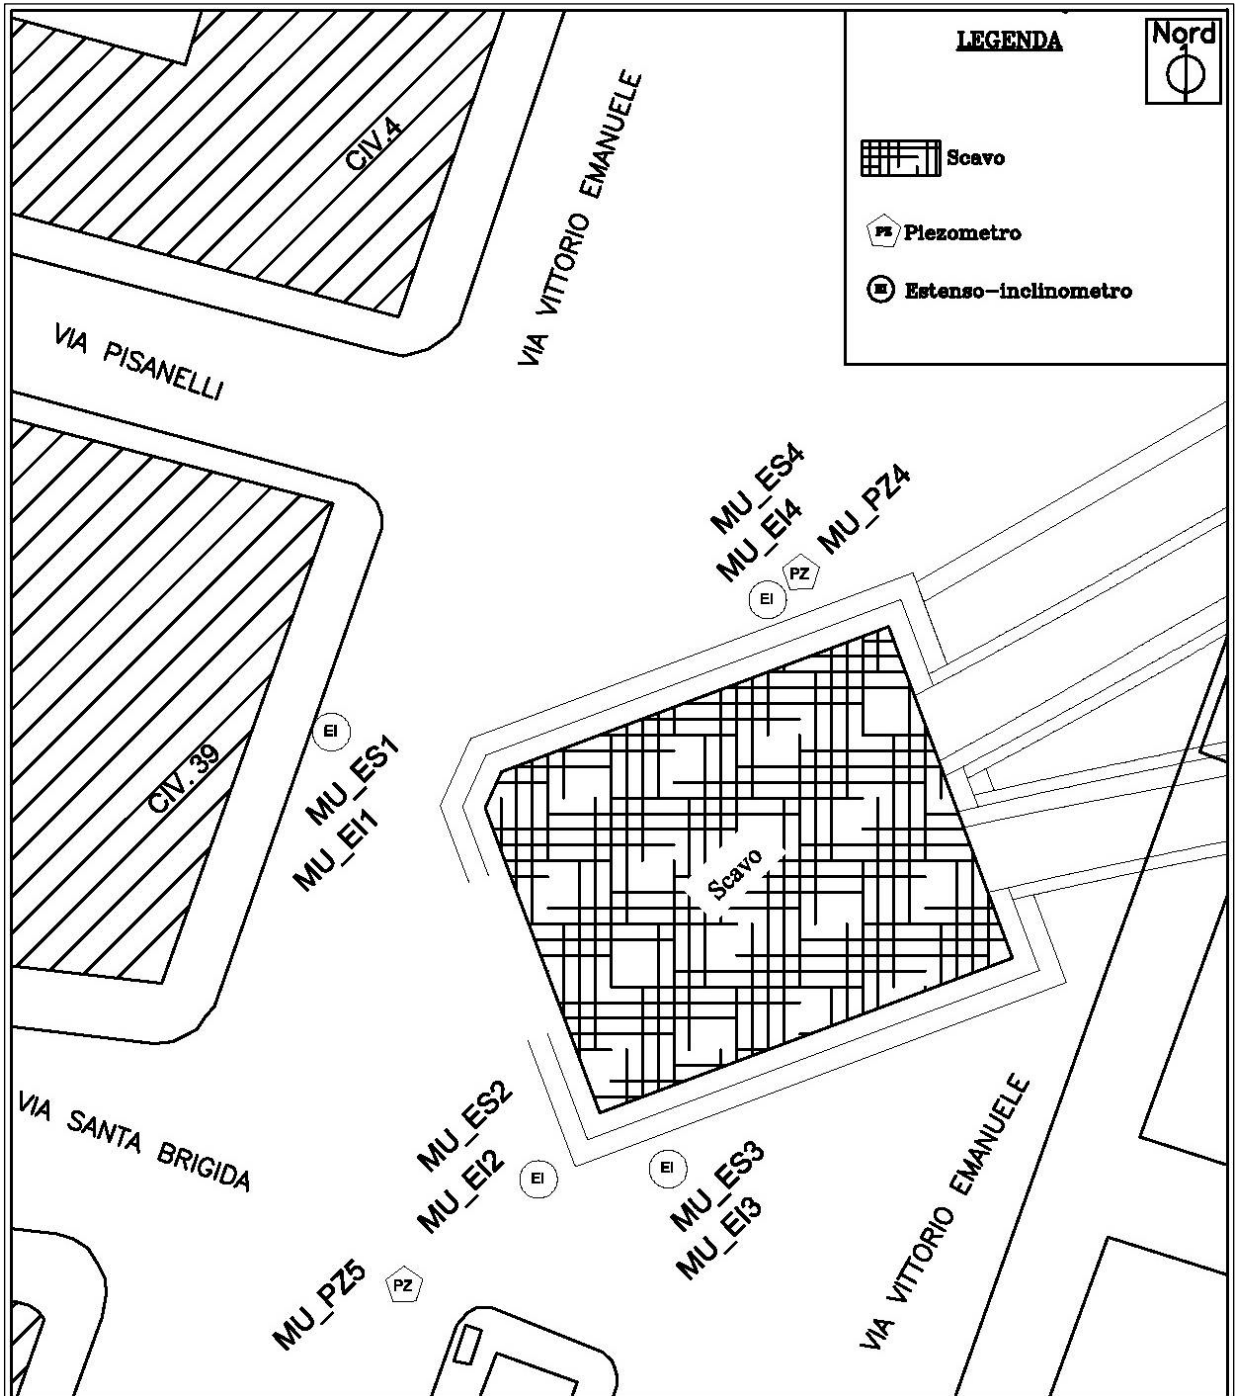


Figura 6.1.: Planimetria pozzo estrazione TBM.

7.MISURE GEOTECNICHE – ESTENSIMETRICHE

Gli estensimetri consentono di misurare i movimenti dell'ammasso lungo l'asse z. La misura si effettua rilevando la distanza fra anelli magnetici montati originariamente ad 1m di distanza l'uno dall'altro, su tubi "tipo inclinometrico", la variazione della loro distanza verrà registrata tramite un sistema composto da sonda e centralina estensimetrica.


Tabella riepilogativa per gli estensimetri installati in cantiere

NOME NUOVO	TIPOLOGIA STRUMENTO	DATA INSTALLAZIONE	DISPONIBILITA' LETTURA			NOTE
			DATA LETTURA DI ZERO	PERIODO INTERRUZIONE	DATA FINE ATTIVITA'	
MU_ES1	ESTENSIMETRO	24/03/11	07/04/11			
MU_ES2	ESTENSIMETRO	15/03/11	07/04/11		21/05/15	(*)
MU_ES3	ESTENSIMETRO	17/03/11	07/04/11		21/05/15	(*)
MU_ES4	ESTENSIMETRO	12/03/11	07/04/11		21/05/15	(*)

(*) Per lo strumento, nel periodo relativo al presente report, non ci sono misure disponibili da consegnare.

Estenso-inclinometro

MU_ES1

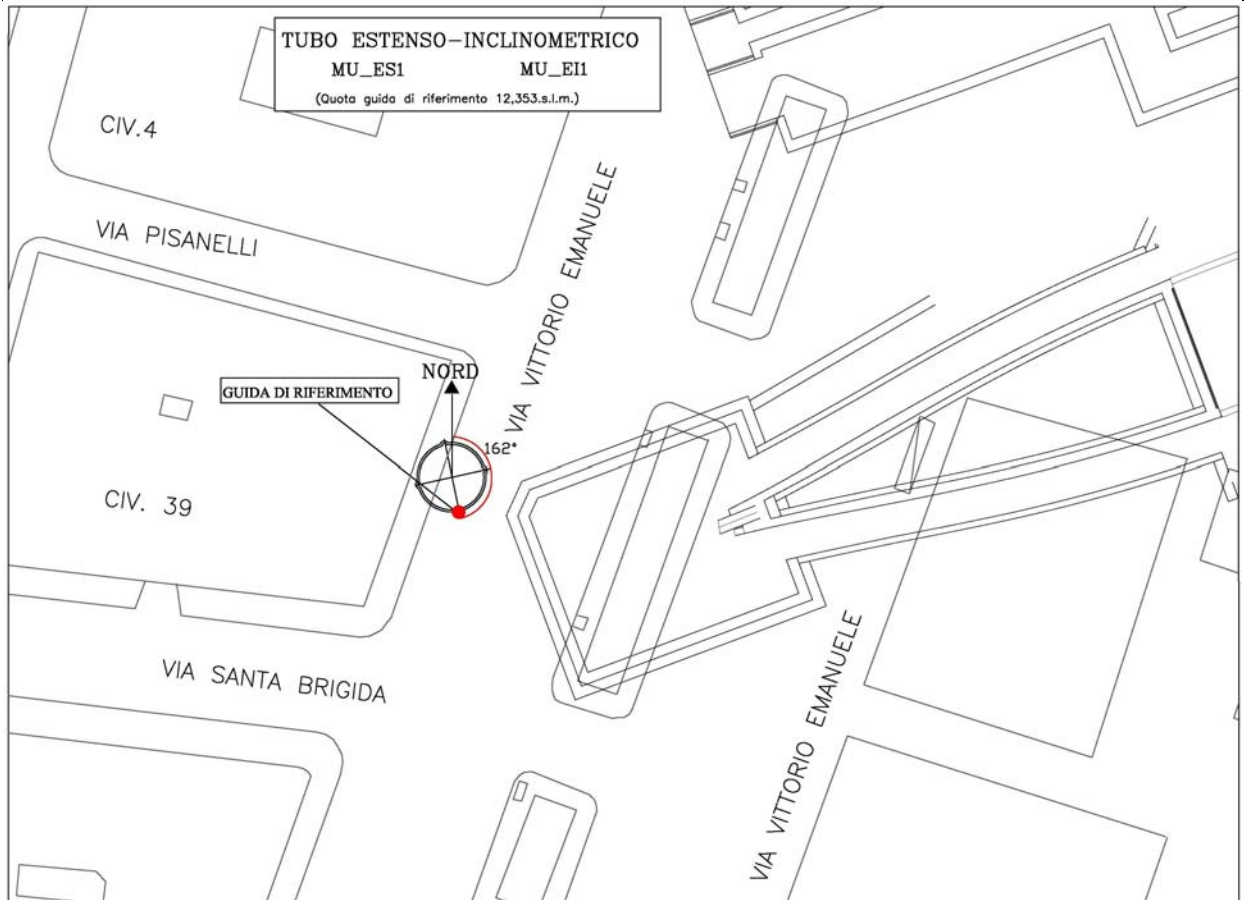

Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X

Congruenza progettuale

C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza

NOTE



Ubicazione	STAZIONE MUNICIPIO
Opera	Tubo estensimetrico
Nome tubo	MU_ES1
Data posa in opera	24/03/2011
Data lettura di zero	07/04/2011

Ultima misura	In data
92	14/3/16 12:30

TABULATI (I)

QUOTA ASSOLUTA (m)	Spostamenti differenziali locali (mm/m)					Spostamenti differenziali integrali (mm)				
	N. LETTURA					N. LETTURA				
	83	84	85	86	87	83	84	85	86	87
	4/11/15 12:00	17/11/15 12:30	30/11/15 11:45	17/12/15 12:00	11/1/16 12:15	4/11/15 12:00	17/11/15 12:30	30/11/15 11:45	17/12/15 12:00	11/1/16 12:15
10,9	0,411	0,420	0,432	0,441	0,438	8,227	8,277	8,848	8,847	8,794
9,9	0,354	0,347	0,369	0,359	0,348	7,816	7,857	8,416	8,406	8,356
8,9	0,300	0,308	0,331	0,334	0,342	7,462	7,510	8,047	8,047	8,008
7,9	0,219	0,225	0,233	0,238	0,241	7,162	7,202	7,716	7,713	7,666
6,9	0,388	0,384	0,408	0,404	0,407	6,943	6,977	7,483	7,475	7,425
5,9	0,350	0,359	0,384	0,393	0,383	6,555	6,593	7,075	7,071	7,018
4,9	0,248	0,241	0,264	0,268	0,273	6,205	6,234	6,691	6,678	6,635
3,9	0,160	0,168	0,183	0,176	0,180	5,957	5,993	6,427	6,410	6,362
2,9	0,327	0,330	0,358	0,361	0,370	5,797	5,825	6,244	6,234	6,182
1,9	0,256	0,252	0,275	0,272	0,265	5,470	5,495	5,886	5,873	5,812
0,9	0,196	0,205	0,230	0,219	0,223	5,214	5,243	5,611	5,601	5,547
-0,1	0,272	0,277	0,300	0,290	0,299	5,018	5,038	5,381	5,382	5,324
-1,1	0,224	0,213	0,237	0,243	0,247	4,746	4,761	5,081	5,092	5,025
-2,1	0,201	0,198	0,220	0,210	0,207	4,522	4,548	4,844	4,849	4,778
-3,1	0,085	0,094	0,103	0,111	0,100	4,321	4,350	4,624	4,639	4,571
-4,1	0,093	0,096	0,124	0,117	0,107	4,236	4,256	4,521	4,528	4,471
-5,1	0,116	0,113	0,135	0,132	0,140	4,143	4,160	4,397	4,411	4,364
-6,1	0,189	0,185	0,201	0,206	0,202	4,027	4,047	4,262	4,279	4,224
-7,1	0,242	0,248	0,260	0,266	0,256	3,838	3,862	4,061	4,073	4,022
-8,1	0,132	0,141	0,156	0,160	0,166	3,596	3,614	3,801	3,807	3,766
-9,1	0,112	0,101	0,109	0,105	0,095	3,464	3,473	3,645	3,647	3,600
-10,1	0,352	0,349	0,358	0,348	0,344	3,352	3,372	3,536	3,542	3,505
-11,1	0,233	0,226	0,251	0,254	0,243	3,000	3,023	3,178	3,194	3,161
-12,1	0,225	0,228	0,251	0,260	0,265	2,767	2,797	2,927	2,940	2,918
-13,1	0,209	0,213	0,237	0,245	0,235	2,542	2,569	2,676	2,680	2,653
-14,1	0,162	0,151	0,167	0,170	0,179	2,333	2,356	2,439	2,435	2,418
-15,1	0,362	0,367	0,375	0,365	0,354	2,171	2,205	2,272	2,265	2,239
-16,1	0,091	0,097	0,106	0,099	0,089	1,809	1,838	1,897	1,900	1,885
-17,1	0,079	0,083	0,111	0,108	0,104	1,718	1,741	1,791	1,801	1,796
-18,1	0,211	0,207	0,216	0,205	0,202	1,639	1,658	1,680	1,693	1,692
-19,1	0,204	0,213	0,216	0,221	0,214	1,428	1,451	1,464	1,488	1,490
-20,1	0,202	0,206	0,211	0,220	0,229	1,224	1,238	1,248	1,267	1,276
-21,1	0,365	0,371	0,367	0,371	0,375	1,022	1,032	1,037	1,047	1,047
-22,1	0,657	0,661	0,670	0,676	0,672	0,657	0,661	0,670	0,676	0,672



Ubicazione	STAZIONE MUNICIPIO
Opera	Tubo estensimetrico
Nome tubo	MU_ES1
Data posa in opera	24/03/2011
Data lettura di zero	07/04/2011

Ultima misura	In data
92	14/3/16 12:30

TABULATI (II)

QUOTA ASSOLUTA (m)	Spostamenti differenziali locali (mm/m)					Spostamenti differenziali integrali (mm)				
	N. LETTURA					N. LETTURA				
	88	89	90	91	92	88	89	90	91	92
	19/1/16 11:00	2/2/16 11:40	17/2/16 12:00	1/3/16 11:30	14/3/16 12:30	19/1/16 11:00	2/2/16 11:40	17/2/16 12:00	1/3/16 11:30	14/3/16 12:30
10,9	0,443	0,466	0,471	0,468	0,481	8,803	9,244	9,554	9,548	9,830
9,9	0,354	0,372	0,393	0,382	0,389	8,360	8,778	9,083	9,080	9,349
8,9	0,346	0,357	0,362	0,352	0,355	8,006	8,406	8,690	8,698	8,960
7,9	0,237	0,261	0,284	0,290	0,296	7,660	8,049	8,328	8,346	8,605
6,9	0,416	0,436	0,444	0,434	0,433	7,423	7,788	8,044	8,056	8,309
5,9	0,387	0,391	0,403	0,411	0,411	7,007	7,352	7,600	7,622	7,876
4,9	0,279	0,291	0,311	0,304	0,320	6,620	6,961	7,197	7,211	7,465
3,9	0,184	0,208	0,229	0,226	0,240	6,341	6,670	6,886	6,907	7,145
2,9	0,375	0,393	0,412	0,417	0,432	6,157	6,462	6,657	6,681	6,905
1,9	0,268	0,280	0,291	0,297	0,304	5,782	6,069	6,245	6,264	6,473
0,9	0,213	0,224	0,229	0,233	0,232	5,514	5,789	5,954	5,967	6,169
-0,1	0,308	0,329	0,347	0,343	0,343	5,301	5,565	5,725	5,734	5,937
-1,1	0,250	0,274	0,298	0,288	0,307	4,993	5,236	5,378	5,391	5,594
-2,1	0,204	0,208	0,231	0,234	0,234	4,743	4,962	5,080	5,103	5,287
-3,1	0,093	0,105	0,123	0,132	0,145	4,539	4,754	4,849	4,869	5,053
-4,1	0,103	0,111	0,116	0,124	0,139	4,446	4,649	4,726	4,737	4,908
-5,1	0,129	0,147	0,155	0,158	0,164	4,343	4,538	4,610	4,613	4,769
-6,1	0,192	0,211	0,223	0,213	0,232	4,214	4,391	4,455	4,455	4,605
-7,1	0,262	0,266	0,270	0,263	0,277	4,022	4,180	4,232	4,242	4,373
-8,1	0,170	0,190	0,210	0,207	0,210	3,760	3,914	3,962	3,979	4,096
-9,1	0,100	0,121	0,130	0,119	0,132	3,590	3,724	3,752	3,772	3,886
-10,1	0,341	0,360	0,364	0,369	0,376	3,490	3,603	3,622	3,653	3,754
-11,1	0,232	0,243	0,249	0,258	0,257	3,149	3,243	3,258	3,284	3,378
-12,1	0,255	0,279	0,287	0,291	0,291	2,917	3,000	3,009	3,026	3,121
-13,1	0,244	0,263	0,260	0,266	0,282	2,662	2,721	2,722	2,735	2,830
-14,1	0,169	0,190	0,179	0,187	0,187	2,418	2,458	2,462	2,469	2,548
-15,1	0,357	0,376	0,384	0,381	0,399	2,249	2,268	2,283	2,282	2,361
-16,1	0,094	0,099	0,102	0,091	0,094	1,892	1,892	1,899	1,901	1,962
-17,1	0,100	0,103	0,106	0,114	0,121	1,798	1,793	1,797	1,810	1,868
-18,1	0,211	0,201	0,191	0,194	0,209	1,698	1,690	1,691	1,696	1,747
-19,1	0,218	0,227	0,232	0,235	0,251	1,487	1,489	1,500	1,502	1,538
-20,1	0,222	0,225	0,229	0,219	0,233	1,269	1,262	1,268	1,267	1,287
-21,1	0,378	0,375	0,384	0,389	0,395	1,047	1,037	1,039	1,048	1,054
-22,1	0,669	0,662	0,655	0,659	0,659	0,669	0,662	0,655	0,659	0,659





Ubicazione	STAZIONE MUNICIPIO
Opera	Tubo estensimetrico
Nome tubo	MU_ES1
Data posa in opera	24/03/2011
Data lettura di zero	07/04/2011

Ultima misura	In data
92	14/3/16 12:30

GRAFICI


spostamenti differenziali locali

spostamenti differenziali integrali

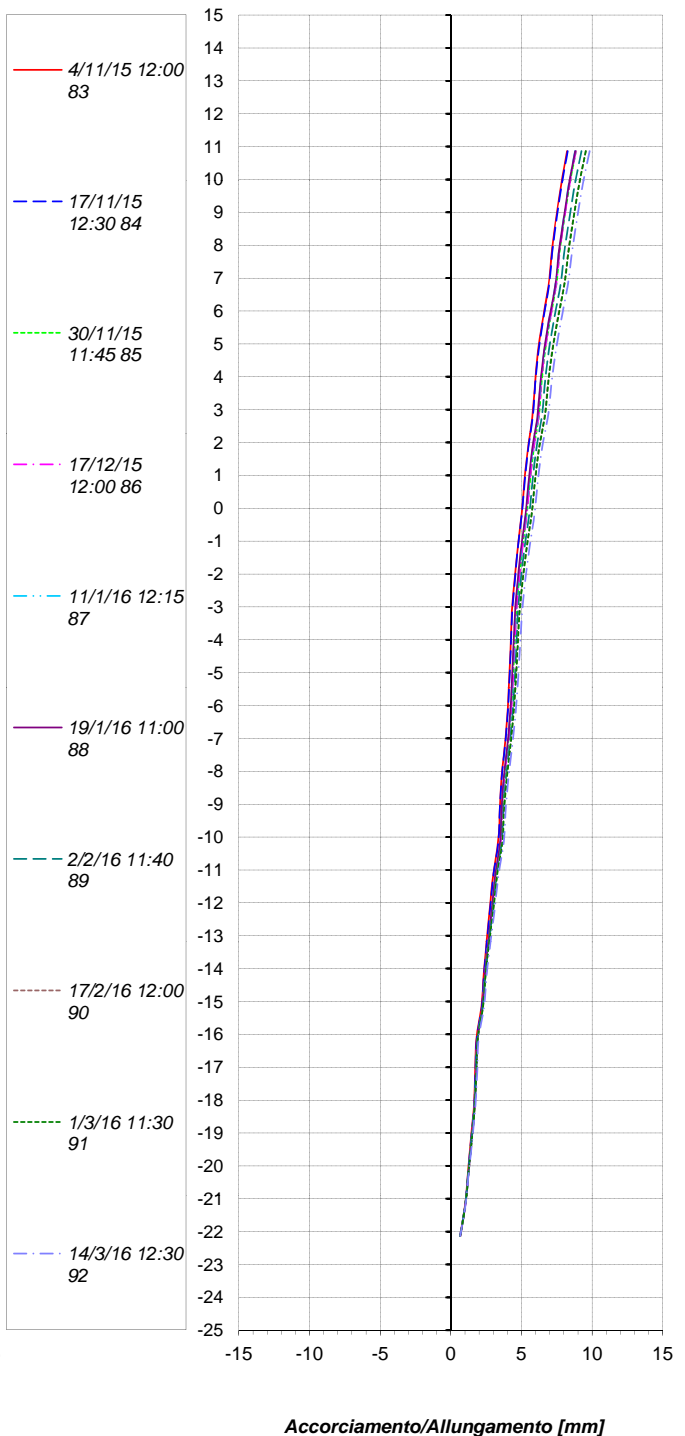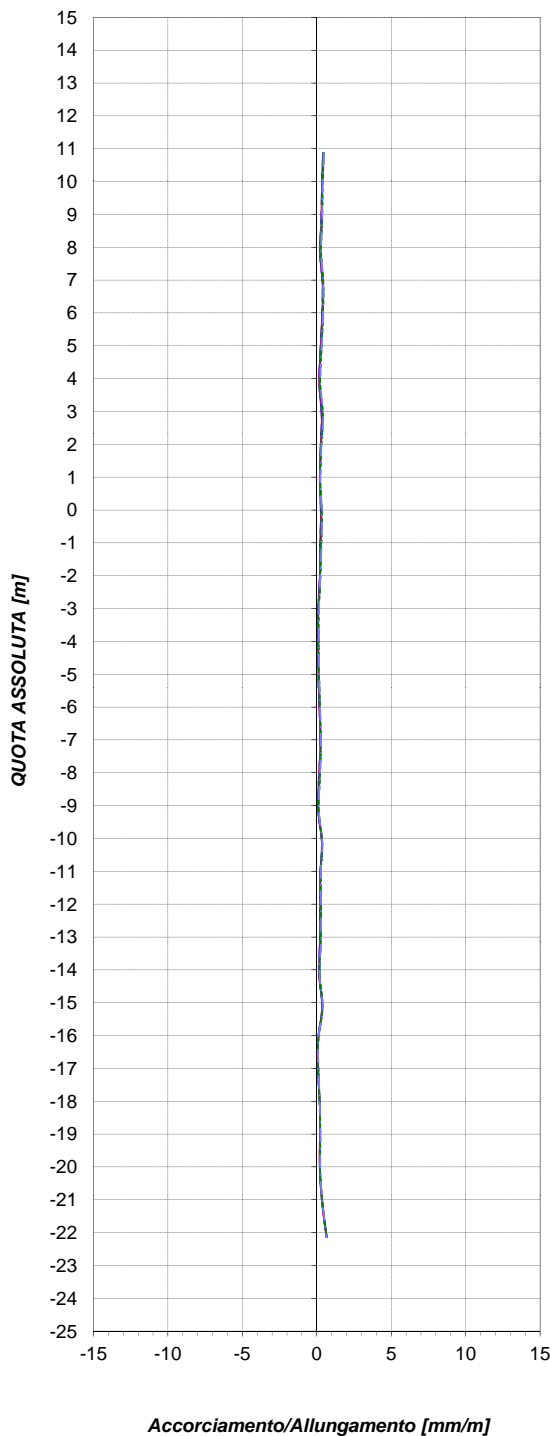

Estenso-inclinometro

MU_ES2

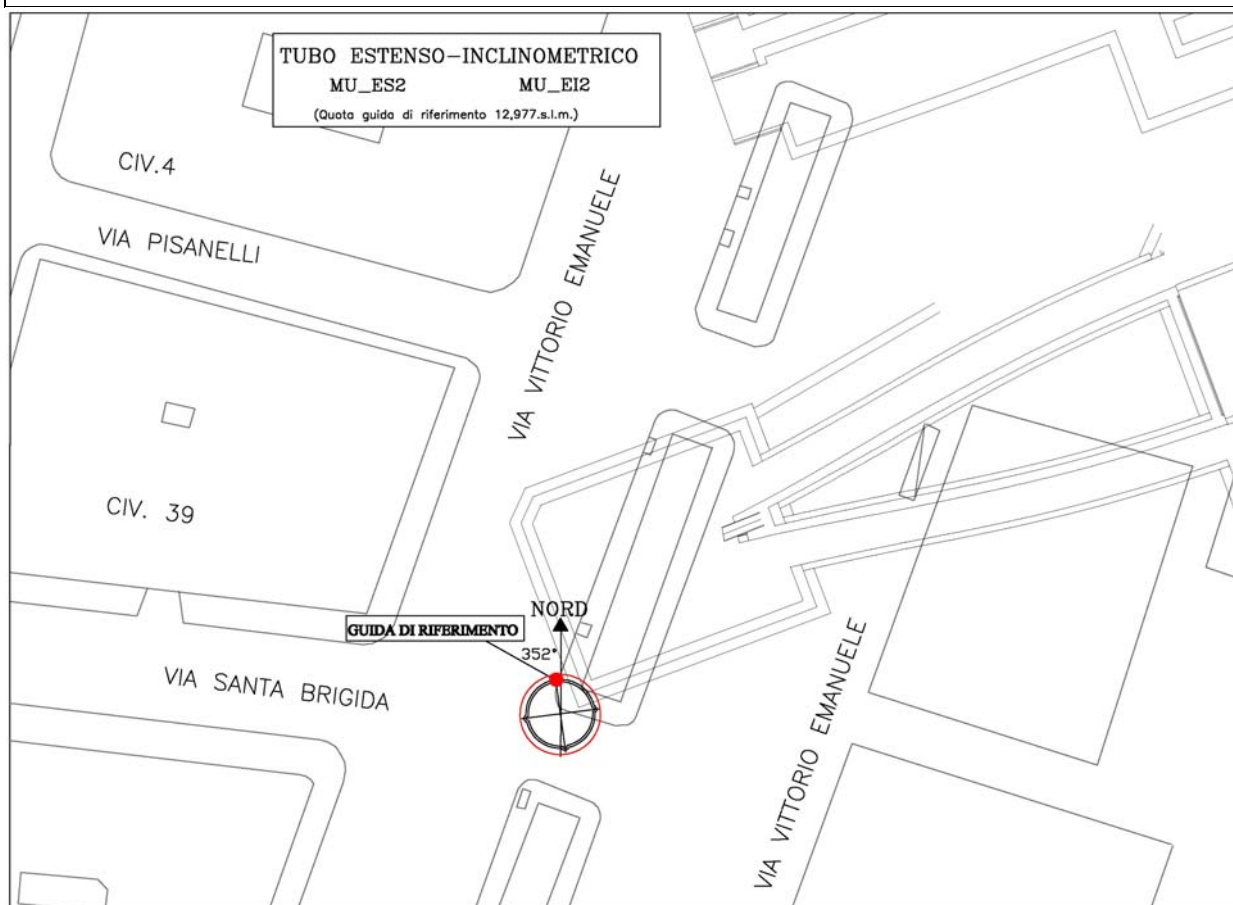

Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X

Congruenza progettuale

C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza


NOTE

Per lo strumento, nel periodo relativo al presente report, non ci sono misure disponibili da consegnare.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report MAG 2015 con codifica: LM6 7FX 2D E42

Estenso-inclinometro

MU_ES3

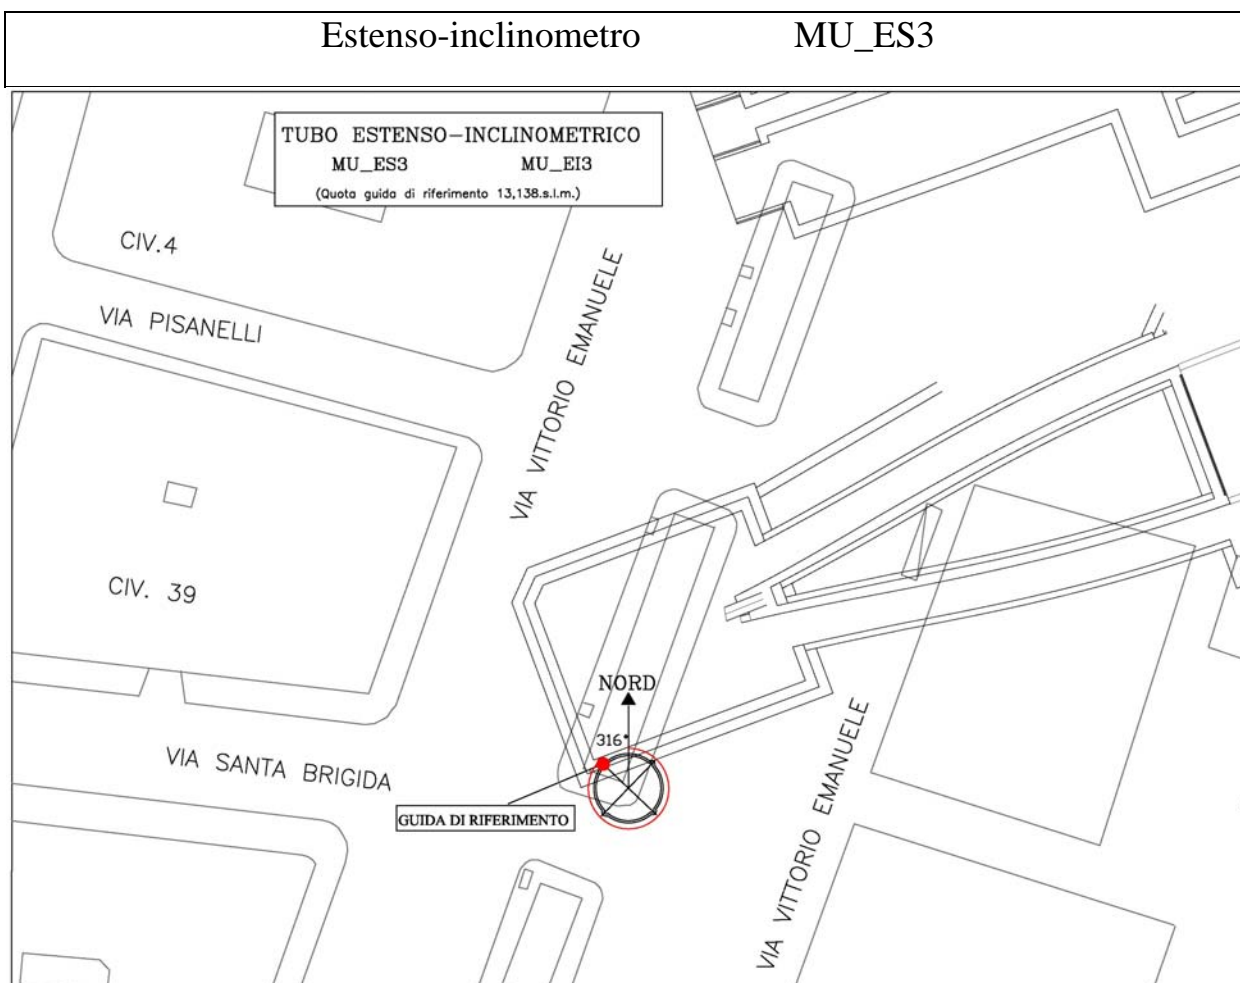

Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X

Congruenza progettuale
C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza


NOTE

Per lo strumento, nel periodo relativo al presente report, non ci sono misure disponibili da consegnare.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report MAG 2015 con codifica: LM6 7FX 2D E42

Estenso-inclinometro

MU_ES4

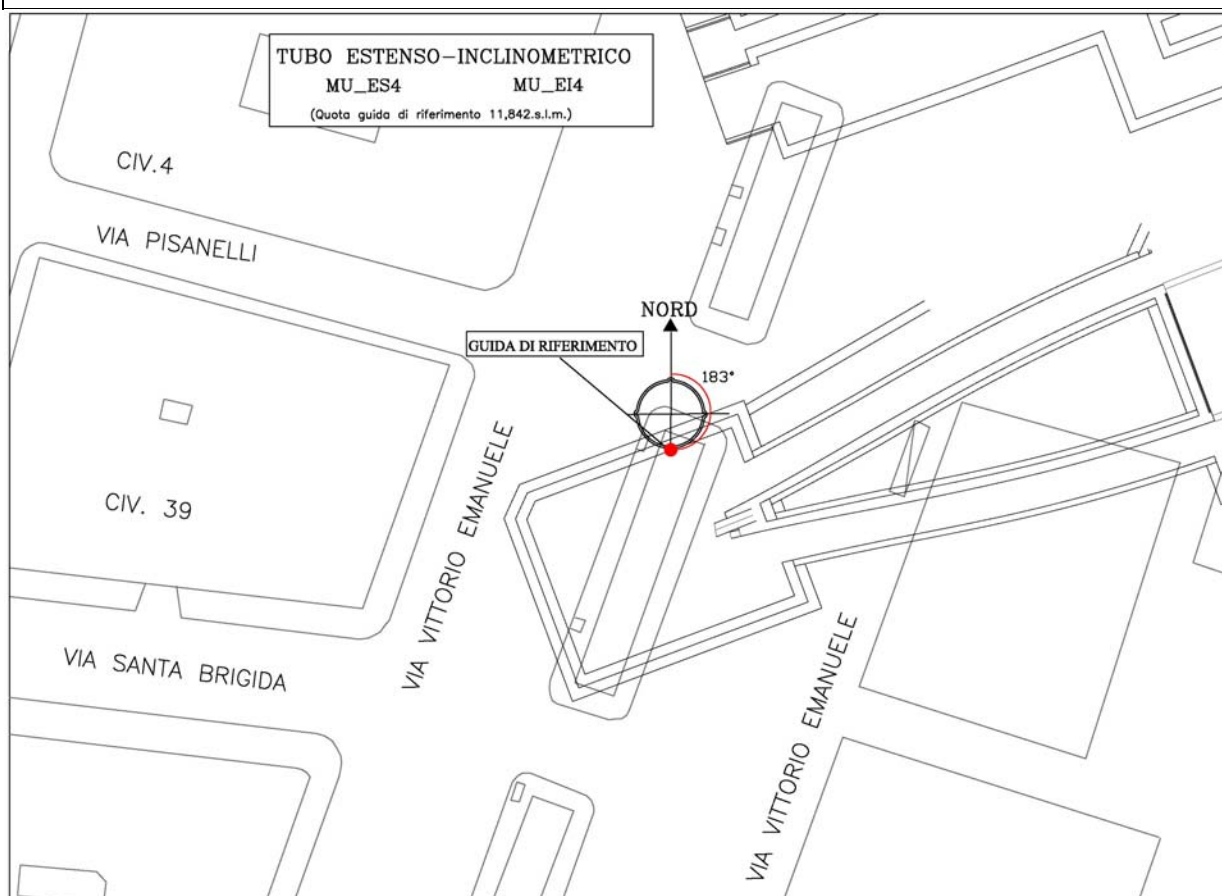

Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X

Congruenza progettuale
C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza

NOTE

Per lo strumento, nel periodo relativo al presente report, non ci sono misure disponibili da consegnare.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report MAG 2015 con codifica: LM6 7FX 2D E42

8.MISURE GEOTECNICHE – INCLINOMETRICHE

Gli inclinometri sono strumenti di controllo dei movimenti e delle deformazioni dei terreni nonché delle variazioni di assetto delle strutture. I rilievi consistono nella misura della variazione delle inclinazioni rispetto alla verticale di punti significativi, dall'inclinazione, mediante integrazione numerica si risale agli spostamenti sul piano x-y. La strumentazione di base è composta da tubo inclinometrico a sezione circolare provvisto di scanalature con funzione di guida per la sonda, sonda inclinometrica, cavo e centralina di misura.


Tabella riepilogativa per gli inclinometri installati in cantiere

NOME	TIPOLOGIA STRUMENTO	DATA INSTALLAZIONE	DISPONIBILITA' LETTURA			NOTE
			DATA LETTURA DI ZERO	PERIODO INTERRUZIONE	DATA FINE ATTIVITA'	
MU_E11	INCLINOMETRO	24/03/11	06/04/11			
MU_E12	INCLINOMETRO	15/03/11	06/04/11		21/05/15	(*)
MU_E13	INCLINOMETRO	17/03/11	06/04/11		21/05/15	(*)
MU_E14	INCLINOMETRO	12/03/11	06/04/11		21/05/15	(*)

(*) Per lo strumento, nel periodo relativo al presente report, non ci sono misure disponibili da consegnare.

Inclinometro

MU_EI1

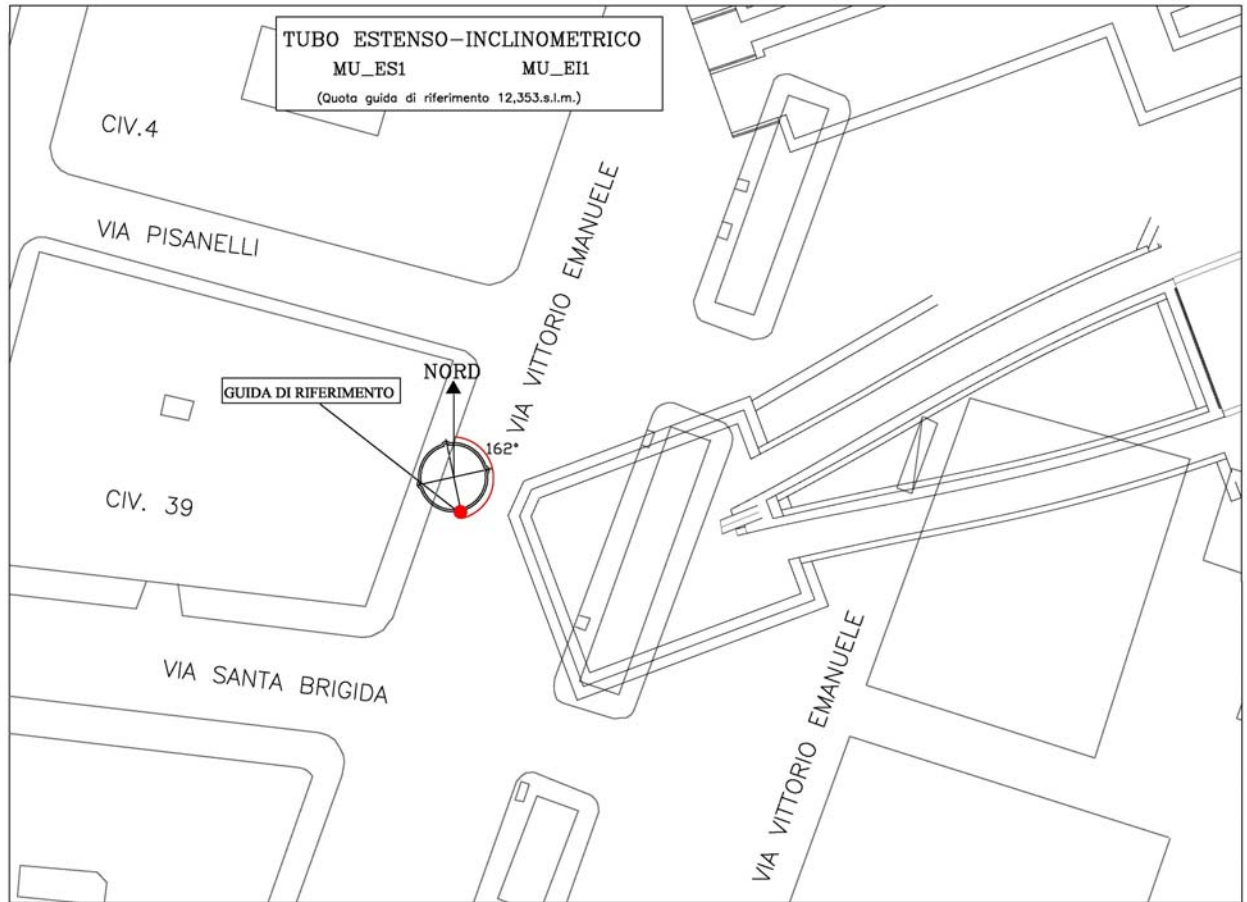

Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X

Congruenza progettuale

C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza

NOTE



MISURE INCLINOMETRICHE
ELABORAZIONE DA FONDO FORO
-TABULATI-

Ubicazione **STAZIONE MUNICIPIO**
 Tipo Strumento **Tubo inclinometrico**
 Nome tubo **MU_EI1**
 Azimut di riferimento **162**
 Quota guida rif. (m.s.l.m.) **12,353**
 Data lettura di zero **06/04/2011**
 Data posa in opera **24/03/2011**

Misura **100** in data **15/03/2016 13:00**

SPOSTAMENTI LOCALI (mm)				
PROFONDITA (m.s.l.m.)	EST	NORD	RISULTANTE	AZIMUT
11,9	0,217	0,018	0,218	85,266
10,9	-0,530	-0,301	0,609	240,351
9,9	0,274	0,764	0,812	19,745
8,9	0,466	0,296	0,552	57,547
7,9	0,293	0,099	0,309	71,385
6,9	0,113	0,041	0,120	69,960
5,9	-0,142	0,237	0,276	329,059
4,9	0,304	-0,053	0,308	99,950
3,9	-0,119	0,240	0,268	333,732
2,9	0,090	0,243	0,259	20,221
1,9	-0,236	-0,008	0,236	268,126
0,9	0,063	0,283	0,290	12,535
-0,1	-0,397	0,116	0,414	286,272
-1,1	-0,096	0,031	0,101	287,980
-2,1	-0,548	0,296	0,623	298,382
-3,1	-0,313	0,216	0,380	304,527
-4,1	-0,150	0,172	0,228	318,819
-5,1	-0,550	0,066	0,554	276,800
-6,1	-0,536	-0,174	0,564	251,982
-7,1	-0,241	0,388	0,457	328,198
-8,1	0,010	0,227	0,227	2,475
-9,1	-0,210	0,126	0,245	300,907
-10,1	-0,143	-0,337	0,366	202,908
-11,1	0,105	0,837	0,844	7,151
-12,1	0,096	-0,570	0,578	170,398
-13,1	-0,704	0,834	1,091	319,836
-14,1	0,610	1,396	1,524	23,610
-15,1	0,382	-0,970	1,042	158,484
-16,1	-1,310	-2,654	2,960	206,280
-17,1	0,043	0,464	0,466	5,238
-18,1	0,082	0,513	0,520	9,030
-19,1	0,111	0,019	0,112	80,347
-20,1	0,202	0,458	0,501	23,827
-21,1	0,216	0,131	0,253	58,777
-22,1	0,019	0,445	0,445	2,405

SPOSTAMENTI INTEGRALI (mm)				
PROFONDITA (m.s.l.m.)	EST	NORD	RISULTANTE	AZIMUT
11,9	-2,531	3,889	4,640	326,940
10,9	-2,748	3,871	4,747	324,627
9,9	-2,219	4,173	4,726	331,999
8,9	-2,493	3,409	4,223	323,821
7,9	-2,958	3,113	4,294	316,454
6,9	-3,252	3,014	4,434	312,827
5,9	-3,364	2,973	4,489	311,465
4,9	-3,222	2,736	4,227	310,333
3,9	-3,526	2,789	4,496	308,344
2,9	-3,407	2,549	4,255	306,796
1,9	-3,497	2,305	4,188	303,396
0,9	-3,261	2,313	3,998	305,353
-0,1	-3,324	2,030	3,894	301,416
-1,1	-2,926	1,914	3,497	303,188
-2,1	-2,830	1,883	3,399	303,636
-3,1	-2,282	1,586	2,779	304,813
-4,1	-1,968	1,371	2,399	304,858
-5,1	-1,818	1,199	2,178	303,408
-6,1	-1,268	1,133	1,701	311,792
-7,1	-0,732	1,308	1,499	330,758
-8,1	-0,491	0,920	1,043	331,879
-9,1	-0,501	0,693	0,855	324,109
-10,1	-0,291	0,567	0,637	332,827
-11,1	-0,148	0,904	0,916	350,685
-12,1	-0,253	0,067	0,262	284,811
-13,1	-0,350	0,637	0,726	331,217
-14,1	0,354	-0,197	0,406	119,140
-15,1	-0,256	-1,594	1,614	189,130
-16,1	-0,638	-0,624	0,893	225,637
-17,1	0,672	2,030	2,138	18,323
-18,1	0,630	1,566	1,688	21,904
-19,1	0,548	1,053	1,187	27,503
-20,1	0,437	1,034	1,123	22,933
-21,1	0,235	0,576	0,622	22,213
-22,1	0,019	0,445	0,445	2,405




MISURE INCLINOMETRICHE
ELABORAZIONE DA FONDO FORO
-GRAFICI-1/5


Ubicazione **STAZIONE MUNICIPIO**
 Tipo Strumento **Tubo inclinometrico**
 Nome tubo **MU_EI1**
 Azimut di riferimento **162**
 Quota guida rif. (m.s.l.m.) **12,353**
 Data lettura di zero **06/04/2011**
 Data posa in opera **24/03/2011**

Ultima Misura **100** in data **15/03/2016 13:00**

Spostamenti Differenziali Locali
OVEST- (valori negativi) / EST + (valori positivi)

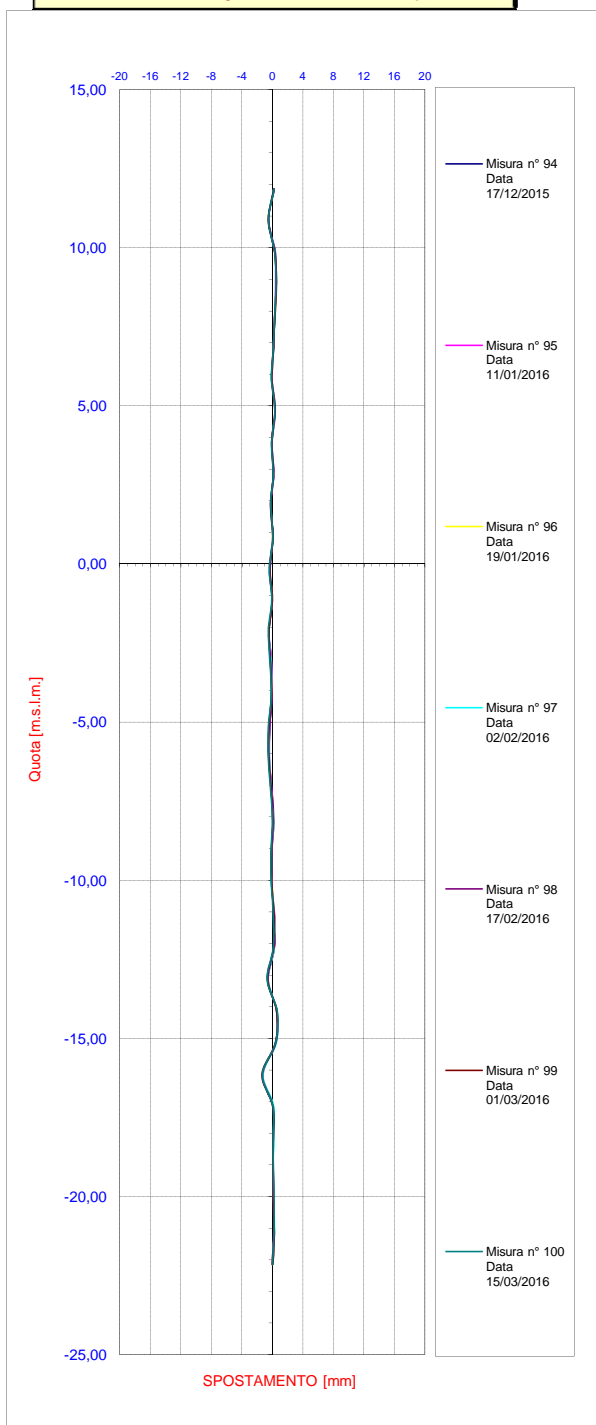

Spostamenti Differenziali Locali
SUD - (valori negativi) / NORD + (valori positivi)


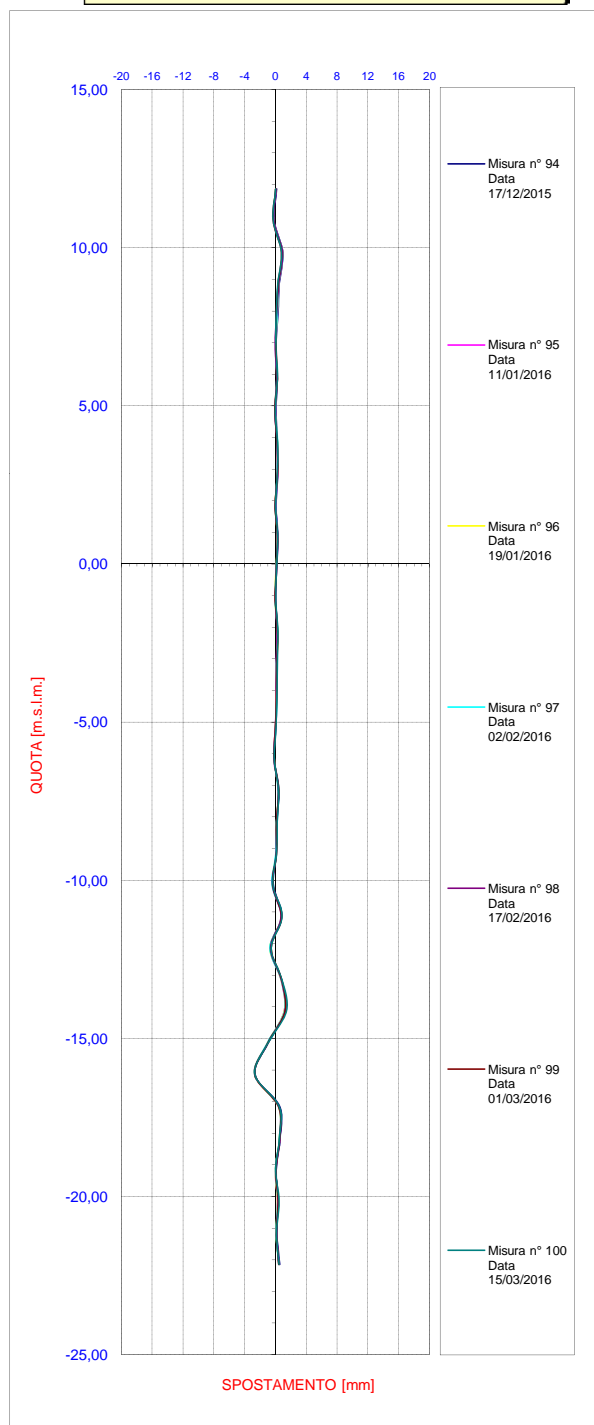




MISURE INCLINOMETRICHE
ELABORAZIONE DA FONDO FORO
-GRAFICI-2/5

Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO
Tipo Strumento Tubo inclinometrico
Nome tubo MU_EI1
Azimut di riferimento 162
Quota guida rif. (m.s.l.m.) 12,353
Data lettura di zero 06/04/2011
Data posa in opera 24/03/2011

Ultima Misura 100 in data 15/03/2016 13:00

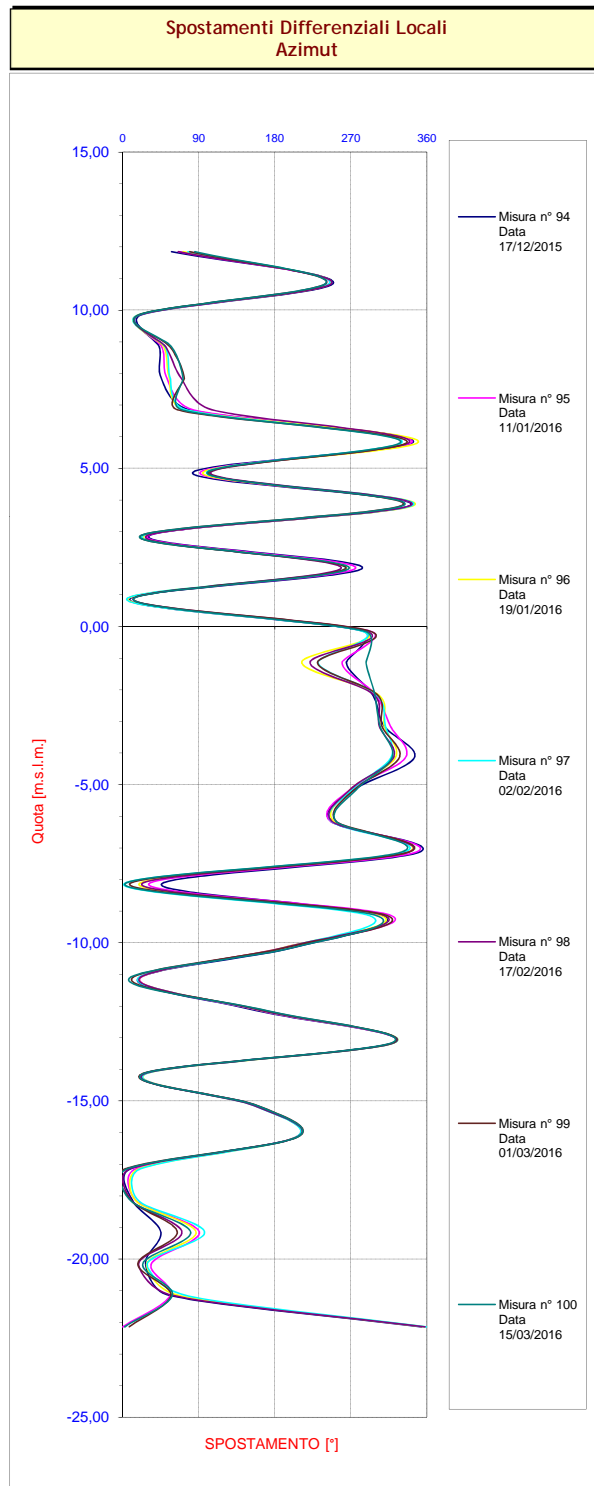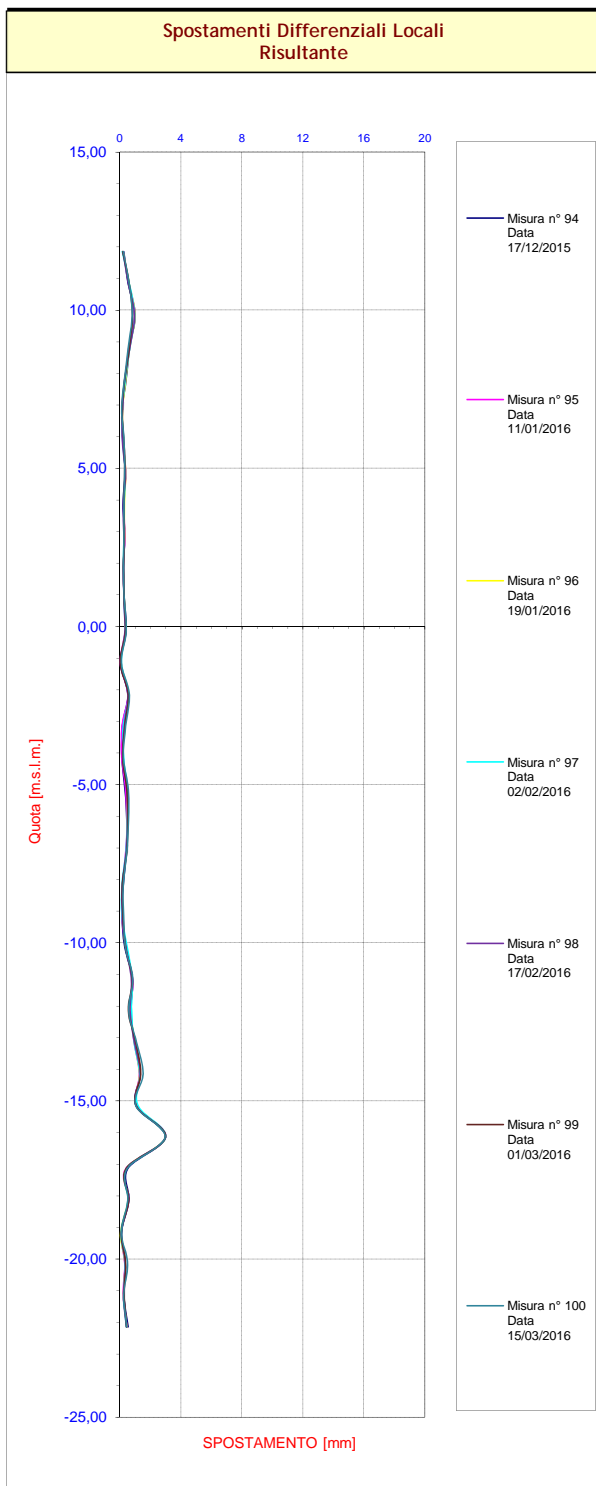




MISURE INCLINOMETRICHE
ELABORAZIONE DA FONDO FORO
-GRAFICI-3/5


Ubicazione **STAZIONE MUNICIPIO**
 Tipo Strumento **Tubo inclinometrico**
 Nome tubo **MU_EI1**
 Azimut di riferimento **162**
 Quota guida rif. (m.s.l.m.) **12,353**
 Data lettura di zero **06/04/2011**
 Data posa in opera **24/03/2011**

Ultima Misura **100** in data **15/03/2016 13:00**

Spostamenti Differenziali Integrali
OVEST- (valori negativi) / EST + (valori positivi)

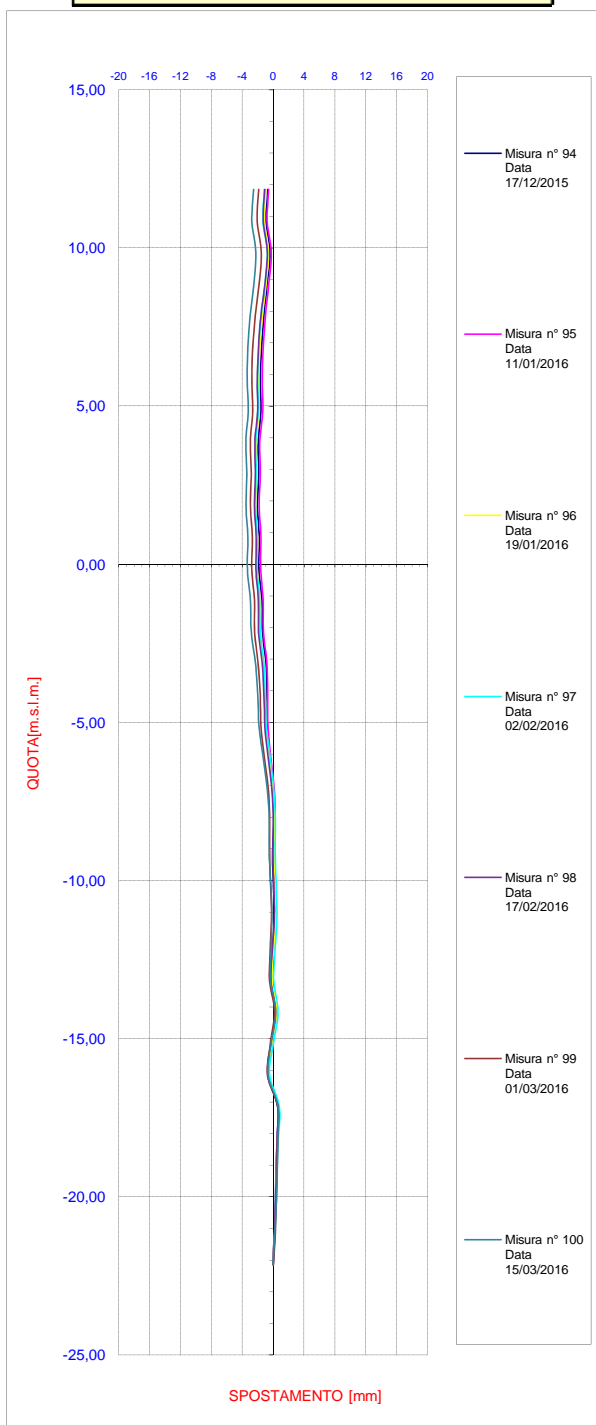

Spostamenti Differenziali Integrali
SUD - (valori negativi) / NORD + (valori positivi)

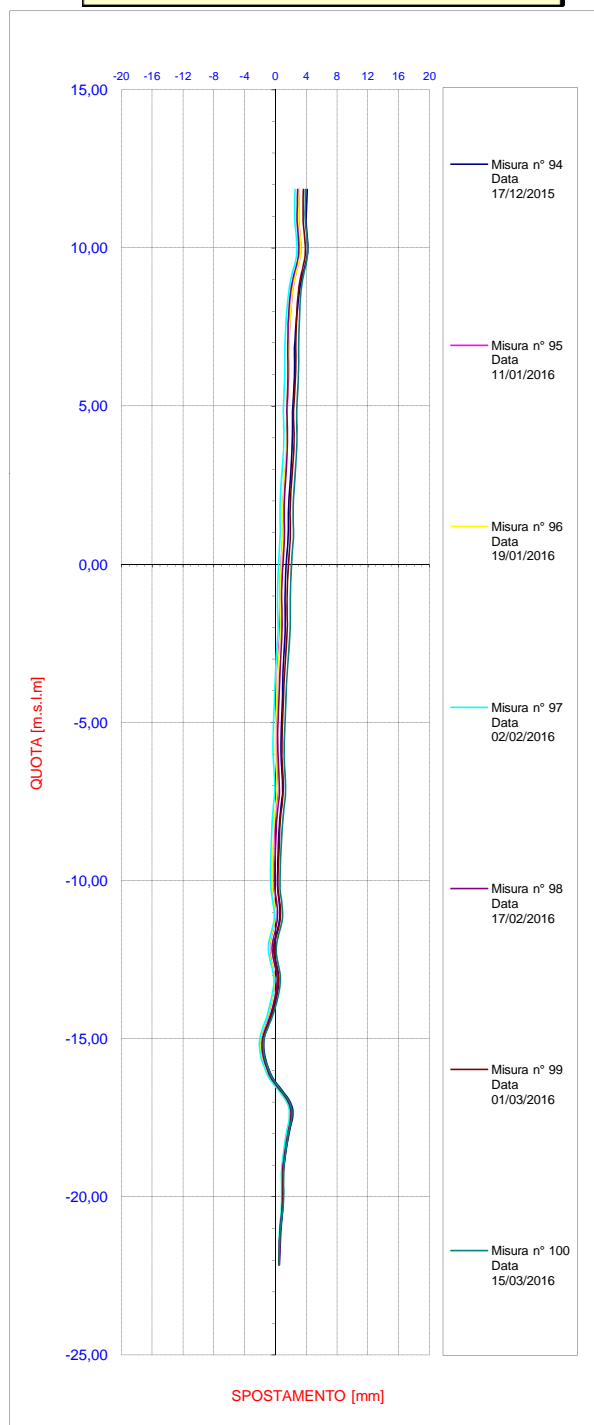




MISURE INCLINOMETRICHE
ELABORAZIONE DA FONDO FORO
-GRAFICI-4/5


Ubicazione **STAZIONE MUNICIPIO**
 Tipo Strumento **Tubo inclinometrico**
 Nome tubo **MU_EI1**
 Azimut di riferimento **162**
 Quota guida rif. (m.s.l.m.) **12,353**
 Data lettura di zero **06/04/2011**
 Data posa in opera **24/03/2011**

Ultima Misura **100** in data **15/03/2016 13:00**

Spostamenti Differenziali Integrali Risultante

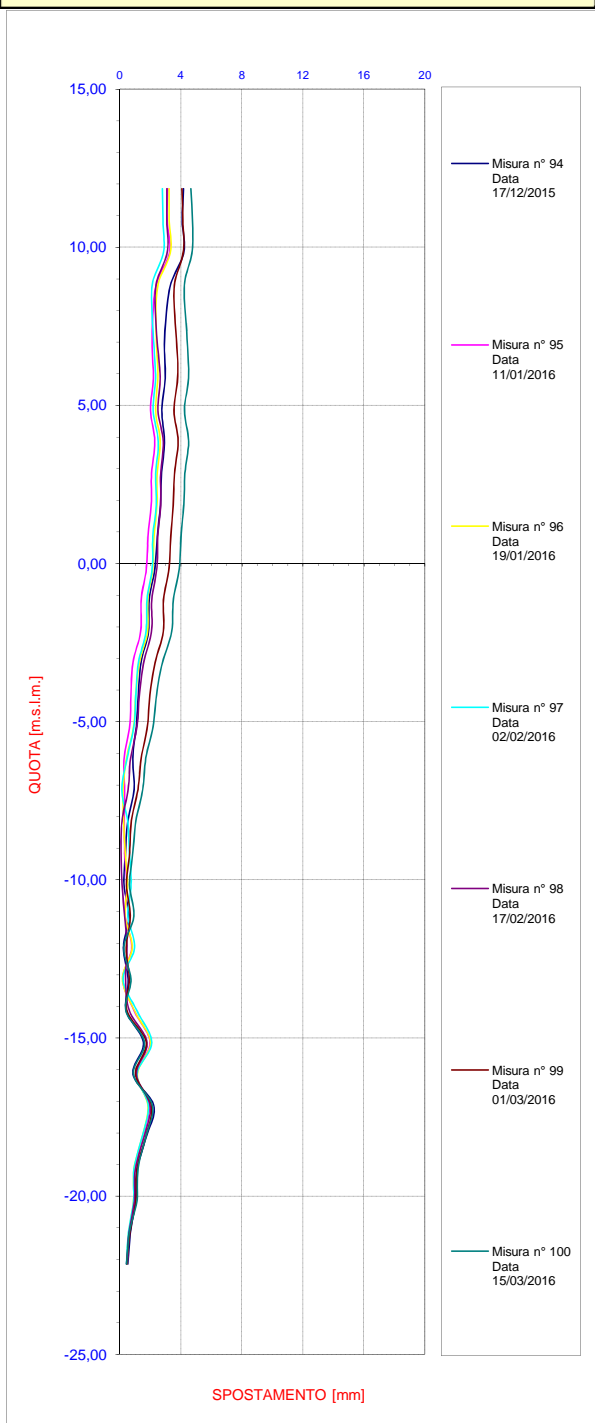

Spostamenti Differenziali Integrali Azimut

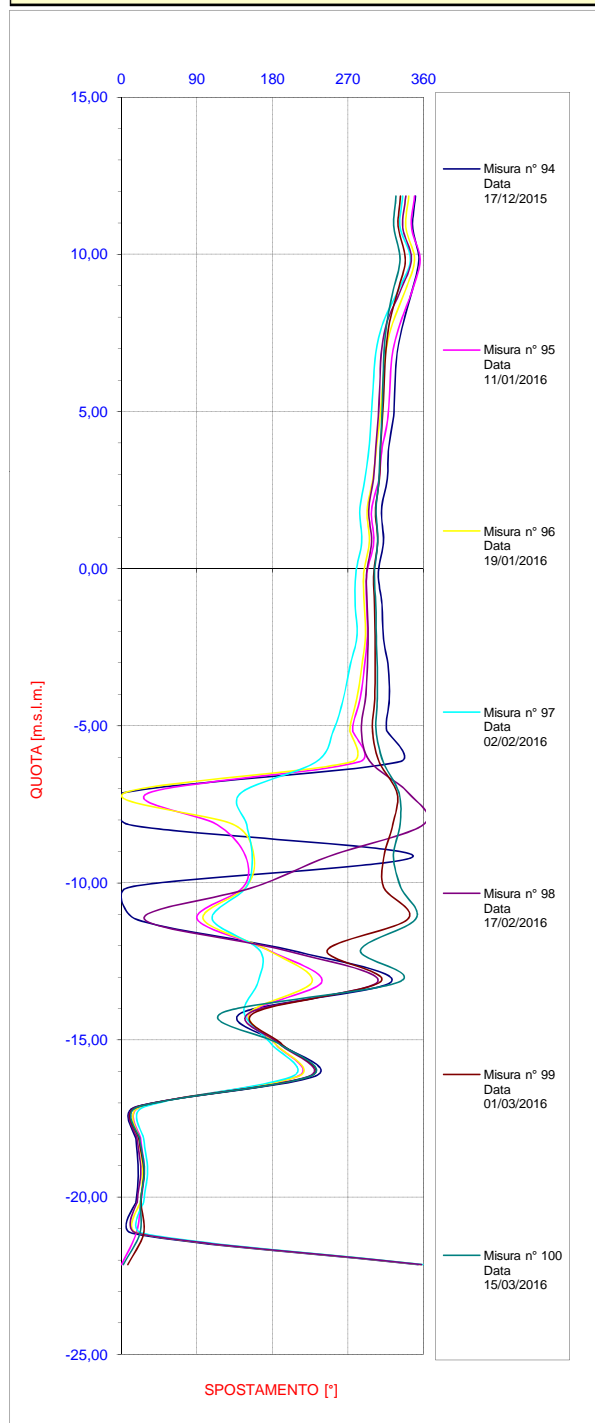




MISURE INCLINOMETRICHE
ELABORAZIONE DA FONDO FORO
-GRAFICI-5/5

Ubicazione	STAZIONE MUNICIPIO
Tipo Strumento	Tubo inclinometrico
Nome tubo	MU_EI1
Azimut di riferimento	162
Quota guida rif. (m.s.l.m.)	12,353
Data lettura di zero	06/04/2011
Data posa in opera	24/03/2011


Ultima Misura 100 in data 15/03/2016 13:00

Spostamenti Differenziali Integrali
Diagramma polare

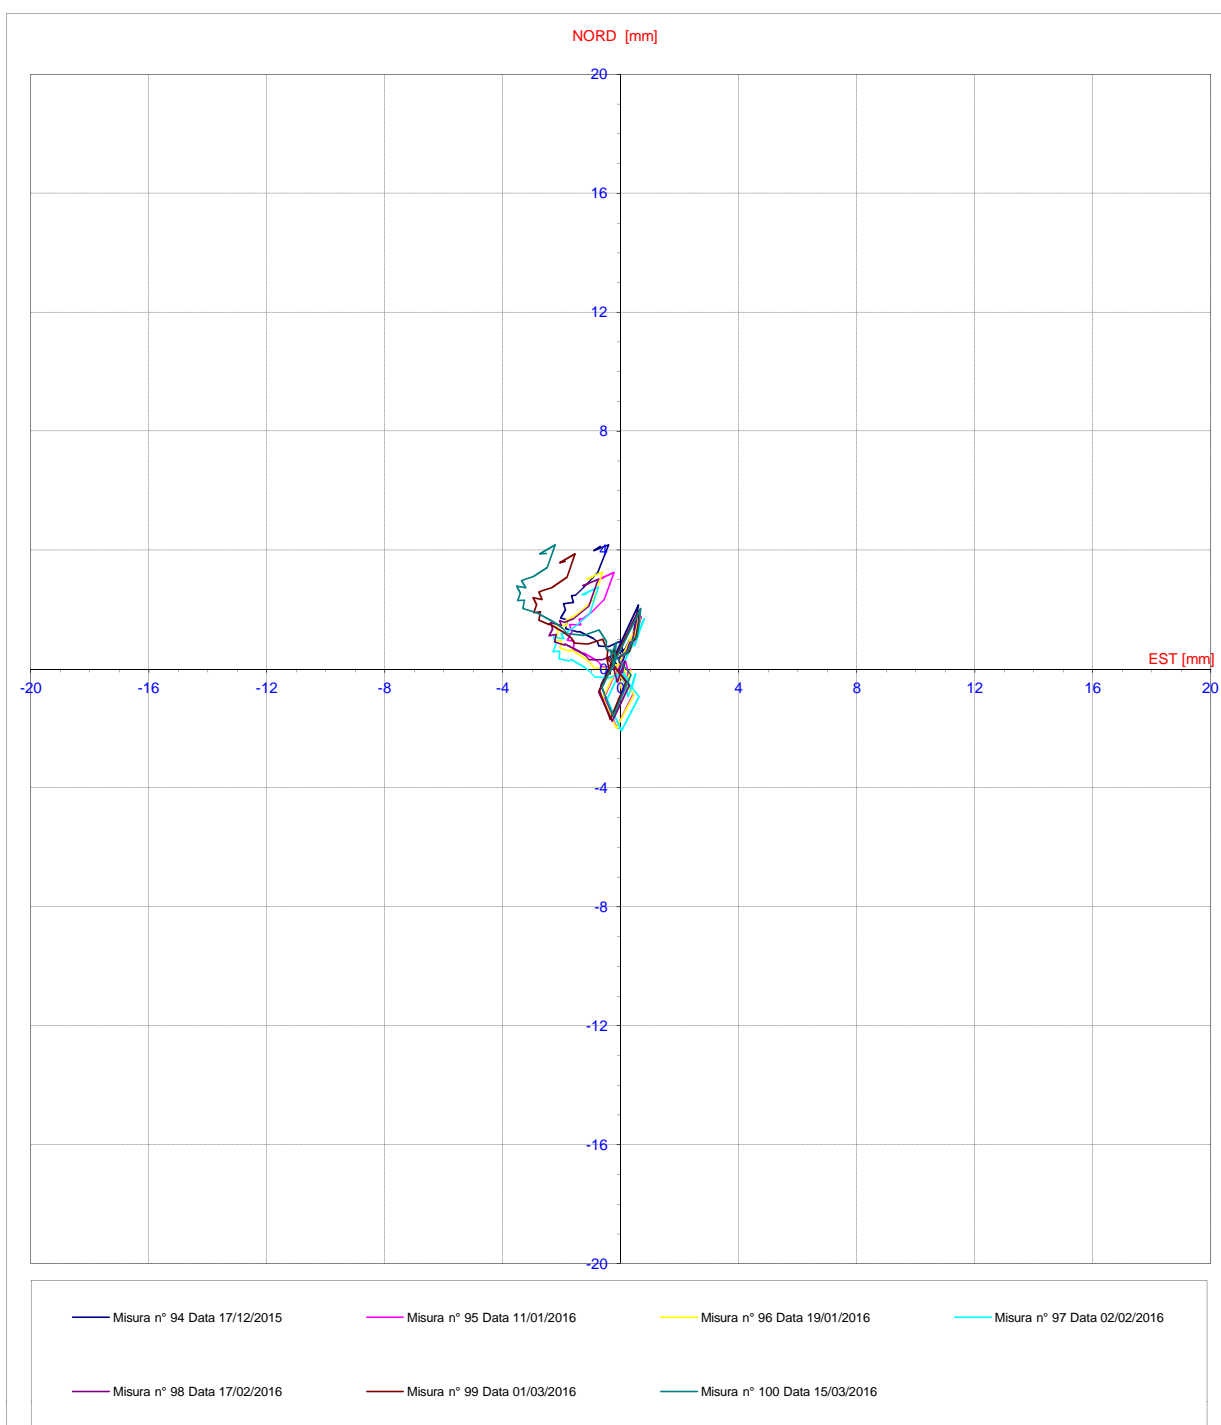

Inclinometro

MU_EI2

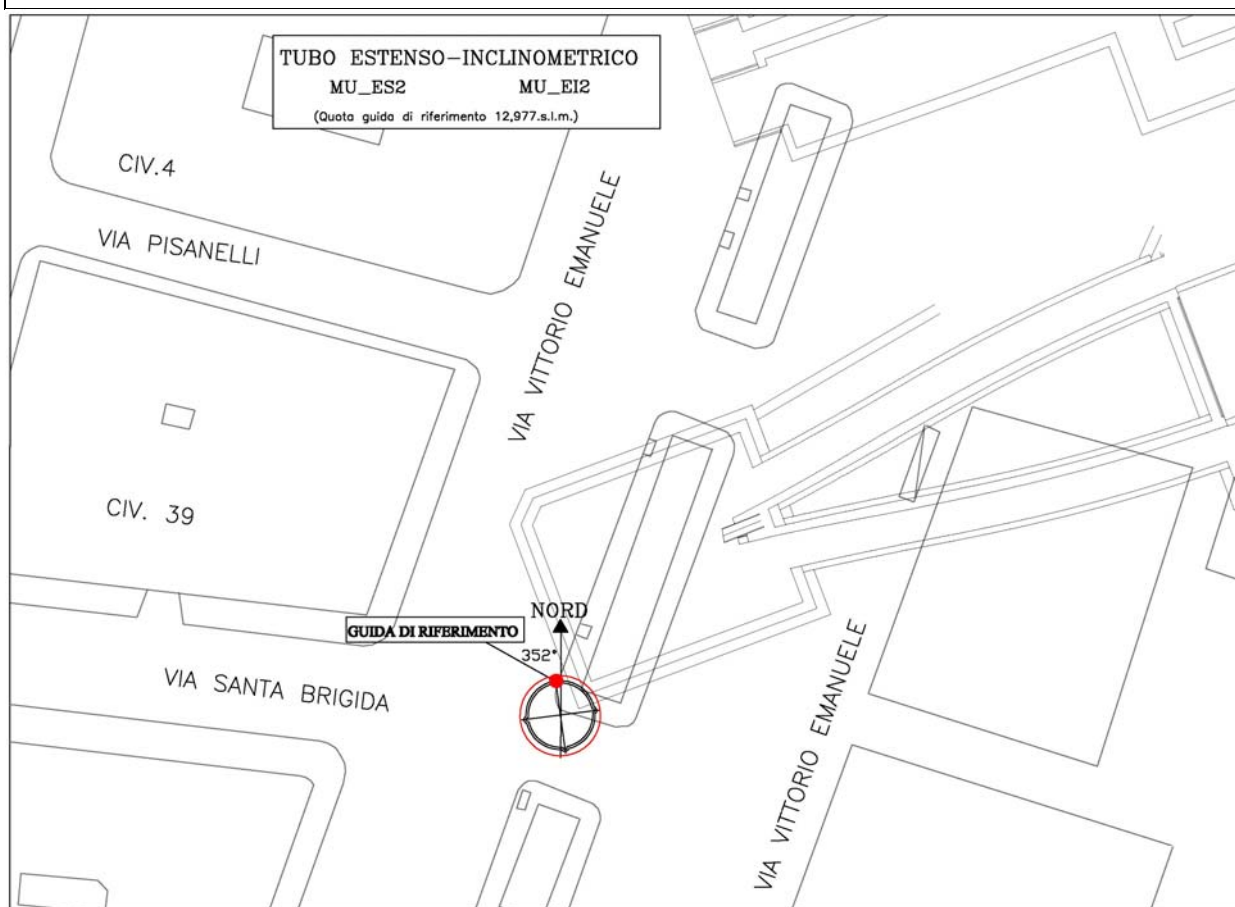

Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X

Congruenza progettuale
C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio


congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza

NOTE

Per lo strumento, nel periodo relativo al presente report, non ci sono misure disponibili da consegnare.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report MAG 2015 con codifica: LM6 7FX 2D E42

Inclinometro MU_EI3

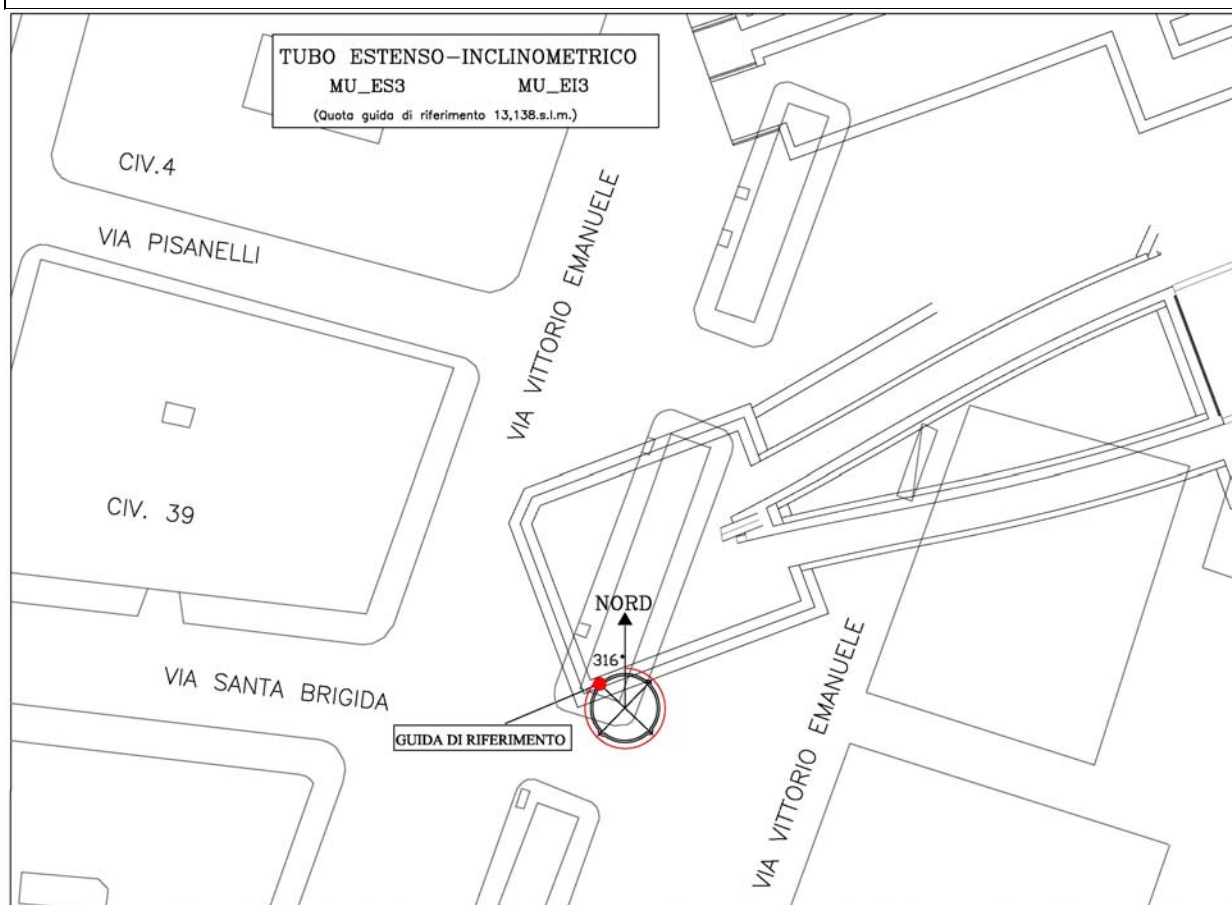

Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X

Congruenza progettuale

C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza


NOTE

Per lo strumento, nel periodo relativo al presente report, non ci sono misure disponibili da consegnare.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report MAG 2015 con codifica: LM6 7FX 2D E42

Inclinometro

MU_EI4

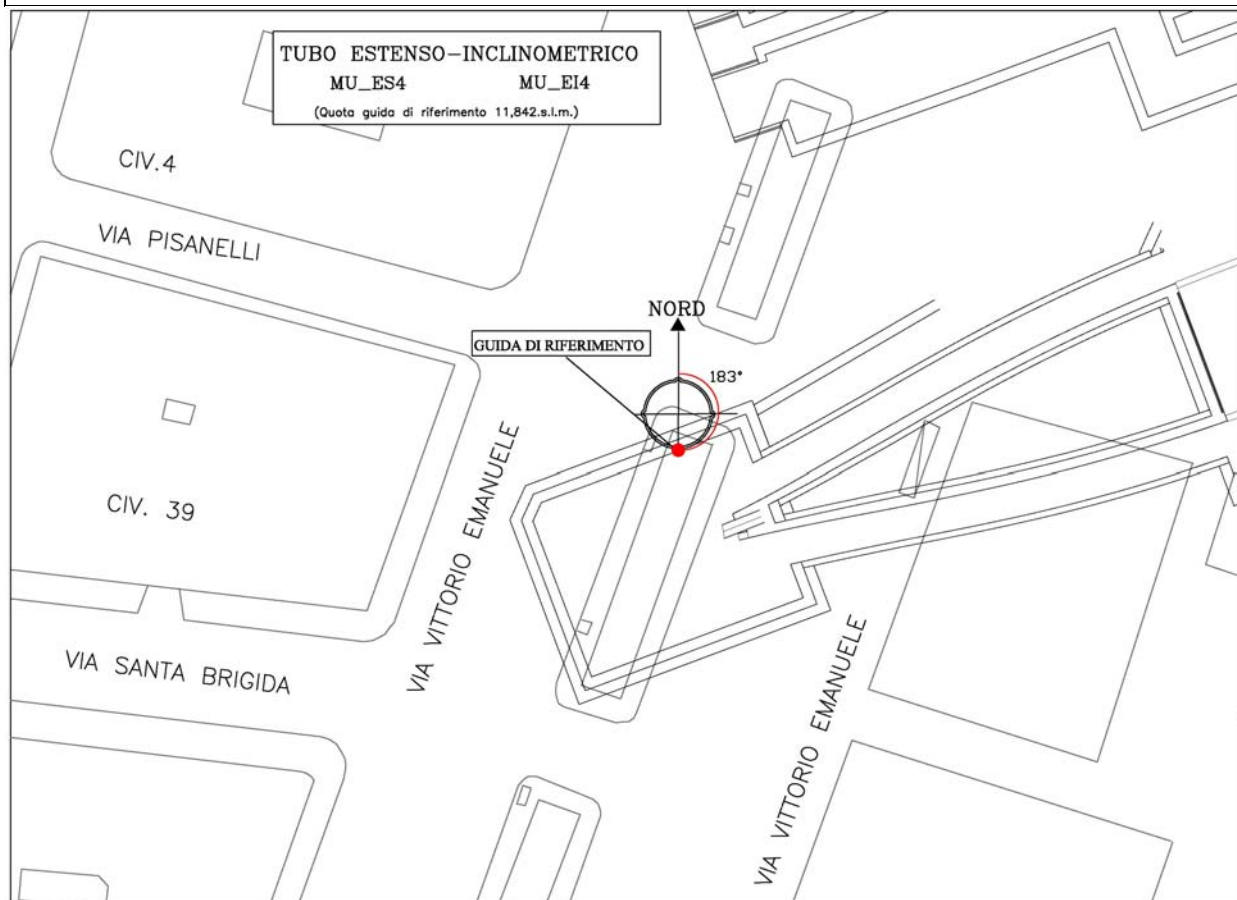

Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X

Congruenza progettuale
C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza

NOTE

Per lo strumento, nel periodo relativo al presente report, non ci sono misure disponibili da consegnare.

L'ultima misura disponibile è riportata nel report MAG 2015 con codifica: LM6 7FX 2D E42

9. MISURE GEOTECNICHE – PIEZOMETRICHE


I piezometri sono strumenti per il controllo delle variazioni di quota della falda. Ciò è reso possibile tramite l'utilizzo di tubi che raggiungono l'acquifero, possono essere di tipo aperto o fornite di cella di Casagrande. I primi terminano in fondo con un tratto fenestrato, gli altri con una cella porosa, entrambe permettono l'ingresso al loro interno dell'acqua di falda. La misura si effettua mediante freatometro elettrico, che restituisce la profondità del livello di falda in metri da boccaforo, successivamente trasformata in quota assoluta.

Tabella riepilogativa per i piezometri installati in cantiere

NOME	TIPO STRUM.	DATA INSTALLAZIONE	DISPONIBILITA' LETTURA			NOTE
			DATA LETTURA DI ZERO	PERIODO INTERRUZIONE	DATA FINE ATTIVITA'	
MU_PZ1	PIEZ TA	02/03/11	21/03/11	21/07/15		(*)
MU_PZ2	PIEZ TA	07/03/11	21/03/11			
MU_PZ3	PIEZ TA	08/03/11	21/03/11			
MU_PZ4	PIEZ TA	09/03/11	21/03/11			
MU_PZ5	PIEZ TA	10/03/11	21/03/11			
MU_PZ6	PIEZ TA	11/03/11	24/03/11			

(*) Per lo strumento, nel periodo relativo al presente report, non ci sono misure disponibili da consegnare.

Piezometro MU_PZ1

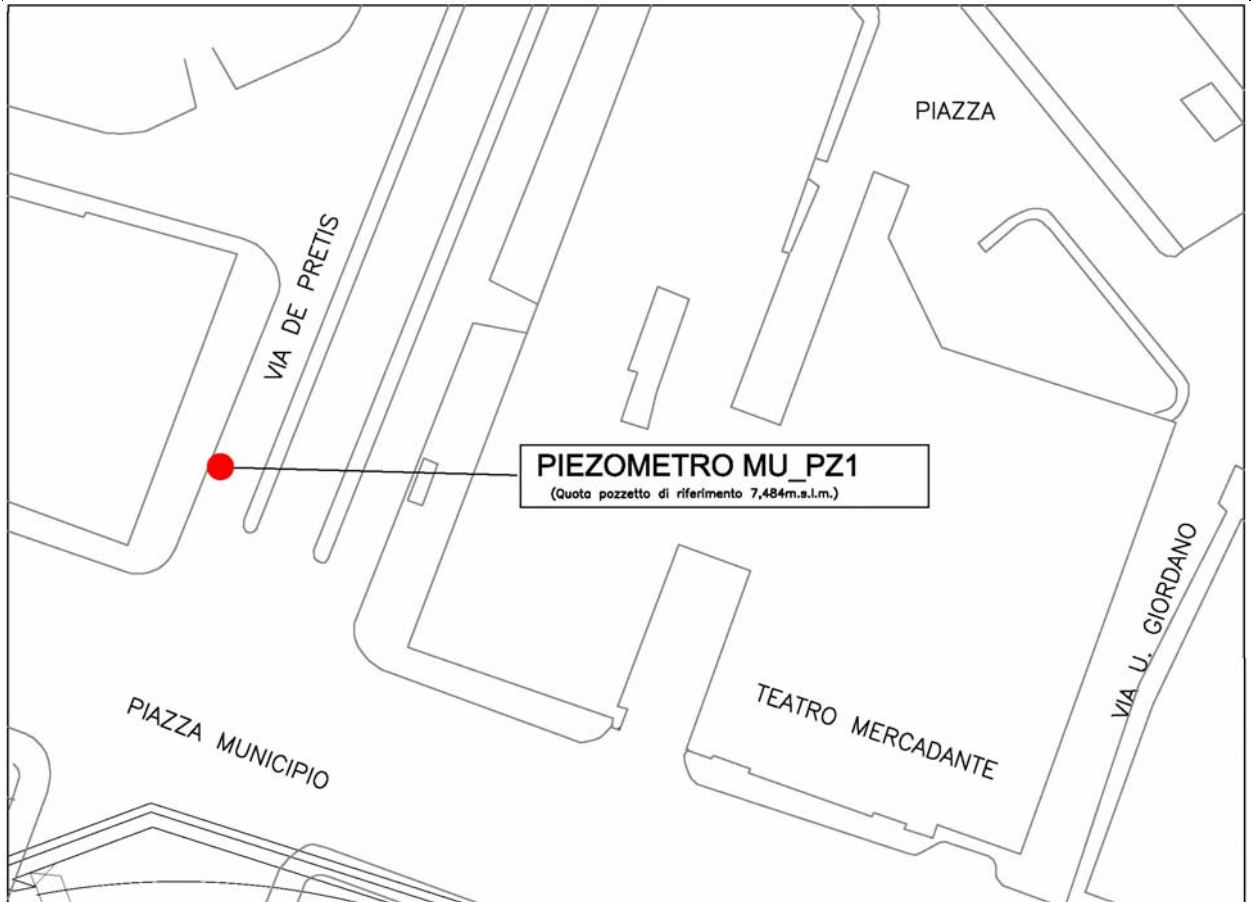

Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere

da scartare

X

Congruenza progettuale

C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza

NOTE

Per lo strumento, nel periodo relativo al presente report, non ci sono misure disponibili da consegnare

Piezometro MU_PZ2



Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X

Congruenza progettuale
C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza

NOTE

Le elaborazioni di seguito riportate includono lo storico delle misure.



TABULATI

Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO
Tipo Strumento Piezometro a Tubo Aperto
Nome Tubo Piezometrico \ \ MU_PZ2
Data posa in opera 07/03/2011
Data lettura di zero 21/03/2011



Ultima misura 225 **in data** 14/03/2016

Letture n°	DATA	MU_PZ2	
		Boccaf. [m s.l.m.]	Cella [m s.l.m.]
		Quota [m.s.l.m.]	Spostam. [mm]
		5,946	-19,554
174	03/09/2014 12:00	1,28	-120,00
175	05/09/2014 11:00	1,27	-130,00
176	10/09/2014 11:00	1,28	-120,00
177	17/09/2014 10:00	1,31	-90,00
178	02/10/2014 10:00	1,27	-130,00
179	15/10/2014 10:30	1,17	-230,00
180	28/10/2014 11:00	1,11	-290,00
181	05/11/2014 10:00	1,05	-350,00
182	11/11/2014 10:00	0,99	-410,00
183	20/11/2014 10:30	1,01	-390,00
184	26/11/2014 10:30	1,00	-400,00
185	03/12/2014 10:30	1,03	-370,00
186	10/12/2014 12:30	1,05	-350,00
187	19/12/2014 11:00	1,04	-360,00
188	30/12/2014 11:30	1,02	-380,00
189	13/01/2015 10:30	1,01	-390,00
190	16/01/2015 10:30	1,00	-400,00
191	30/01/2015 10:00	1,04	-360,00
192	03/02/2015 10:00	1,05	-350,00
193	11/02/2015 11:00	1,03	-370,00
194	18/02/2015 11:00	1,04	-360,00
195	27/02/2015 12:00	1,07	-330,00
196	06/03/2015 10:00	1,08	-320,00
197	25/03/2015 12:00	1,05	-350,00
198	03/04/2015 10:00	1,04	-360,00
199	17/04/2015 11:00	0,97	-430,00
200	28/04/2015 11:00	0,94	-460,00
201	05/05/2015 11:00	0,96	-440,00
202	14/05/2015 11:00	0,99	-410,00
203	21/05/2015 11:00	0,97	-430,00
204	28/05/2015 11:00	1,00	-400,00
205	11/06/2015 11:00	1,01	-390,00
206	22/06/2015 11:00	0,99	-410,00
207	09/07/2015 10:30	0,95	-450,00
208	21/07/2015 11:30	0,92	-480,00
209	04/08/2015 11:00	0,89	-510,00
210	25/08/2015 11:30	0,87	-530,00
211	10/09/2015 11:00	0,91	-490,00
212	24/09/2015 11:00	0,93	-470,00
213	08/10/2015 11:00	0,92	-480,00
214	22/10/2015 11:00	0,97	-430,00
215	04/11/2015 11:30	0,96	-440,00
216	17/11/2015 10:30	0,99	-410,00
217	30/11/2015 10:30	0,98	-420,00
218	17/12/2015 11:00	1,00	-400,00
219	23/12/2015 11:00	1,01	-390,00
220	11/01/2016 11:00	1,03	-370,00
221	19/01/2016 11:00	1,05	-350,00
222	02/02/2016 11:00	1,07	-330,00
223	17/02/2016 11:00	1,04	-360,00
224	01/03/2016 11:00	1,05	-350,00
225	14/03/2016 11:00	1,08	-320,00



SCHEMA UBICAZIONE

Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO
Tipo Strumento Piezometro a Tubo Aperto
Nome Tubo Piezometrico \ \ MU_PZ2
Data posa in opera 07/03/2011
Data lettura di zero 21/03/2011

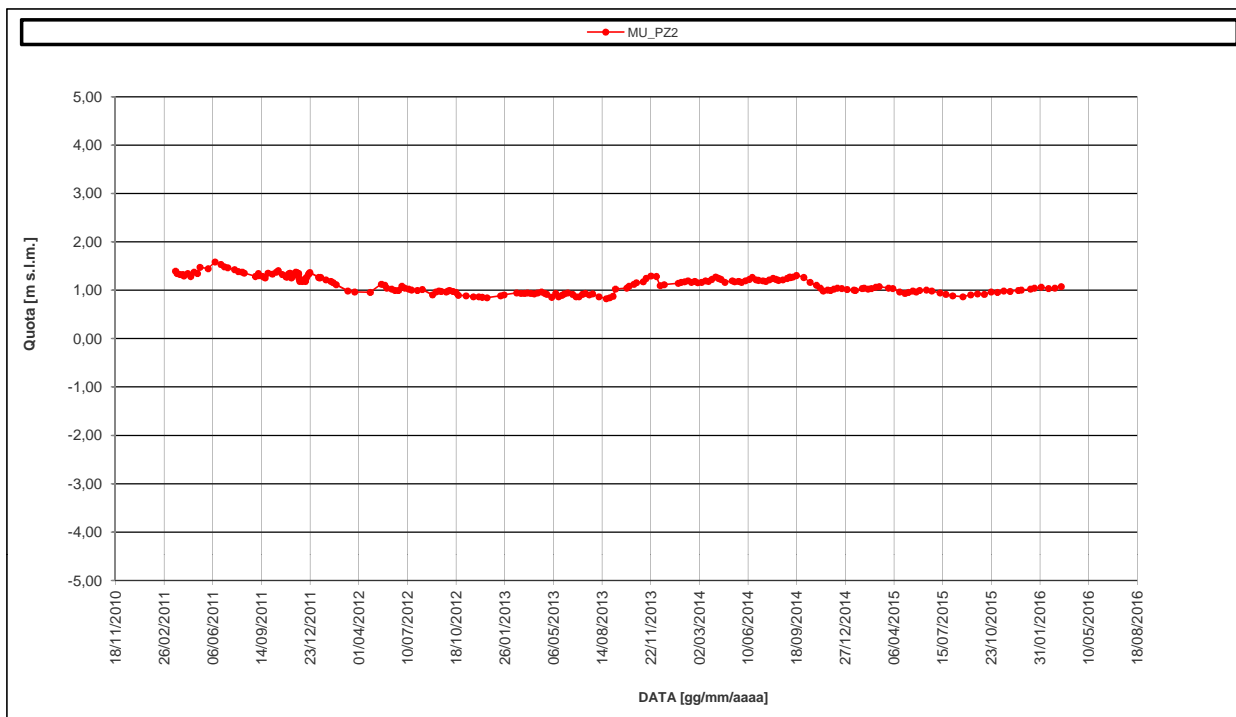

Piezometro MU_PZ3



Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X

Congruenza progettuale

C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza

NOTE

Le elaborazioni di seguito riportate includono lo storico delle misure.



TABULATI

Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO
Tipo Strumento Piezometro a Tubo Aperto
Nome Tubo Piezometrico \ \ MU_PZ3
Data posa in opera 08/03/2011
Data lettura di zero 21/03/2011



Ultima misura 225 **in data** 14/03/2016

Letture n°	DATA	MU_PZ3	
		Boccaf. [m s.l.m.]	Cella [m s.l.m.]
		4,595	-20,605
		Quota [m.s.l.m.]	Spostam. [mm]
174	03/09/2014 12:00	1,14	290,00
175	05/09/2014 11:00	1,12	270,00
176	10/09/2014 11:00	1,13	280,00
177	17/09/2014 10:00	1,15	300,00
178	02/10/2014 10:00	1,12	270,00
179	15/10/2014 10:30	1,04	190,00
180	28/10/2014 11:00	0,96	110,00
181	05/11/2014 10:00	0,91	60,00
182	11/11/2014 10:00	0,98	130,00
183	20/11/2014 10:30	1,00	150,00
184	26/11/2014 10:30	0,99	140,00
185	03/12/2014 10:30	1,02	170,00
186	10/12/2014 12:30	1,04	190,00
187	19/12/2014 11:00	1,03	180,00
188	30/12/2014 11:30	1,01	160,00
189	13/01/2015 10:30	0,91	60,00
190	16/01/2015 10:30	0,88	30,00
191	30/01/2015 10:00	0,92	70,00
192	03/02/2015 10:00	0,91	60,00
193	11/02/2015 11:00	0,89	40,00
194	18/02/2015 11:00	0,90	50,00
195	27/02/2015 12:00	0,92	70,00
196	06/03/2015 10:00	0,91	60,00
197	25/03/2015 12:00	0,88	30,00
198	03/04/2015 10:00	0,90	50,00
199	17/04/2015 11:00	0,81	-40,00
200	28/04/2015 11:00	0,79	-60,00
201	05/05/2015 11:00	0,80	-50,00
202	14/05/2015 11:00	0,82	-30,00
203	21/05/2015 11:00	0,84	-10,00
204	28/05/2015 11:00	0,85	0,00
205	11/06/2015 11:00	0,87	20,00
206	22/06/2015 11:00	0,86	10,00
207	09/07/2015 10:30	0,73	-120,00
208	21/07/2015 11:30	0,71	-140,00
209	04/08/2015 11:00	0,68	-170,00
210	25/08/2015 11:30	0,67	-180,00
211	10/09/2015 11:00	0,72	-130,00
212	24/09/2015 11:00	0,71	-140,00
213	08/10/2015 11:00	0,72	-130,00
214	22/10/2015 11:00	0,78	-70,00
215	04/11/2015 11:30	0,77	-80,00
216	17/11/2015 10:30	0,81	-40,00
217	30/11/2015 10:30	0,80	-50,00
218	17/12/2015 11:00	0,82	-30,00
219	23/12/2015 11:00	0,83	-20,00
220	11/01/2016 11:00	0,87	20,00
221	19/01/2016 11:00	0,90	50,00
222	02/02/2016 11:00	0,92	70,00
223	17/02/2016 11:00	0,89	40,00
224	01/03/2016 11:00	0,90	50,00
225	14/03/2016 11:00	0,94	90,00



SCHEMA UBICAZIONE

Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO
Tipo Strumento Piezometro a Tubo Aperto
Nome Tubo Piezometrico \ \ MU_PZ3
Data posa in opera 08/03/2011
Data lettura di zero 21/03/2011

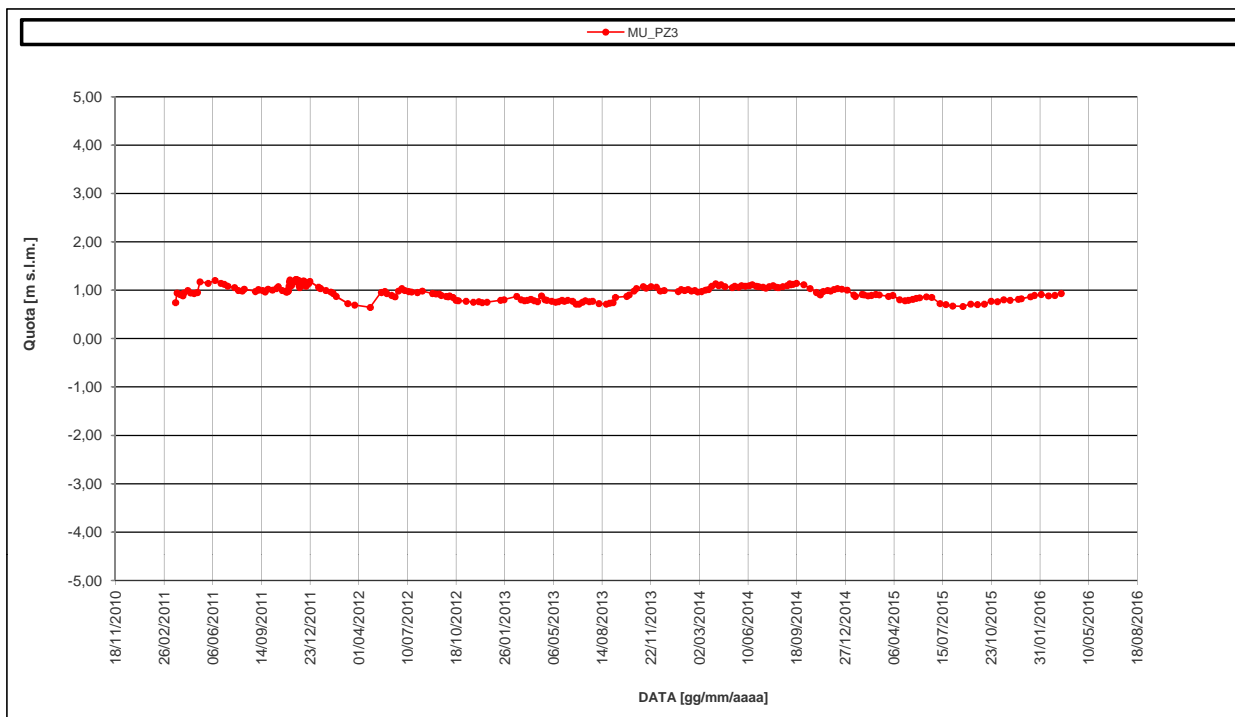

Piezometro

MU_PZ4



Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 - Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X

Congruenza progettuale

C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza

NOTE

Le elaborazioni di seguito riportate includono lo storico delle misure.



TABULATI

Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO
Tipo Strumento Piezometro a Tubo Aperto
Nome Tubo Piezometrico \ \ MU_PZ4
Data posa in opera 09/03/2011
Data lettura di zero 21/03/2011



Ultima misura 254 **in data** 14/03/2016

Letture n°	DATA	MU_PZ4	
		Boccaf. [m s.l.m.]	Cella [m s.l.m.]
		Quota [m.s.l.m.]	Spostam. [mm]
		11,913	-11,887
203	03/09/2014 12:00	0,84	-1370,00
204	05/09/2014 11:00	0,83	-1380,00
205	10/09/2014 11:00	0,85	-1360,00
206	17/09/2014 10:00	0,84	-1370,00
207	02/10/2014 10:00	0,87	-1340,00
208	15/10/2014 10:30	0,74	-1470,00
209	28/10/2014 11:00	0,70	-1510,00
210	05/11/2014 10:00	0,69	-1520,00
211	11/11/2014 10:00	0,71	-1500,00
212	20/11/2014 10:30	0,74	-1470,00
213	26/11/2014 10:30	0,75	-1460,00
214	03/12/2014 10:30	0,77	-1440,00
215	10/12/2014 12:30	0,78	-1430,00
216	19/12/2014 11:00	0,75	-1460,00
217	30/12/2014 11:30	0,73	-1480,00
218	13/01/2015 10:30	0,70	-1510,00
219	16/01/2015 10:30	0,69	-1520,00
220	30/01/2015 10:00	0,71	-1500,00
221	03/02/2015 10:00	0,73	-1480,00
222	11/02/2015 11:00	0,66	-1550,00
223	18/02/2015 11:00	0,65	-1560,00
224	27/02/2015 12:00	0,67	-1540,00
225	06/03/2015 10:00	0,66	-1550,00
226	25/03/2015 12:00	0,77	-1440,00
227	03/04/2015 10:00	0,78	-1430,00
228	17/04/2015 11:00	0,75	-1460,00
229	28/04/2015 11:00	0,73	-1480,00
230	05/05/2015 11:00	0,75	-1460,00
231	14/05/2015 11:00	0,76	-1450,00
232	21/05/2015 11:00	0,79	-1420,00
233	28/05/2015 11:00	0,81	-1400,00
234	11/06/2015 11:00	0,80	-1410,00
235	22/06/2015 11:00	0,79	-1420,00
236	09/07/2015 10:30	0,72	-1490,00
237	21/07/2015 11:30	0,70	-1510,00
238	04/08/2015 11:00	0,71	-1500,00
239	25/08/2015 11:30	0,70	-1510,00
240	10/09/2015 11:00	0,72	-1490,00
241	24/09/2015 11:00	0,71	-1500,00
242	08/10/2015 11:00	0,69	-1520,00
243	22/10/2015 11:00	0,72	-1490,00
244	04/11/2015 11:30	0,74	-1470,00
245	17/11/2015 10:30	0,77	-1440,00
246	30/11/2015 10:30	0,76	-1450,00
247	17/12/2015 11:00	0,78	-1430,00
248	23/12/2015 11:00	0,80	-1410,00
249	11/01/2016 11:00	0,82	-1390,00
250	19/01/2016 11:00	0,84	-1370,00
251	02/02/2016 11:00	0,86	-1350,00
252	17/02/2016 11:00	0,82	-1390,00
253	01/03/2016 11:00	0,83	-1380,00
254	14/03/2016 11:00	0,86	-1350,00




SCHEMA UBICAZIONE

Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO
Tipo Strumento Piezometro a Tubo Aperto
Nome Tubo Piezometrico \ \ MU_PZ4
Data posa in opera 09/03/2011
Data lettura di zero 21/03/2011

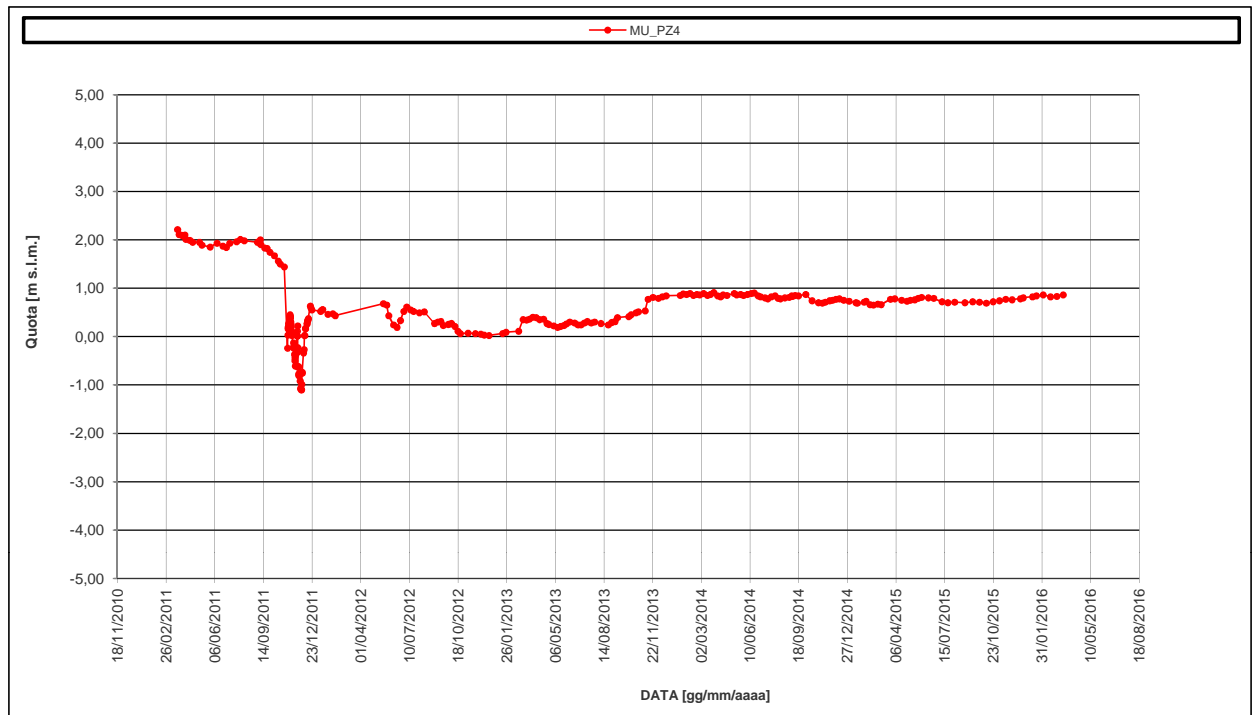

Piezometro MU_PZ5

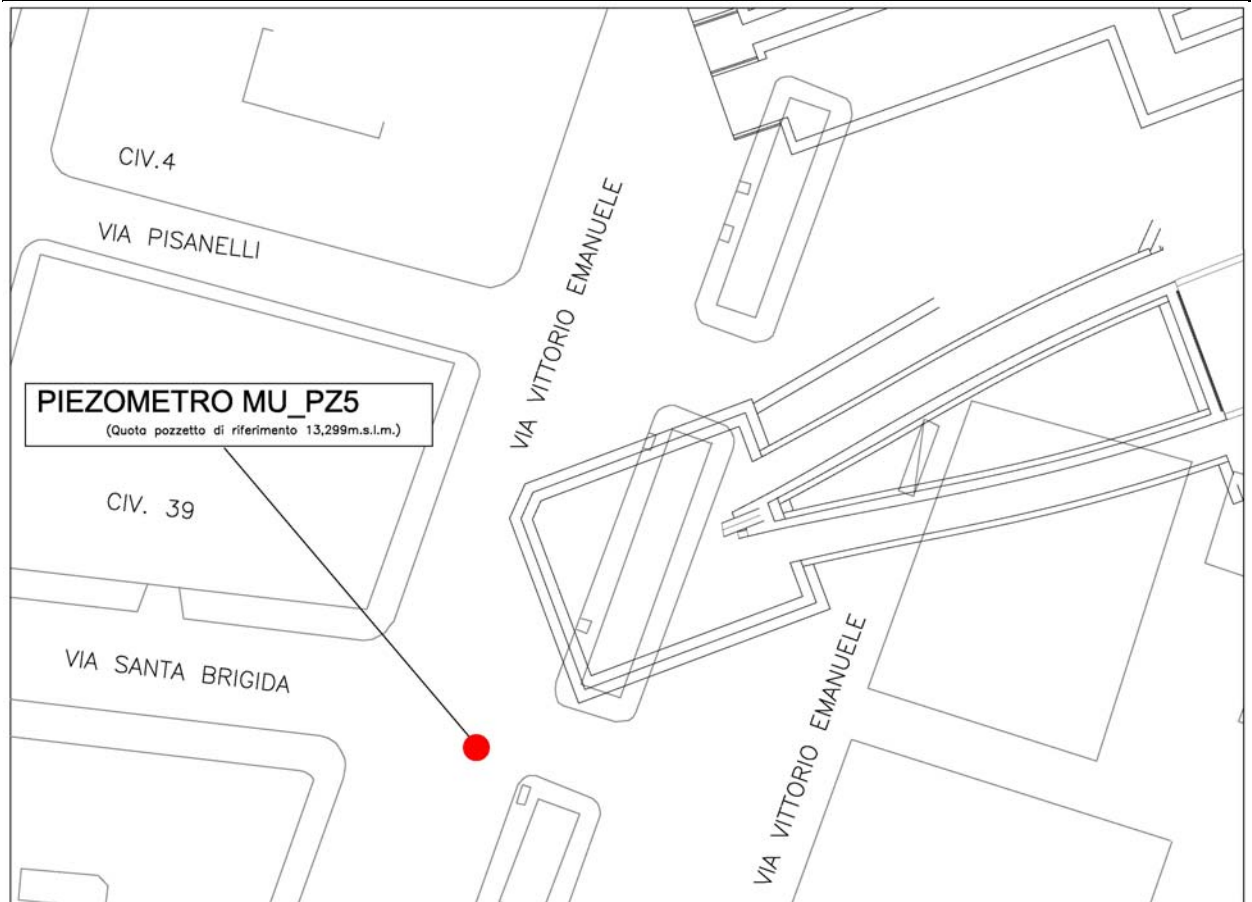

Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X

Congruenza progettuale

C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza

NOTE

Le elaborazioni di seguito riportate includono lo storico delle misure.



TABULATI

Ubicazione **STAZIONE MUNICIPIO**
Tipo Strumento **Piezometro a Tubo Aperto**
Nome Tubo Piezometrico **\ \ MU_PZ5**
Data posa in opera **10/03/2011**
Data lettura di zero **21/03/2011**


Ultima misura **248** in data **14/03/2016**

Letture n°	DATA	MU_PZ5	
		Boccaf. [m s.l.m.]	Cella [m s.l.m.]
		Quota [m.s.l.m.]	Spostam. [mm]
		13,299	-4,401
197	03/09/2014 12:00	-0,54	-2700,00
198	05/09/2014 11:00	-0,56	-2720,00
199	10/09/2014 11:00	-0,55	-2710,00
200	17/09/2014 10:00	-0,56	-2720,00
201	02/10/2014 10:00	-0,54	-2700,00
202	15/10/2014 10:30	-0,60	-2760,00
203	28/10/2014 11:00	-0,64	-2800,00
204	05/11/2014 10:00	-0,66	-2820,00
205	11/11/2014 10:00	-0,63	-2790,00
206	20/11/2014 10:30	-0,60	-2760,00
207	26/11/2014 10:30	-0,58	-2740,00
208	03/12/2014 10:30	-0,55	-2710,00
209	10/12/2014 12:30	-0,52	-2680,00
210	19/12/2014 11:00	-0,50	-2660,00
211	30/12/2014 11:30	-0,51	-2670,00
212	13/01/2015 10:30	-0,54	-2700,00
213	16/01/2015 10:30	-0,56	-2720,00
214	30/01/2015 10:00	-0,50	-2660,00
215	03/02/2015 10:00	-0,51	-2670,00
216	11/02/2015 11:00	-0,58	-2740,00
217	18/02/2015 11:00	-0,66	-2820,00
218	27/02/2015 12:00	-0,65	-2810,00
219	06/03/2015 10:00	-0,63	-2790,00
220	25/03/2015 12:00	-0,77	-2930,00
221	03/04/2015 10:00	-0,79	-2950,00
222	17/04/2015 11:00	-0,83	-2990,00
223	28/04/2015 11:00	-0,85	-3010,00
224	05/05/2015 11:00	-0,84	-3000,00
225	14/05/2015 11:00	-0,82	-2980,00
226	21/05/2015 11:00	-0,80	-2960,00
227	28/05/2015 11:00	-0,76	-2920,00
228	11/06/2015 11:00	-0,75	-2910,00
229	22/06/2015 11:00	-0,73	-2890,00
230	09/07/2015 10:30	-0,80	-2960,00
231	21/07/2015 11:30	-0,82	-2980,00
232	04/08/2015 11:00	-0,79	-2950,00
233	25/08/2015 11:30	-0,83	-2990,00
234	10/09/2015 11:00	-0,79	-2950,00
235	24/09/2015 11:00	-0,76	-2920,00
236	08/10/2015 11:00	-0,74	-2900,00
237	22/10/2015 11:00	-0,68	-2840,00
238	04/11/2015 11:30	-0,65	-2810,00
239	17/11/2015 10:30	-0,62	-2780,00
240	30/11/2015 10:30	-0,63	-2790,00
241	17/12/2015 11:00	-0,60	-2760,00
242	23/12/2015 11:00	-0,58	-2740,00
243	11/01/2016 11:00	-0,55	-2710,00
244	19/01/2016 11:00	-0,56	-2720,00
245	02/02/2016 11:00	-0,54	-2700,00
246	17/02/2016 11:00	-0,52	-2680,00
247	01/03/2016 11:00	-0,50	-2660,00
248	14/03/2016 11:00	-0,48	-2640,00



SCHEMA UBICAZIONE

Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO
Tipo Strumento Piezometro a Tubo Aperto
Nome Tubo Piezometrico \ \ MU_PZ5
Data posa in opera 10/03/2011
Data lettura di zero 21/03/2011

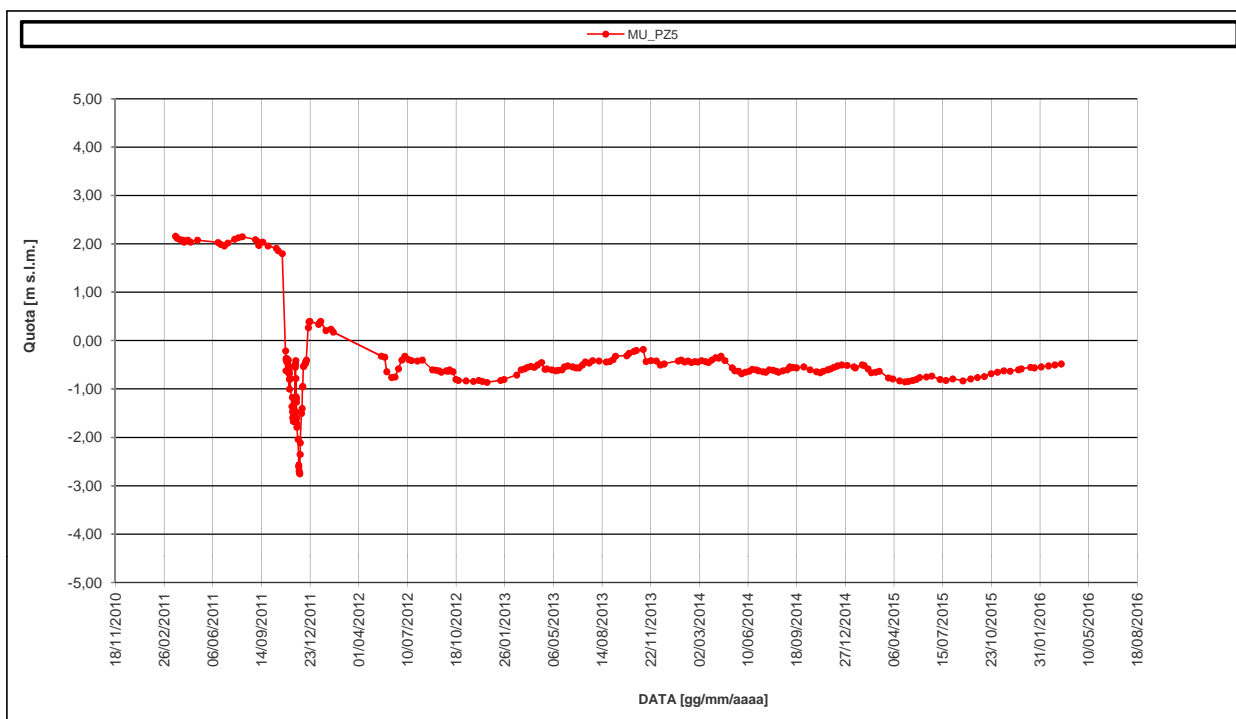

Piezometro MU_PZ6



Affidabilità strumentale

A.T.I. LM6 – Tre Esse

buono
da rivedere
da scartare

X

Congruenza progettuale

C.T. ATI LM6 – C.T.
Monitoraggio

congruente
non congruente, da valutare
non congruente con implicazioni
sulla sicurezza

NOTE

Le elaborazioni di seguito riportate includono lo storico delle misure.



TABULATI

Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO
Tipo Strumento Piezometro a Tubo Aperto
Nome Tubo Piezometrico \ \ MU_PZ6
Data posa in opera 11/03/2011
Data lettura di zero 24/03/2011



Ultima misura 221 **in data** 14/03/2016

Letture n°	DATA	MU_PZ6	
		Boccaf. [m s.l.m.]	Cella [m s.l.m.]
		4,569	-8,431
		Quota [m.s.l.m.]	Spostam. [mm]
170	03/09/2014 12:00	0,06	-1210,00
171	05/09/2014 11:00	0,05	-1220,00
172	10/09/2014 11:00	0,06	-1210,00
173	17/09/2014 10:00	0,07	-1200,00
174	02/10/2014 10:00	0,05	-1220,00
175	17/10/2014 10:30	0,03	-1240,00
176	28/10/2014 11:00	-0,14	-1410,00
177	05/11/2014 10:00	-0,34	-1610,00
178	11/11/2014 10:00	-0,46	-1730,00
179	20/11/2014 10:30	-0,53	-1800,00
180	26/11/2014 10:30	-0,56	-1830,00
181	03/12/2014 10:30	-0,54	-1810,00
182	10/12/2014 12:30	-0,53	-1800,00
183	19/12/2014 11:00	-0,63	-1900,00
184	30/12/2014 11:30	-0,64	-1910,00
185	13/01/2015 10:30	-0,75	-2020,00
186	16/01/2015 10:30	-0,81	-2080,00
187	30/01/2015 10:00	-0,76	-2030,00
188	03/02/2015 10:00	-0,73	-2000,00
189	11/02/2015 11:00	-0,60	-1870,00
190	18/02/2015 11:00	-0,45	-1720,00
191	27/02/2015 12:00	-0,40	-1670,00
192	06/03/2015 10:00	-0,41	-1680,00
193	25/03/2015 12:00	-0,51	-1780,00
194	03/04/2015 10:00	-0,55	-1820,00
195	17/04/2015 11:00	-0,68	-1950,00
196	28/04/2015 11:00	-0,76	-2030,00
197	05/05/2015 11:00	-0,80	-2070,00
198	14/05/2015 11:00	-0,78	-2050,00
199	21/05/2015 11:00	-0,75	-2020,00
200	28/05/2015 11:00	-0,71	-1980,00
201	11/06/2015 11:00	-0,70	-1970,00
202	22/06/2015 11:00	-0,67	-1940,00
203	09/07/2015 10:30	-1,07	-2340,00
204	21/07/2015 11:30	-1,03	-2300,00
205	04/08/2015 11:00	-1,13	-2400,00
206	25/08/2015 11:30	-1,14	-2410,00
207	10/09/2015 11:00	-1,11	-2380,00
208	24/09/2015 11:00	-1,08	-2350,00
209	08/10/2015 11:00	-1,06	-2330,00
210	22/10/2015 11:00	-1,02	-2290,00
211	04/11/2015 11:30	-0,95	-2220,00
212	17/11/2015 10:30	-0,91	-2180,00
213	30/11/2015 10:30	-0,93	-2200,00
214	17/12/2015 11:00	-0,92	-2190,00
215	23/12/2015 11:00	-0,90	-2170,00
216	11/01/2016 11:00	-0,85	-2120,00
217	19/01/2016 11:00	-0,83	-2100,00
218	02/02/2016 11:00	-0,81	-2080,00
219	17/02/2016 11:00	-0,79	-2060,00
220	01/03/2016 11:00	-0,80	-2070,00
221	14/03/2016 11:00	-0,77	-2040,00



SCHEMA UBICAZIONE

Ubicazione STAZIONE MUNICIPIO
Tipo Strumento Piezometro a Tubo Aperto
Nome Tubo Piezometrico \ \ MU_PZ6
Data posa in opera 11/03/2011
Data lettura di zero 24/03/2011

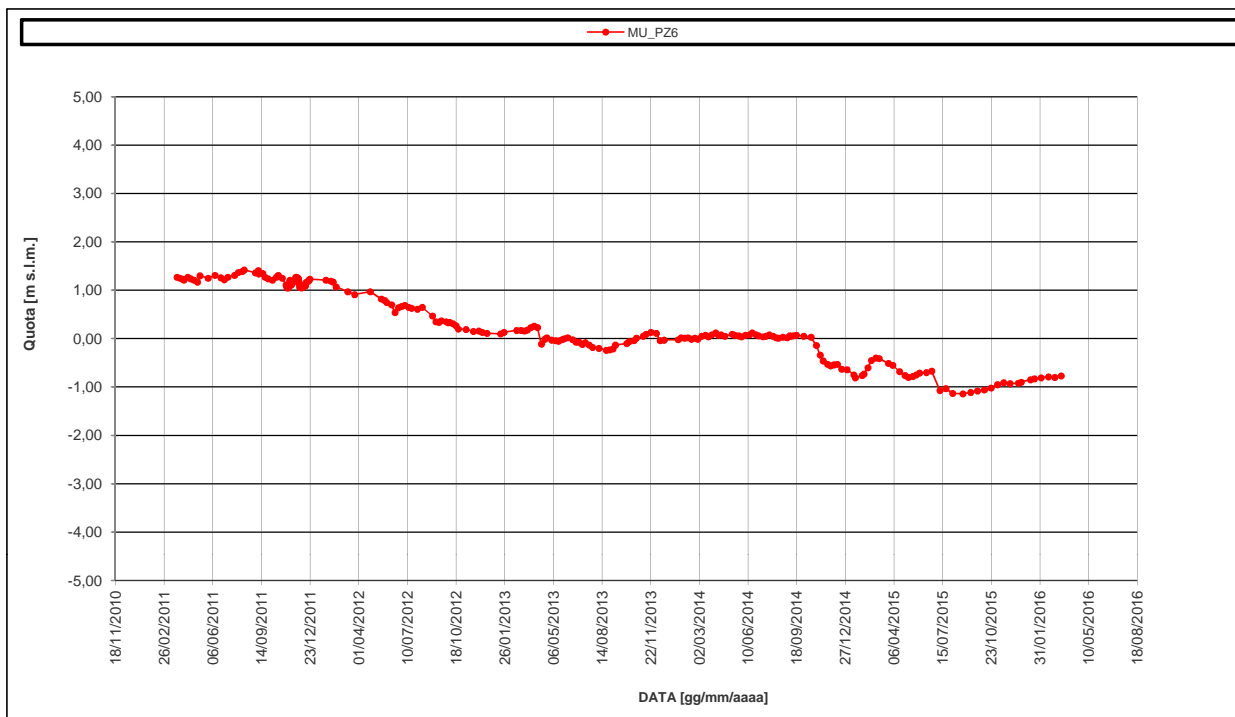

10. MISURE TOPOGRAFICHE - CAPISALDI

I capisaldi previsti per il monitoraggio topografico a P.C. saranno tutti del tipo “CSB”(chiodo topografico), per quelli ricadenti nelle aree soggette a passaggio di mezzi, di tipo “CSA” (basetta topografica posta all’interno di un pozzetto carrabile). I capisaldi a p.c. posti a tergo degli edifici monitorati sono collocati in corrispondenza delle staffe livellometriche installate sugli edifici in modo da offrire una facile interpolazione fra i dati derivanti dalla subsidenza del terreno con quella delle interferenze. La misurazione verrà effettuata tramite livello elettronico.

Tabella riepilogativa per i capisaldi installati in cantiere

NOME	TIPOLOGIA STRUM.	DATA INSTALLAZIONE	DISPONIBILITA' LETTURA			NOTE
			DATA LETTURA DI ZERO	PERIODO INTERRUZIONE	DATA FINE ATTIVITA'	
MU_CS01_39	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS02_39	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS03_39	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS04_39	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS05_39	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS06_39	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS07_39	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS08_39	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS09_39	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS10_39	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS11_39	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS12_4	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS13_4	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS14_4	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS15_4	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS16_4	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS17_4	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS18_4	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS19_4	CAPOSALDO	02/10/09	02/10/09			(*)
MU_CS20_45	CAPOSALDO	05/04/11	05/04/11			(*)
MU_CS21_45	CAPOSALDO	05/04/11	05/04/11			(*)
MU_CS22_45	CAPOSALDO	05/04/11	05/04/11			(*)
MU_CS23_45	CAPOSALDO	05/04/11	05/04/11			(*)
MU_CS24_45	CAPOSALDO	05/04/11	05/04/11			(*)
MU_CS25_45	CAPOSALDO	05/04/11	05/04/11			(*)
MU_CS26_45	CAPOSALDO	05/04/11	05/04/11			(*)
MU_CS27_45	CAPOSALDO	05/04/11	05/04/11			(*)
MU_CS28_45	CAPOSALDO	05/04/11	05/04/11			(*)

(*) I dati topografici rilevati e distribuiti dall'ATI, relativi al periodo di pertinenza del presente report, non contengono misure per lo strumento.

METROPOLITANA LINEA 6 - RESOCONTO MANUTENZIONE TRESSE ENGINEERING S.R.L.

CH	CH_PZ1	PIEZ. TUBO APERTO	50/50								0	2
CH	CH_PZ3	PIEZ. TUBO APERTO	40/40								0	0
CH	CH_EI2/ES2	ESTENSO-INCLINOMETRO	55/55								0	1
CH	CH_IN2	INCLINOMETRO	54/54								0	3

Note:

Lo strumento CH_EI1/ES1 (ESTENSO-INCLINOMETRO) risulta leggibile per 25m rispetto agli iniziali 54. Tale riduzione è dovuta al passaggio della TBM che ha intercettato lo strumento tagliando la porzione inferiore interferente con la galleria.

STAZIONE MUNICIPIO

COD.STAZIONE	COD. STRUM.	TIPOLOGIA STRUM.	METRI da p.c.	14/3	15/3	16/3	17/3	18/3	ESITO	TOT MESE	TOTALE
MU	MU_PZ1	PIEZ. TUBO APERTO	16,5							0	6
MU	MU_PZ2	PIEZ. TUBO APERTO	25,5			1			P	1	7
MU	MU_PZ3	PIEZ. TUBO APERTO	25,20			1			P	1	6
MU	MU_PZ4	PIEZ. TUBO APERTO	23,80			1			P	1	10
MU	MU_PZ5	PIEZ. TUBO APERTO	17,70			1			P	1	11
MU	MU_PZ6	PIEZ. TUBO APERTO	13			1			P	1	9
MU	MU_EI1/ES1	ESTENSO-INCLINOMETRO	35/35			1			P	1	5
MU	MU_EI2/ES2	ESTENSO-INCLINOMETRO	34/34							0	6
MU	MU_EI3/ES3	ESTENSO-INCLINOMETRO	34/34							0	6
MU	MU_EI4/ES4	ESTENSO-INCLINOMETRO	35/35							0	4

CAMERE DI VENTILAZIONE

TORRETTA

COD.STAZIONE	COD. STRUM.	TIPOLOGIA STRUM.	METRI da p.c.	14/3	15/3	16/3	17/3	18/3	ESITO	TOT MESE	TOTALE
CDV_TOR	CDV_TOR_EI1/ES1	ESTENSO-INCLINOMETRO	31/31							0	1
CDV_TOR	CDV_TOR_EI2/ES2	ESTENSO-INCLINOMETRO	27/27							0	1
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ1_P	PIEZ. CASAGRANDE	30							0	2
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ1_S	PIEZ. CASAGRANDE	21							0	2
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ2_P	PIEZ. CASAGRANDE	30							0	2
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ2_S	PIEZ. CASAGRANDE	21							0	2
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ3_P	PIEZ. CASAGRANDE	30							0	2
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ3_S	PIEZ. CASAGRANDE	21							0	2
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ4_P	PIEZ. CASAGRANDE	30							0	2
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ4_S	PIEZ. CASAGRANDE	21							0	2
CDV_TOR	CDV_TOR_PZ5_P	PIEZ. CASAGRANDE	35							0	2

S.MARIA IN PORTICO




COD.STAZIONE	COD. STRUM.	TIPOLOGIA STRUM.	METRI da p.c.	14/3	15/3	16/3	17/3	18/3	ESITO	TOT MESE	TOTALE
CDV_SMP	CDV_SMP_EI1/ES1	ESTENSO-INCLINOMETRO	30/30					1	P	1	1
CDV_SMP	CDV_SMP_PZ1_P	PIEZ. CASAGRANDE	30							0	2
CDV_SMP	CDV_SMP_PZ1_S	PIEZ. CASAGRANDE	21							0	2
CDV_SMP	CDV_SMP_PZ2_P	PIEZ. CASAGRANDE	30							0	2
CDV_SMP	CDV_SMP_PZ2_S	PIEZ. CASAGRANDE	21							0	2
CDV_SMP	CDV_SMP_PZ3_P	PIEZ. CASAGRANDE	30							0	2
CDV_SMP	CDV_SMP_PZ3_S	PIEZ. CASAGRANDE	21							0	2

VITTORIA

COD.STAZIONE	COD. STRUM.	TIPOLOGIA STRUM.	METRI da p.c.	14/3	15/3	16/3	17/3	18/3	ESITO	TOT MESE	TOTALE
CDV_VIT	CDV_VIT_PZ1	PIEZ. CASAGRANDE	24							0	1
CDV_VIT	CDV_VIT_PZ2	PIEZ. CASAGRANDE	24					1	P	1	2

METROPOLITANA LINEA 6 - RESOCONTO MANUTENZIONE TRESSE ENGINEERING S.R.L.

LEGENDA

	IN ROSSO STRUMENTO FUORI USO (per il quale è inutile programmare attività di manutenzione e monitoraggio)
	IN VERDE STRUMENTO A FUNZIONALITA' RIDOTTA
	IN ARANCIO STRUMENTO SOSTITUITO
P	ESITO POSITIVO
N	ESITO NEGATIVO
Video	VIDEOISPEZIONE ESEGUITA

NOTE

Gli strumenti sottoposti a manutenzione nel periodo indicato, dopo il trattamento di spurgo, lavaggio a pressione, verifica dell'accessibilità tubi di misura, hanno migliorato la loro funzionalità. Superando le prove con esito positivo.

Per i piezometri tipo Casagrande sotto riportati, si evince la scarsa comunicazione fra i tubi di misura, che indica un ridotto ricircolo dell'acqua all'interno della cella. Dalla risposta strumentale ottenuta durante le fasi di manutenzione, si suppone un funzionamento assimilabile più a piezometri tubo aperto che non a celle tipo Casagrande, ciò potrebbe comportare tempi di risposta più lunghi. Tuttavia questi strumenti continuano a fornire misure correlabili con gli altri strumenti funzionanti, continueranno ad essere regolarmente inseriti nel programma di monitoraggio e di manutenzione.
