


Area Programmazione della Mobilità
Servizio Sviluppo della Mobilità Sostenibile

**ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE CITTADINA:
AMBITO ORIENTALE**



Progettista

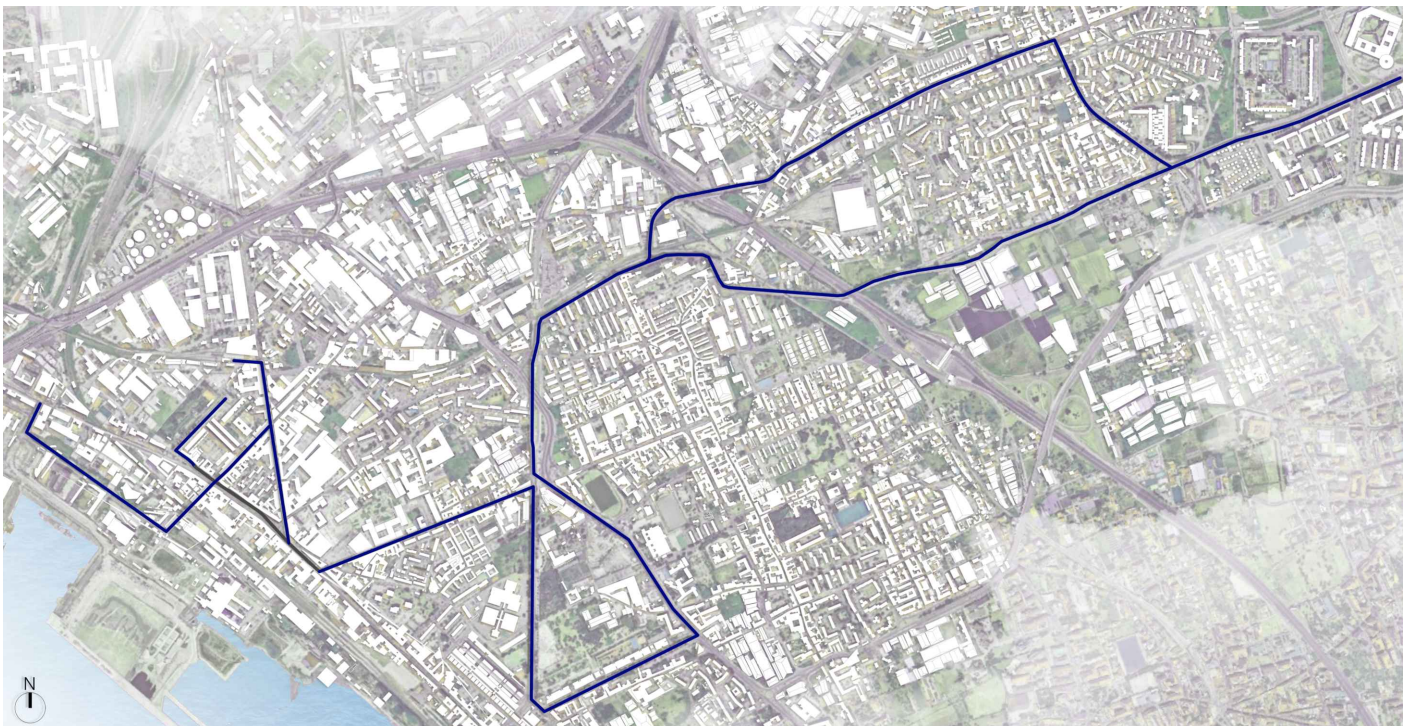

Interprogetti Srl
dott. ing. Giampiero Martuscelli
www.interprogettisrl.com
@: info@interprogettisrl.com

Napoli
via Benedetto Brin, 63 - 80142
tel +39 081 5757989 pbx
fax +39 081 5750528

Torino
corso Svizzera, 185 - 10149
tel +39 011 7410602 pbx
fax +39 011 043305

Milano
viale Achille Papa, 30 - 20149
tel +39 02 45440304 pbx

Livello progettazione

PFTE

Disciplina

SICUREZZA

Titolo elaborato

Cronoprogramma

Codice elaborato

PF SC 16

Nome file

rev.	descrizione	scala	data	formato	elaborato da	controllato da	approvato da
0	EMISSIONE	-	23/01/2023	A4	ING. G. SCOTTO DI CARLO	ING. F. TRAPANESE	ING. G. MARTUSCELLI
1	REVISIONE	-	03/03/2023	A4	ING. G. SCOTTO DI CARLO	ING. F. TRAPANESE	ING. G. MARTUSCELLI
2							
3							

Attività

Nome	Data inizio	Data di fine	Durata
Piste ciclabili	19/04/23	28/05/24	279
Progettazione Definitiva ed Esecutiva	19/04/23	01/06/23	30
Via Marina dei Gigli	05/06/23	20/06/23	12
Stradone Vigliena	16/06/23	10/07/23	17
Via Vigliena	06/07/23	24/07/23	13
Stradone Comunale Ottaviano	20/07/23	26/07/23	5
Via Imparato	24/07/23	22/08/23	21
Via Murelle	18/08/23	31/08/23	10
Vico I Pezzigno	28/08/23	18/09/23	16
Via Pezzigno	14/09/23	28/09/23	11
Corso Protopisani	25/09/23	24/10/23	22
Viale Due Giugno	20/10/23	01/12/23	30
Via Taverna Del Ferro	29/11/23	14/12/23	11
Via D. Altripaldi	12/12/23	08/01/24	17
Via Repubbliche Marinare	04/01/24	05/02/24	23
Via Chiaramonte	01/02/24	23/02/24	17
Via Mastellone	21/02/24	18/03/24	19
Viale delle Metamorfosi	14/03/24	09/04/24	19
Via Ponte cavalcavia Ponticelli	08/04/24	24/04/24	13
Via Volpicella	22/04/24	15/05/24	16
Via Bartolo Longo	13/05/24	28/05/24	12

Diagramma di Gantt

